



ID	EDT	Descripción Partida	Duración	Comienzo	Fin	Holgura	14/2/16	21/2/16	28/2/16	6/3/16	13/3/16	20/3/16	27/3/16	3/4/16	10/4/16	17/4/16	24/4/16	1/5/16
1		INICIO DE OBRA	0 días	vi 19/2/16	vi 19/2/16	0 días												
2		"CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. INCHUPALLA CHUCUITO-PUNO-PUNO"	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
3		INICIO DE OBRAS PROVISIONALES	0 días	vi 19/2/16	vi 19/2/16	0 días												
4	01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
5	01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
6	01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
7	01.01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
8	01.01.01.02	SERVICIOS HIGIENICOS P/TRABAJADORES (1 LETRINA)	2 días	vi 19/2/16	sá 20/2/16	73 días												
9	01.01.01.03	CARTEL DE OBRA 3.60X2.40M	1 día	vi 19/2/16	sá 20/2/16	0 días												
10	01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES	1 día	vi 19/2/16	sá 20/2/16	0 días												
11	01.01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	1 día	vi 19/2/16	sá 20/2/16	0 días												
12	01.01.03	DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y REMOCIONES	8 días	vi 19/2/16	vi 26/2/16	67 días												
13	01.01.03.01	DESMONTAJE DE COBERTURA	2 días	vi 19/2/16	sá 20/2/16	67 días												
14	01.01.03.02	RETIRO DE CORREAS	1 día	do 21/2/16	do 21/2/16	67 días												
15	01.01.03.03	RETIRO DE TIJERAS DE MADERA	2 días	lu 22/2/16	ma 23/2/16	67 días												
16	01.01.03.04	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA	1 día	mi 24/2/16	mi 24/2/16	67 días												
17	01.01.03.05	REMOCION DE TARRAJEO	2 días	ju 25/2/16	vi 26/2/16	67 días												
18	01.01.04	TRABAJOS PRELIMINARES	4 días	vi 19/2/16	lu 22/2/16	0 días												
19	01.01.04.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	4 días	vi 19/2/16	lu 22/2/16	0 días												
20	01.01.05	MOVILIZACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
21	01.01.05.01	FLETE TERRESTRE	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
22	01.01.06	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO	8 días	vi 19/2/16	sá 27/2/16	0 días												
23	01.01.06.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	4 días	vi 19/2/16	ma 23/2/16	0 días												
24	01.01.06.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	4 días	ma 23/2/16	sá 27/2/16	67 días												
25	01.02	SEGURIDAD Y SALUD - MITIGACION AMBIENTAL	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
26	01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
27	01.02.01.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	4 días	vi 19/2/16	lu 22/2/16	0 días												
28	01.02.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
29	01.02.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
30	01.02.01.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
31	01.02.01.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
32	01.02.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
33	01.02.02.01	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
34	01.02.03	MITIGACION AMBIENTAL	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
35	01.02.03.01	TALLER DE INFORMACION DE LOS ALCANCES U OBJETIVOS DEL PROYECTO A LOS BENEFICIARIOS	1 día	vi 19/2/16	vi 19/2/16	0 días												
36	01.02.03.02	CAPACITACION EN TEMAS AMBIENTALES, EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
37	01.02.03.03	CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE MANEJO DE RESIDUOS COMUNES Y PELIGROSOS	4 días	vi 19/2/16	lu 22/2/16	71 días												
38	01.02.03.04	HABILITACION DE ESCOMBREIRA Y CONSTRUCCION DE TRINCHERA DE RESIDUOS COMUNES Y PELIGROSOS	1 día	lu 25/4/16	lu 25/4/16	8 días												
39	01.02.03.05	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	75 días	vi 19/2/16	ma 3/5/16	0 días												
40		FIN DE OBRAS PROVISIONALES	0 días	vi 19/2/16	vi 19/2/16	75 días												
41		INICIO DE ESTRUCTURAS	0 días	sá 20/2/16	sá 20/2/16	74 días												
42	02	ESTRUCTURAS	74 días	sá 20/2/16	ma 3/5/16	0 días												
43	02.01	EDIFICACION	68 días	sá 20/2/16	mi 27/4/16	6 días												
44	02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	12 días	sá 20/2/16	mi 2/3/16	28 días												
45	02.01.01.01	EXCAVACIONES	7 días	sá 20/2/16	vi 26/2/16	28 días												
46	02.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	7 días	sá 20/2/16	vi 26/2/16	28 días												
47	02.01.01.02	CORTES Y REFINE DE TERRENO	2 días	sá 27/2/16	do 28/2/16	63 días												
48	02.01.01.02.01	CORTE DE TERRENO NATURAL	2 días	sá 27/2/16	do 28/2/16	63 días												
49	02.01.01.03	RELLENOS	8 días	mi 24/2/16	mi 2/3/16	28 días												
50	02.01.01.03.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO MENOR	1 día	mi 24/2/16	mi 24/2/16	28 días												
51	02.01.01.03.02	BASE GRANULAR COMPACTADO DESDE NIVELES DE FONDO HASTA FALSO PISO	8 días	mi 24/2/16	mi 2/3/16	28 días												
52	02.01.01.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	5 días	sá 20/2/16	mi 24/2/16	28 días												
53	02.01.01.04.01	REFINE Y COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	5 días	sá 20/2/16	mi 24/2/16	28 días												
54	02.01.01.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	2 días	lu 29/2/16	ma 1/3/16	63 días												
55	02.01.01.05.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	2 días	lu 29/2/16	ma 1/3/16	63 días												
56	02.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	66 días	lu 22/2/16	mi 27/4/16	6 días												
57	02.01.02.01	CIMENTOS CORRIDOS	2 días	lu 22/2/16	ma 23/2/16	28 días												
58	02.01.02.01.01	CONCRETO P/CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30% P.G ØMAX. 6"	2 días	lu 22/2/16	ma 23/2/16	28 días												
59	02.01.02.02	SOBRECIMENTOS	3 días	lu 22/2/16	mi 24/2/16	69 días												
60	02.01.02.02.01	CONCRETO P/SOBRECIMIENTO 1:8 C:H + 25% P.M ØMAX. 3"	1 día	mi 24/2/16	mi 24/2/16	69 días												
61	02.01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO P/SOBRECIMIENTO	1 día	ma 23/2/16	ma 23/2/16	69 días												
62	02.01.02.02.03	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 P/SOBRECIMIENTO (MECHAS)	1 día	lu 22/2/16	lu 22/2/16	69 días												
63	02.01.02.03	SARDINELES EN SS.HH	2 días	lu 4/4/16	mi 6/4/16	27 días												
64	02.01.02.03.01	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/SARDINELES	1 día	mi 6/4/16	mi 6/4/16	27 días												
65	02.01.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO P/SARDINELES	1 día	lu 4/4/16	ma 5/4/16	27 días												
66	02.01.02.04	VEREDAS	11 días	do 10/4/16	mi 20/4/16	4 días												
67	02.01.02.04.01	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/VEREDAS	5 días	sá 16/4/16	mi 20/4/16	6 días												
68	02.01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO P/VEREDAS	6 días	do 10/4/16	vi 15/4/16	4 días												
69	02.01.02.04.03	JUNTA ASFALTICA DE DILATACION Y CONTRACCION 1/2" P/VEREDAS	1 día	sá 16/4/16	sá 16/4/16	17 días												
70	02.01.02.04.04	BRUÑAS DE 1CM x 1 CM P/VEREDAS	3 días	do 17/4/16	mi 20/4/16	13 días												
71	02.01.02.05	PATIO	3 días	sá 23/4/16	lu 25/4/16	6 días												
72	02.01.02.05.01	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/PATIO	1 día	lu 25/4/16	lu 25/4/16	6 días												
73	02.01.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO P/PATIO	2 días	sá 23/4/16	do 24/4/16	6 días												
74	02.01.02.05.03	JUNTA ASFALTICA DE DILATACION Y CONTRACCION 1/2" P/PATIO	1 día	lu 25/4/16	lu 25/4/16	8 días												
75	02.01.02.05.04	BRUÑAS DE 1CM x 1 CM P/PATIO	1 día	lu 25/4/16	lu 25/4/16	8 días												
76	02.01.02.06	RAMPAS	2 días	ma 26/4/16	mi 27/4/16	6 días												
77	02.01.02.06.01	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/RAMPAS	1 día	mi 27/4/16	mi 27/4/16	6 días												
78	02.01.02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO P/RAMPAS	1 día	ma 26/4/1														

##	02.02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	11 días	ma 5/4/16	vi 15/4/16	10 días
##	02.02.02.01	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/DADOS	5 días	lu 11/4/16	vi 15/4/16	10 días
##	02.02.02.02	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - P/HITOS	5 días	lu 11/4/16	vi 15/4/16	10 días
##	02.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	5 días	ma 5/4/16	sá 9/4/16	10 días
##	02.02.02.04	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	ma 5/4/16	ma 5/4/16	28 días
##	02.02.03	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	11 días	lu 11/4/16	ju 21/4/16	10 días
##	02.02.03.01	CERCO DELIMITADOR C/POSTES DE MADERA, TUBO F6" 1 1/4" Y ALAMBRE Gº N10	10 días	lu 11/4/16	mi 20/4/16	10 días
##	02.02.03.02	PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL DE MADERA PARA CERCO PERIMETRICO	1 día	ju 21/4/16	ju 21/4/16	10 días
##	02.02.04	PINTURA	2 días	vi 22/4/16	sá 23/4/16	10 días
##	02.02.04.01	PINTURA ESMALTE SINTETICO BLANCO PARA HITOS Y PUERTA DE INGRESO	2 días	vi 22/4/16	sá 23/4/16	10 días
##	02.03	CERCO DE PROTECCION PARA ANTENA DE INTERNET	13 días	ma 5/4/16	do 17/4/16	10 días
##	02.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	1 día	ma 5/4/16	ma 5/4/16	14 días
##	02.03.01.01	EXCAVACIONES	1 día	ma 5/4/16	ma 5/4/16	14 días
##	02.03.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1 día	ma 5/4/16	ma 5/4/16	14 días
##	02.03.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	2 días	do 10/4/16	lu 11/4/16	10 días
##	02.03.02.01	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/DADOS	1 día	lu 11/4/16	lu 11/4/16	10 días
##	02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día	do 10/4/16	do 10/4/16	10 días
##	02.03.03	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	2 días	ma 12/4/16	mi 13/4/16	10 días
##	02.03.03.01	CERCO METALICO H=2.50M C/MALLA GALVANIZADA N°10 2"X2" CON TUBO F6" 3" INC. 3 HILERAS DE ALAMBRE	2 días	ma 12/4/16	mi 13/4/16	10 días
##	02.03.03.02	PUERTA A=1.00M. H=2.00M. CON PERFILES DE ACERO NEGRO 1 1/2"X1 1/2"X3/16" CON MALLA GALVANIZADA	1 día	mi 13/4/16	mi 13/4/16	10 días
##	02.03.04	PINTURA	4 días	ju 14/4/16	do 17/4/16	10 días
##	02.03.04.01	PINTURA ANTICORROSIVA EN CERCO METALICO	2 días	ju 14/4/16	vi 15/4/16	10 días
##	02.03.04.02	PINTURA ESMALTE SINTETICO BLANCO PARA CARPINTERIA METALICA EN CERCO	2 días	sá 16/4/16	do 17/4/16	10 días
##	02.04	ASTA DE BANDERA	6 días	lu 18/4/16	sá 23/4/16	10 días
##	02.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	4 días	lu 18/4/16	ju 21/4/16	10 días
##	02.04.01.01	EXCAVACIONES	1 día	lu 18/4/16	lu 18/4/16	10 días
##	02.04.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1 día	lu 18/4/16	lu 18/4/16	10 días
##	02.04.01.02	RELLENOS	1 día	ju 21/4/16	ju 21/4/16	12 días
##	02.04.01.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO MENOR	1 día	ju 21/4/16	ju 21/4/16	12 días
##	02.04.01.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	1 día	ju 21/4/16	ju 21/4/16	12 días
##	02.04.01.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	ju 21/4/16	ju 21/4/16	12 días
##	02.04.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	4 días	ma 19/4/16	vi 22/4/16	10 días
##	02.04.02.01	SOLIDOS	1 día	ma 19/4/16	ma 19/4/16	10 días
##	02.04.02.01.01	SOLIDO C/MEZCLA 1:10 C:H E=4"	1 día	ma 19/4/16	ma 19/4/16	10 días
##	02.04.02.02	VEREDAS	2 días	ju 21/4/16	vi 22/4/16	10 días
##	02.04.02.02.01	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/VEREDAS	1 día	ju 21/4/16	ju 21/4/16	12 días
##	02.04.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDAS	1 día	ju 21/4/16	ju 21/4/16	10 días
##	02.04.02.02.03	JUNTA ASFALTICA DE DILATACION Y CONTRACCION 1/2" P/VEREDAS	1 día	vi 22/4/16	vi 22/4/16	10 días
##	02.04.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	1 día	mi 20/4/16	mi 20/4/16	10 días
##	02.04.03.01	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/COLUMNAS	1 día	mi 20/4/16	mi 20/4/16	13 días
##	02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/COLUMNAS	1 día	mi 20/4/16	mi 20/4/16	10 días
##	02.04.03.03	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60-P/COLUMNAS	1 día	mi 20/4/16	mi 20/4/16	13 días
##	02.04.04	CARPINTERIA METALICA	3 días	lu 18/4/16	mi 20/4/16	13 días
##	02.04.04.01	ASTA DE BANDERA CON TUBO F6" DE 3" Y 2" H=6.20M HASTA ANCLAJE INC. RODON Y MASTIL	1 día	mi 20/4/16	mi 20/4/16	13 días
##	02.04.04.02	ASTA DE BANDERA CON TUBO F6" DE 3" Y 2" H=5.20M HASTA ANCLAJE INC. RODON Y MASTIL	2 días	lu 18/4/16	ma 19/4/16	14 días
##	02.04.05	PINTURA	1 día	sá 23/4/16	sá 23/4/16	10 días
##	02.04.05.01	PINTURA ANTICORROSIVA EN ASTA	1 día	sá 23/4/16	sá 23/4/16	10 días
##	02.04.05.02	PINTURA ESMALTE SINTETICO BLANCO PARA PEDESTAL DE ASTA	1 día	sá 23/4/16	sá 23/4/16	10 días
##	02.05	TANQUE ELEVADO (INCLUYE CUARTE DE EQUIPO)	31,14 días	ju 3/3/16	do 3/4/16	30,74 días
##	02.05.01.01	EXCAVACIONES	2 días	ju 3/3/16	vi 4/3/16	30,74 días
##	02.05.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	2 días	ju 3/3/16	vi 4/3/16	30,74 días
##	02.05.01.02	RELLENOS	1 día	sá 5/3/16	do 6/3/16	30,74 días
##	02.05.01.02.01	BASE GRANULAR COMPACTADO DESDE NIVELES DE FONDO HASTA FALSO PISO	1 día	sá 5/3/16	do 6/3/16	30,74 días
##	02.05.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	4 días	do 6/3/16	ju 10/3/16	45,86 días
##	02.05.02.01	FALSO PISO	1 día	do 6/3/16	lu 7/3/16	45,86 días
##	02.05.02.01.01	CONCRETO EN FALSO PISO E=4"	1 día	do 6/3/16	lu 7/3/16	45,86 días
##	02.05.02.02	VEREDAS	2 días	ma 8/3/16	ju 10/3/16	55 días
##	02.05.02.02.01	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/VEREDAS	1 día	mi 9/3/16	ju 10/3/16	55 días
##	02.05.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDAS	1 día	ma 8/3/16	mi 9/3/16	55 días
##	02.05.02.02.03	JUNTA ASFALTICA DE DILATACION Y CONTRACCION 1" P/VEREDAS	1 día	mi 9/3/16	ju 10/3/16	55 días
##	02.05.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	12,13 días	lu 7/3/16	sá 19/3/16	45,86 días
##	02.05.03.01	ZAPATAS	4,13 días	lu 7/3/16	vi 11/3/16	45,86 días
##	02.05.03.01.01	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/ZAPATAS	1 día	ju 10/3/16	vi 11/3/16	45,86 días
##	02.05.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ZAPATAS	3,13 días	lu 7/3/16	ju 10/3/16	45,86 días
##	02.05.03.01.03	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	ju 10/3/16	vi 11/3/16	53,87 días
##	02.05.03.02	COLUMNAS	4 días	vi 11/3/16	ma 15/3/16	45,86 días
##	02.05.03.02.01	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/COLUMNAS	1 día	lu 14/3/16	ma 15/3/16	49,87 días
##	02.05.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/COLUMNAS	3 días	vi 11/3/16	lu 14/3/16	45,86 días
##	02.05.03.02.03	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	lu 14/3/16	ma 15/3/16	49,87 días
##	02.05.03.03	VIGAS	4 días	lu 14/3/16	vi 18/3/16	45,86 días
##	02.05.03.03.01	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/VIGAS	1 día	ju 17/3/16	vi 18/3/16	46,87 días
##	02.05.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VIGAS	3 días	lu 14/3/16	ju 17/3/16	45,86 días
##	02.05.03.03.03	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	ju 17/3/16	vi 18/3/16	46,87 días
##	02.05.03.04	LOSA MACIZAS	2,01 días	ju 17/3/16	sá 19/3/16	45,86 días
##	02.05.03.04.01	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/LOSA MACIZA	1 día	vi 18/3/16	sá 19/3/16	45,86 días
##	02.05.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA MACIZA	1 día	ju 17/3/16	vi 18/3/16	45,86 días
##	02.05.03.04.03	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	vi 18/3/16	sá 19/3/16	45,86 días
##	02.05.04	ALBAÑILERIA	2 días	do 6/3/16	ma 8/3/16	30,74 días
##	02.05.04.01	MURO DE LADRILLO SOGA KK 18 HUECOS C:A 1:5; JUNTA 1.5 CM.	2 días	do 6/3/16	ma 8/3/16	30,74 días
##	02.05.05	REVOQUES Y REVESTIMIENTO	8,13 días	vi 11/3/16	sá 19/3/16	30,74 días
##	02.05.05.01	TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	1 día	vi 11/3/16	sá 12/3/16	30,74 días
##	02.05.05.02	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	1,13 días	sá 12/3/16	do 13/3/16	30,74 días
##	02.05.05.03	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN SUPERFICIES INTERIORES C:A 1:5 E=1.0CM	1 día	do 13/3/16	lu 14/3/16	30,74 días
##	02.05.05.04	TARRAJEO COLUMNAS MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	2 días	lu 14/3/16	mi 16/3/16	30,74 días
##	02.05.05.05	TARRAJEO VIGAS SUPERFICIE MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	2 días	mi 16/3/16	vi 18/3/16	30,74 días
##	02.05.05.06	VESTIDURA DE DERRAMES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	1 día	vi 18/3/16	sá 19/3/16	30,86 días
##	02.05.06	CIELORRASO	2 días	sá 19/3/16	lu 21/3/16	30,86 días
##	02.05.06.01	CIELORRASO CON MEZCLA	2 días	sá 19/3/16	lu 21/3/16	30,86 días
##	02.05.06.01.01	CIELORRASO CON MEZC. C:A 1:4 E=1.5CM	2 días	sá 19/3/16	lu 21/3/16	30,86 días
##	02.05.07	PISOS Y PAVIMENTOS	1 día	lu 21/3/16	ma 22/3/16	30,86 días
##	02.05.07.01	PISOS DE CONCRETO	1 día	lu 21/3/16	ma 22/3/16	30,86 días
##	02.05.07.01.01	PISO CEMENTO PULIDO BRUÑADO EN CUADRADOS S=1%	1 día	lu 21/3/16	ma 22/3/16	30,86 días
##	02.05.08	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	10,14 días	do 13/3/16	mi 23/3/16	41,74 días
##	02.05.08.01	ZOCALO	1 día	do 13/3/16	lu 14/3/16	50,87 días
##	02.05.08.01.01	ZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO H=0.60m	1 día	do 13/3/16	lu 14/3/16	50,87 días
##	02.05.08.02	CONTRAZOCALOS	1,13 días	ma 22/3/16	mi 23/3/16	41,74 días
##	02.05.08.02.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO h=0.10m	1,13 días	ma 22/3/16	mi 23/3/16	41,74 días
##	02.05.09	CARPINTERIA DE MADERA	3 días	ju 10/3/16	do 13/3/16	51 días
##	02.05.09.01	PUERTA DE MADERA ESTRUCTURAL MACIZA INC. TOPES TIPO MEDIA LUNA	2 días	ju 10/3/16	sá 12/3/16	51 días
##	02.05.09.02	VENTANA DE MADERA CON MARCO DE MADERA TORNILLO CON BARROTES DE SEGURIDAD DE FIERRO LISO Ø1/2"	1 día	sá 12/3/16	do 13/3/16	52 días
##	02.05.10	CERRAJERIA	3 días	vi 11/3/16	lu 14/3/16	51 días
##	02.05.10.01	BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADA PARA PUERTAS 3 1/2" x 3 1/2"	1 día	vi 11/3/16	sá 12/3/16	53 días
##	02.05.10.02	CERRADURA 3 GOLPES DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA EXTERIOR	1 día	sá 12/3/16	do 13/3/16	51 días
##	02.05.10.03	CANDADO (PUERTA DOBLE HOJA)	1 día	do 13/3/16	lu 14/3/16	51 días
##	02.05.11	PINTURA	2 días	vi 1/4/16	do 3/4/16	30,86 días
##	02.05.11.01	PINTURA MUROS INTERIORES LATEX MATE - 2 MANOS COLOR BLANCO HUMO	1 día	vi 1/4/16	sá 2/4/16	30,86 días
##	02.05.11.02	PINTURA MUROS EXTERIORES ESMALTE SINTETICO - 2 MANOS COLOR AMARILLO MARACUYA	1 día	sá 2/4/16	do 3/4/16	30,86 días
##	02.05.11.03	PINTURA LATEX MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR BLANCO HUMO	1 día	sá 2/4/16	do 3/4/16	30,86 días
##	02.05.11.04	PINTURA ESMALTE SINTETICO - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO	1 día	sá 2/4/16	do 3/4/16	30,86 días
##	02.05.12	OTROS	12,01 días	lu 14/3/16	sá 26/3/16	38,86 días
##	02.05.12.01	TANQUE ELEVADO	4 días	ma 22/3/16	sá 26/3/16	38,86 días
##	02.05.12.01.01	TANQUE DE AGUA PREFABRICADO POLIETILENO 2.5 M3 INC. ACCESORIOS	1 día	vi 25/3/16	sá 26/3/16	38,86 días
##	02.05.12.01.02	ESCALERA DE GATO CON TUBO DE FIERRO D=1 1/2" Y BARANDA DE TUBO DE FIERRO D=1 1/2"	1 día	ma 22/3/16	mi 23/3/16	38,86 días
##	02.05.12.01.03	BARANDA DE PROTECCION CON TUBO GALVANIZADO 1 1/2"	1 día	mi 23/3/16	ju 24/3/16	38,86 días

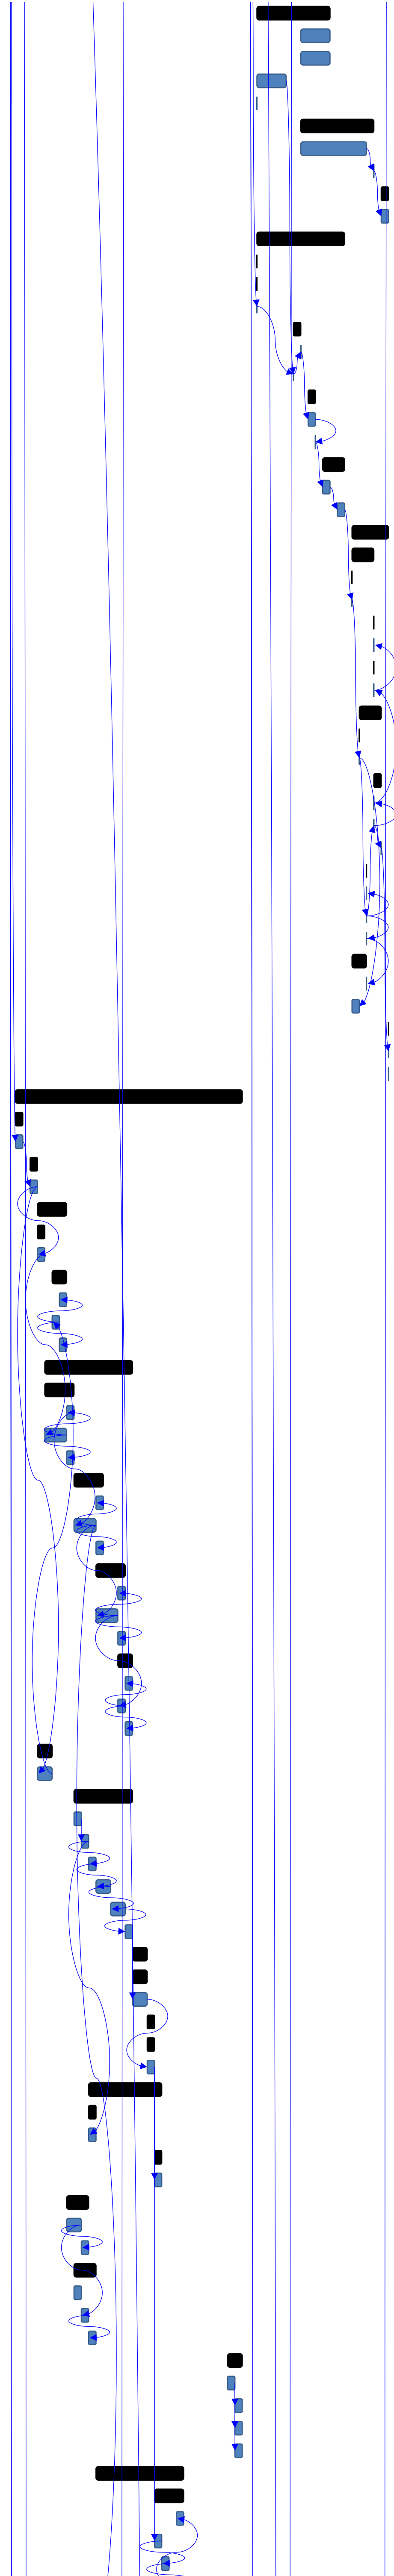


##	02.05.12.01.04	ACCESORIOS DE SUJECION DE TANQUE CON TENSORES Y FAJAS/CABLES	1 día	ju 24/3/16	vi 25/3/16	38,86 días
##	<b>02.05.12.02</b>	<b>REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA</b>	<b>2,13 días</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>mi 16/3/16</b>	<b>47,62 días</b>
##	02.05.12.02.01	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1"	1 día	lu 14/3/16	ma 15/3/16	47,62 días
##	02.05.12.02.02	TUBERIA PVC SAL Ø 2"	1,13 días	ma 15/3/16	mi 16/3/16	47,62 días
##	<b>02.05.12.03</b>	<b>ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA</b>	<b>1,13 días</b>	<b>mi 16/3/16</b>	<b>ju 17/3/16</b>	<b>47,62 días</b>
##	02.05.12.03.01	CODO PVC SAP 90° x Ø1.1/2"	1,13 días	mi 16/3/16	ju 17/3/16	47,62 días
##	02.05.12.03.02	CODO PVC SAP 90° x Ø1	1,13 días	mi 16/3/16	ju 17/3/16	47,62 días
##	02.05.12.03.03	CODO PVC SAP 90° x Ø2"	1,13 días	mi 16/3/16	ju 17/3/16	47,62 días
##	02.05.12.03.04	TEE PVC SAL Ø2"	1,13 días	mi 16/3/16	ju 17/3/16	47,62 días
##	02.05.12.03.05	TEE PVC SAP Ø1.1/2"	1,13 días	mi 16/3/16	ju 17/3/16	47,62 días
##	02.05.12.03.06	TEE PVC SAP Ø1"	1,13 días	mi 16/3/16	ju 17/3/16	47,62 días
##	<b>02.05.12.04</b>	<b>VALVULAS</b>	<b>1,13 días</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>mi 16/3/16</b>	<b>48,75 días</b>
##	02.05.12.04.01	VALVULA CHECK DE 1"	1,13 días	ma 15/3/16	mi 16/3/16	48,75 días
##	02.05.12.04.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1.1/2"	1,13 días	ma 15/3/16	mi 16/3/16	48,75 días
##	<b>02.05.12.05</b>	<b>ABRAZADERAS</b>	<b>1 día</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>39,86 días</b>
##	02.05.12.05.01	ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 1"	1 día	ju 24/3/16	vi 25/3/16	39,86 días
##	02.05.12.05.02	ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 1½"	1 día	ju 24/3/16	vi 25/3/16	39,86 días
##	02.05.12.05.03	ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 2"	1 día	ju 24/3/16	vi 25/3/16	39,86 días
##	<b>02.06</b>	<b>SERVICIO HIGIENICO Y LAVADERO EXTERIOR</b>	<b>22 días</b>	<b>ma 8/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>30,75 días</b>
##	<b>02.06.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>4 días</b>	<b>ma 8/3/16</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>30,75 días</b>
##	<b>02.06.01.01</b>	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>1 día</b>	<b>ma 8/3/16</b>	<b>ma 8/3/16</b>	<b>30,75 días</b>
##	02.06.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1 día	ma 8/3/16	ma 8/3/16	30,75 días
##	<b>02.06.01.02</b>	<b>RELLENOS</b>	<b>3 días</b>	<b>mi 9/3/16</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>30,75 días</b>
##	02.06.01.02.01	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	mi 9/3/16	mi 9/3/16	30,75 días
##	02.06.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO MENOR	1 día	vi 11/3/16	vi 11/3/16	53 días
##	02.06.01.02.03	BASE GRANULAR COMPACTADO DESDE NIVELES DE FONDO HASTA FALSO PISO	1 día	vi 11/3/16	vi 11/3/16	53 días
##	<b>02.06.01.03</b>	<b>ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE</b>	<b>1 día</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>53 días</b>
##	02.06.01.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	vi 11/3/16	vi 11/3/16	53 días
##	<b>02.06.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	<b>16 días</b>	<b>ju 10/3/16</b>	<b>sá 26/3/16</b>	<b>30,75 días</b>
##	<b>02.06.02.01</b>	<b>CIMENTOS CORRIDOS</b>	<b>1 día</b>	<b>ju 10/3/16</b>	<b>ju 10/3/16</b>	<b>30,75 días</b>
##	02.06.02.01.01	CONCRETO P/CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30% P.G MAX. 6"	1 día	ju 10/3/16	ju 10/3/16	30,75 días
##	<b>02.06.02.02</b>	<b>SOBRECIMIENTO</b>	<b>1 día</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	02.06.02.02.01	CONCRETO P/SOBRECIMIENTO 1:8 C:H + 25% P.M ØMAX. 3"	1 día	vi 11/3/16	vi 11/3/16	30,87 días
##	02.06.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOBRECIMIENTO	1 día	vi 11/3/16	vi 11/3/16	30,87 días
##	<b>02.06.02.03</b>	<b>VEREDAS</b>	<b>2 días</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>sá 26/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	02.06.02.03.01	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/VEREDAS	1 día	ju 24/3/16	vi 25/3/16	30,87 días
##	02.06.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDAS	1 día	ju 24/3/16	vi 25/3/16	30,87 días
##	02.06.02.03.03	JUNTA ASFALTICA DE DILATACION Y CONTRACCION 1/2" P/VEREDAS	1 día	vi 25/3/16	sá 26/3/16	30,87 días
##	<b>02.06.02.04</b>	<b>FALSO PISO</b>	<b>1 día</b>	<b>sá 12/3/16</b>	<b>sá 12/3/16</b>	<b>52 días</b>
##	02.06.02.04.01	CONCRETO FALSO PISO e=4" 1:6 C:H	1 día	sá 12/3/16	sá 12/3/16	52 días
##	<b>02.06.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>	<b>5 días</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	<b>02.06.03.01</b>	<b>VIGAS</b>	<b>2 días</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	02.06.03.01.01	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/VIGAS	1 día	ma 15/3/16	ma 15/3/16	30,87 días
##	02.06.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VIGAS	1 día	lu 14/3/16	lu 14/3/16	30,87 días
##	02.06.03.01.03	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60-P/VIGAS	1 día	lu 14/3/16	lu 14/3/16	50 días
##	<b>02.06.03.02</b>	<b>LOSA MACISAS</b>	<b>2 días</b>	<b>mi 16/3/16</b>	<b>vi 18/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	02.06.03.02.01	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/LOSA MACIZA	1 día	ju 17/3/16	vi 18/3/16	42 días
##	02.06.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA MACIZA	1 día	mi 16/3/16	ju 17/3/16	30,87 días
##	02.06.03.02.03	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	mi 16/3/16	ju 17/3/16	48 días
##	<b>02.06.03.03</b>	<b>LAVADERO</b>	<b>2 días</b>	<b>ju 17/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	02.06.03.03.01	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/LAVADERO	1 día	vi 18/3/16	sá 19/3/16	30,87 días
##	02.06.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL/LAVADERO	1 día	ju 17/3/16	vi 18/3/16	30,87 días
##	02.06.03.03.03	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	ju 17/3/16	vi 18/3/16	47 días
##	<b>02.06.04</b>	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>	<b>2 días</b>	<b>sá 12/3/16</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	02.06.04.01	MURO DE LADRILLO SOGA KK 18 HUECOS C:A 1:5; JUNTA 1.5 CM.	2 días	sá 12/3/16	do 13/3/16	30,87 días
##	<b>02.06.05</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTO</b>	<b>3 días</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	02.06.05.01	TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	1 día	sá 19/3/16	do 20/3/16	30,87 días
##	02.06.05.02	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	1 día	sá 19/3/16	do 20/3/16	30,87 días
##	02.06.05.03	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN SUPERFICIES INTERIORES C:A 1:5 E=1.0CM	1 día	do 20/3/16	lu 21/3/16	30,87 días
##	02.06.05.04	TARRAJEO COLUMNAS MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	1 día	do 20/3/16	lu 21/3/16	30,87 días
##	02.06.05.05	TARRAJEO VIGAS SUPERFICIE MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	1 día	do 20/3/16	lu 21/3/16	30,87 días
##	02.06.05.06	TARRAJEO EN DERRAMES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	1 día	lu 21/3/16	ma 22/3/16	30,87 días
##	<b>02.06.06</b>	<b>CIELORRASO</b>	<b>2 días</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	<b>02.06.06.01</b>	<b>CIELORRASO CON MEZCLA</b>	<b>2 días</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	02.06.06.01.01	CIELORRASO CON MEZC. C:A 1:4 E=1.5CM	2 días	ma 22/3/16	ju 24/3/16	30,87 días
##	<b>02.06.07</b>	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>	<b>2 días</b>	<b>mi 23/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>40 días</b>
##	<b>02.06.07.01</b>	<b>CONTRAPISOS</b>	<b>1 día</b>	<b>mi 23/3/16</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>40 días</b>
##	02.06.07.01.01	CONTRAPISO E=4 CM BASE 3 CM. MEZC. C:H 1:5 ACAB. 1 CM. PASTA C:A 1:2 (ACABADO SEMIPULIDO)	1 día	mi 23/3/16	ju 24/3/16	40 días
##	<b>02.06.07.02</b>	<b>PISOS</b>	<b>1 día</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>40 días</b>
##	02.06.07.02.01	PISO CERAMICO 30x30cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO E=7.2mm	1 día	ju 24/3/16	vi 25/3/16	40 días
##	<b>02.06.08</b>	<b>ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS</b>	<b>1 día</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>40 días</b>
##	<b>02.06.08.01</b>	<b>ZOCALOS</b>	<b>1 día</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>40 días</b>
##	02.06.08.01.01	ZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO H=0.60m	1 día	ju 24/3/16	vi 25/3/16	40 días
##	02.06.08.01.02	ZOCALO DE CERAMICO 30 X 30 cm	1 día	ju 24/3/16	ju 24/3/16	40 días
##	<b>02.06.08.02</b>	<b>CONTRAZOCALOS</b>	<b>1 día</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>40 días</b>
##	02.06.08.02.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO h=0.10m	1 día	ju 24/3/16	vi 25/3/16	40 días
##	<b>02.06.09</b>	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>	<b>3 días</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>35 días</b>
##	02.06.09.01	PUERTA DE MADERA TORNILLO MACIZA C/MARCO DE MADERA 2"x6" C/TOPES DE ACERO DE MEDIA LUNA	2 días	ma 22/3/16	ju 24/3/16	35 días
##	02.06.09.02	VENTANA DE MADERA CON MARCO DE MADERA TORNILLO CON BARROTES DE SEGURIDAD DE FIERRO LISO Ø1/2"	1 día	ju 24/3/16	vi 25/3/16	40 días
##	<b>02.06.10</b>	<b>CERRAJERIA</b>	<b>3 días</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>35 días</b>
##	02.06.10.01	BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADA PARA PUERTAS 3 1/2" x 3 1/2"	1 día	ma 22/3/16	mi 23/3/16	35 días
##	02.06.10.02	CERRADURA 3 GOLPES DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA	1 día	mi 23/3/16	ju 24/3/16	35 días
##	02.06.10.03	CANDADO (PUERTA DOBLE HOJA)	1 día	ju 24/3/16	vi 25/3/16	35 días
##	<b>02.06.11</b>	<b>PINTURA</b>	<b>2,13 días</b>	<b>sá 26/3/16</b>	<b>lu 28/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	02.06.11.01	PINTURA MUROS INTERIORES LATEX MATE - 2 MANOS COLOR BLANCO HUMO	1,13 días	sá 26/3/16	do 27/3/16	30,87 días
##	02.06.11.02	PINTURA MUROS EXTERIORES ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO MARACUYA	1,13 días	sá 26/3/16	do 27/3/16	30,87 días
##	02.06.11.03	PINTURA LATEX MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR BLANCO HUMO	1 día	do 27/3/16	lu 28/3/16	30,87 días
##	02.06.11.04	PINTURA ESMALTE SINTETICO - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO	1 día	do 27/3/16	lu 28/3/16	30,87 días
##	<b>02.06.12</b>	<b>APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>	<b>5 días</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>35 días</b>
##	<b>02.06.12.01</b>	<b>SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS</b>	<b>2 días</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>do 27/3/16</b>	<b>35 días</b>
##	02.06.12.01.01	INODORO ONE PICE LIBERTY	1 día	vi 25/3/16	sá 26/3/16	35 días
##	02.06.12.01.02	LAVATORIO PEDESTAL NACIONAL BLANCO	1 día	sá 26/3/16	do 27/3/16	35 días
##	<b>02.06.12.02</b>	<b>SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS</b>	<b>3 días</b>	<b>do 27/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>35 días</b>
##	02.06.12.02.01	JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO PARA EMPOTRAR	1 día	do 27/3/16	lu 28/3/16	35 días
##	02.06.12.02.02	GANCHO DOBLE LOSA BLANCA	1 día	do 27/3/16	lu 28/3/16	35 días
##	02.06.12.02.03	PAPELERA DE LOSA BLANCA, PARA EMPOTRAR	1 día	lu 28/3/16	ma 29/3/16	35 días
##	02.06.12.02.04	GRIFERIA PARA DUCHA CROMADA, INCL. ACCESORIOS	1 día	ma 29/3/16	mi 30/3/16	35 días
##	02.06.12.02.05	GRIFERIA DE BRONCE PESADO CROMADO SIMPLE TIPO ESFERICA P/LAVATORIO	1 día	ma 29/3/16	mi 30/3/16	35 días
##	<b>02.06.13</b>	<b>INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS</b>	<b>1 día</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>sá 26/3/16</b>	<b>39 días</b>
##	02.06.13.01	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	1 día	vi 25/3/16	sá 26/3/16	39 días
##	<b>02.06.14</b>	<b>INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS</b>	<b>1 día</b>	<b>do 27/3/16</b>	<b>lu 28/3/16</b>	<b>37 días</b>
##	02.06.14.01	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	1 día	do 27/3/16	lu 28/3/16	37 días
##	<b>02.06.15</b>	<b>SISTEMA DE AGUA FRIA</b>	<b>1 día</b>	<b>vi 18/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>42 días</b>
##	<b>02.06.15.01</b>	<b>SALIDAS DE AGUA FRIA</b>	<b>1 día</b>	<b>vi 18/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>42 días</b>
##	02.06.15.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1/2"	1 día	vi 18/3/16	sá 19/3/16	42 días
##	<b>02.06.15.02</b>	<b>REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA</b>	<b>1 día</b>	<b>vi 18/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>42 días</b>
##	02.06.15.02.01	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø3/4	1 día	vi 18/3/16	sá 19/3/16	42 días
##	02.06.15.02.02	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1/2"	1 día	vi 18/3/16	sá 19/3/16	42 días
##	<b>02.06.15.03</b>	<b>ACCESORIOS DE RED DE AGUA</b>	<b>1 día</b>	<b>vi 18/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>42 días</b>
##	02.06.15.03.01	CODO PVC SAP 90° x Ø1/2"	1 día	vi 18/3/16	sá 19/3/16	42 días
##	02.06.15.03.02	TEE PVC SAP 90°xØ3/4"	1 día	vi 18/3/16	sá 19/3/16	42 días
##	02.06.15.03.03	TEE PVC SAP 90° x Ø1/2	1 día	vi 18/3/16	sá 19/3/16	42 días
##	02.06.15.03.04	REDUCCION PVC SAP 1.1/2" A 1"	1 día	vi 18/3		


##	02.06.15.03.06	REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2	1 día	vi 18/3/16	sá 19/3/16	42 días
##	02.06.15.03.07	UNIONES UNIVERSALES 1/2"	1 día	vi 18/3/16	sá 19/3/16	42 días
##	<b>02.06.15.04</b>	<b>VALVULAS DE RED DE AGUA</b>	<b>1 día</b>	<b>vi 18/3/16</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>42 días</b>
##	02.06.15.04.01	VALVULA DE PASO 1/2"	1 día	vi 18/3/16	sá 19/3/16	42 días
##	<b>02.06.16</b>	<b>DESAGÜE Y VENTILACION</b>	<b>2 días</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>lu 21/3/16</b>	<b>42 días</b>
##	<b>02.06.16.01</b>	<b>SALIDAS DE DESAGUE</b>	<b>2 días</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>lu 21/3/16</b>	<b>42 días</b>
##	02.06.16.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2"	1 día	sá 19/3/16	do 20/3/16	42 días
##	02.06.16.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4"	1 día	do 20/3/16	lu 21/3/16	44 días
##	<b>02.06.16.02</b>	<b>REDES COLECTORAS INTERIORES DE DESAGUE</b>	<b>2 días</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>lu 21/3/16</b>	<b>42 días</b>
##	02.06.16.02.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL Ø4	1 día	do 20/3/16	lu 21/3/16	44 días
##	02.06.16.02.02	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL Ø2"	1 día	sá 19/3/16	do 20/3/16	42 días
##	02.06.16.02.03	TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL Ø2"	1 día	do 20/3/16	lu 21/3/16	44 días
##	<b>02.06.16.03</b>	<b>ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS DESAGÜE</b>	<b>2 días</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>lu 21/3/16</b>	<b>42 días</b>
##	02.06.16.03.01	YEE PVC SAL Ø4"x2"	1 día	do 20/3/16	lu 21/3/16	44 días
##	02.06.16.03.02	DOBLE YEE PVC SAL Ø4"x2"	1 día	do 20/3/16	lu 21/3/16	44 días
##	02.06.16.03.03	CODO PVC SAL 90° x Ø2"	1 día	sá 19/3/16	do 20/3/16	42 días
##	02.06.16.03.04	CODO PVC SAL 45° x Ø4"	1,13 días	sá 19/3/16	lu 21/3/16	44 días
##	02.06.16.03.05	CODO PVC SAL 45° x Ø2"	1 día	do 20/3/16	lu 21/3/16	44 días
##	02.06.16.03.06	CODO CON VENTILACION PVC SAL 90° x Ø4"	1 día	do 20/3/16	lu 21/3/16	44 días
##	02.06.16.03.07	TEE SANITARIA PVC SAL Ø2	1 día	sá 19/3/16	do 20/3/16	42 días
##	<b>02.06.17</b>	<b>INSTALACIONES ESPECIALES</b>	<b>3 días</b>	<b>do 20/3/16</b>	<b>mi 23/3/16</b>	<b>42 días</b>
##	02.06.17.01	TRAMPA "P" PVC SAL Ø2	1 día	do 20/3/16	lu 21/3/16	42 días
##	02.06.17.02	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE 2"	1 día	lu 21/3/16	ma 22/3/16	42 días
##	02.06.17.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"	1 día	ma 22/3/16	mi 23/3/16	42 días
##	02.06.17.04	REJILLA DE BRONCE PARA DUCHA DE 2"	1 día	ma 22/3/16	mi 23/3/16	42 días
##	<b>02.07</b>	<b>TENDAL</b>	<b>3 días</b>	<b>lu 28/3/16</b>	<b>ju 31/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	<b>02.07.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>1 día</b>	<b>lu 28/3/16</b>	<b>ma 29/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	<b>02.07.01.01</b>	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>1 día</b>	<b>lu 28/3/16</b>	<b>ma 29/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	02.07.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1 día	lu 28/3/16	ma 29/3/16	30,87 días
##	<b>02.07.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	<b>2 días</b>	<b>ma 29/3/16</b>	<b>ju 31/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	<b>02.07.02.01</b>	<b>BASES DE CONCRETO</b>	<b>2 días</b>	<b>ma 29/3/16</b>	<b>ju 31/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	02.07.02.01.01	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/DADOS	1 día	mi 30/3/16	ju 31/3/16	30,87 días
##	02.07.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO /DADOS	1 día	ma 29/3/16	mi 30/3/16	30,87 días
##	<b>02.07.03</b>	<b>ESTRUCTURA DE MADERA</b>	<b>1 día</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>ju 31/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	<b>02.07.03.01</b>	<b>COLUMNAS-VIGAS</b>	<b>1 día</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>ju 31/3/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	02.07.03.01.01	PARANTES Y TRAVESAÑO DE MADERA NOGAL 4"x4"	1 día	mi 30/3/16	ju 31/3/16	30,87 días
##	<b>02.08</b>	<b>DADOS DE CONCRETO PARA POSTE FOTOVOLTAICO</b>	<b>3 días</b>	<b>ju 31/3/16</b>	<b>do 3/4/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	<b>02.08.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>3 días</b>	<b>ju 31/3/16</b>	<b>do 3/4/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	<b>02.08.01.01</b>	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>1 día</b>	<b>ju 31/3/16</b>	<b>vi 1/4/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	02.08.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1 día	ju 31/3/16	vi 1/4/16	30,87 días
##	<b>02.08.01.02</b>	<b>ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE</b>	<b>1 día</b>	<b>sá 2/4/16</b>	<b>do 3/4/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	02.08.01.02.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	sá 2/4/16	do 3/4/16	30,87 días
##	<b>02.08.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	<b>1 día</b>	<b>vi 1/4/16</b>	<b>sá 2/4/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	<b>02.08.02.01</b>	<b>BASES DE CONCRETO</b>	<b>1 día</b>	<b>vi 1/4/16</b>	<b>sá 2/4/16</b>	<b>30,87 días</b>
##	02.08.02.01.01	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/DADOS	1 día	vi 1/4/16	sá 2/4/16	30,87 días
##	02.08.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO /DADOS	1 día	vi 1/4/16	sá 2/4/16	30,87 días
##	<b>02.09</b>	<b>CUNETA PERIMETRAL Y COLUMNETA DE BAJADA</b>	<b>54 días</b>	<b>sá 5/3/16</b>	<b>mi 27/4/16</b>	<b>6 días</b>
##	<b>02.09.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>5 días</b>	<b>sá 16/4/16</b>	<b>ju 21/4/16</b>	<b>6 días</b>
##	<b>02.09.01.01</b>	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>2 días</b>	<b>sá 16/4/16</b>	<b>lu 18/4/16</b>	<b>6 días</b>
##	02.09.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CUNETA PERIMETRAL	2 días	sá 16/4/16	lu 18/4/16	6 días
##	<b>02.09.01.02</b>	<b>ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE</b>	<b>3 días</b>	<b>lu 18/4/16</b>	<b>ju 21/4/16</b>	<b>13 días</b>
##	02.09.01.02.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	3 días	lu 18/4/16	ju 21/4/16	13 días
##	<b>02.09.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	<b>10 días</b>	<b>lu 18/4/16</b>	<b>mi 27/4/16</b>	<b>6 días</b>
##	02.09.02.01	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/CUNETAS	1 día	mi 20/4/16	mi 20/4/16	13 días
##	02.09.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/CUNETAS	10 días	lu 18/4/16	mi 27/4/16	6 días
##	02.09.02.03	JUNTA ASFALTICA DE DILATACION Y CONTRACCION 1/2" P/VEREDAS	1 día	ma 19/4/16	mi 20/4/16	13 días
##	<b>02.09.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>	<b>4 días</b>	<b>sá 5/3/16</b>	<b>ma 8/3/16</b>	<b>40 días</b>
##	02.09.03.01	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/CUNETAS DE BAJADA	1 día	ma 8/3/16	ma 8/3/16	56 días
##	02.09.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/COLUMNETAS DE BAJADA	1 día	lu 7/3/16	lu 7/3/16	38 días
##	02.09.03.03	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	sá 5/3/16	sá 5/3/16	59 días
##	<b>02.09.04</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTO</b>	<b>5 días</b>	<b>ma 8/3/16</b>	<b>sá 12/3/16</b>	<b>38 días</b>
##	02.09.04.01	TARRAJEO COLUMNAS MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	5 días	ma 8/3/16	sá 12/3/16	38 días
##	<b>02.09.05</b>	<b>PINTURA</b>	<b>1 día</b>	<b>mi 16/3/16</b>	<b>mi 16/3/16</b>	<b>38 días</b>
##	02.09.05.01	PINTURA ESMALTE SINTETICO - 2 MANOS EN COLUMNAS DE BAJADA Y TUBERIA PLUVIAL COLOR BLANCO HUMO	1 día	mi 16/3/16	mi 16/3/16	38 días
##	<b>02.09.06</b>	<b>OTROS</b>	<b>14 días</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>sá 26/3/16</b>	<b>38 días</b>
##	<b>02.09.06.01</b>	<b>REJILLAS</b>	<b>5 días</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>sá 26/3/16</b>	<b>38 días</b>
##	02.09.06.01.01	REJILLA TIPO PARRILLA DE PVC PESADO PARA CUNETAS	5 días	ma 22/3/16	sá 26/3/16	38 días
##	<b>02.09.06.02</b>	<b>ACCESORIOS SANITARIOS DE COLUMNETAS DE BAJADA</b>	<b>3 días</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>49 días</b>
##	02.09.06.02.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAP Ø4 C-5	1 día	ma 15/3/16	ma 15/3/16	49 días
##	02.09.06.02.02	CODO PVC SAP 90° x Ø4"	3 días	do 13/3/16	ma 15/3/16	49 días
##	<b>02.10</b>	<b>MUROS CORTAVIENTOS</b>	<b>22 días</b>	<b>vi 8/4/16</b>	<b>vi 29/4/16</b>	<b>4 días</b>
##	<b>02.10.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>3 días</b>	<b>do 10/4/16</b>	<b>ma 12/4/16</b>	<b>4 días</b>
##	<b>02.10.01.01</b>	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>1 día</b>	<b>do 10/4/16</b>	<b>do 10/4/16</b>	<b>4 días</b>
##	02.10.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1 día	do 10/4/16	do 10/4/16	4 días
##	<b>02.10.01.02</b>	<b>RELLENOS</b>	<b>1 día</b>	<b>lu 11/4/16</b>	<b>lu 11/4/16</b>	<b>21 días</b>
##	02.10.01.02.01	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	lu 11/4/16	lu 11/4/16	21 días
##	<b>02.10.01.03</b>	<b>ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE</b>	<b>1 día</b>	<b>ma 12/4/16</b>	<b>ma 12/4/16</b>	<b>21 días</b>
##	02.10.01.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	ma 12/4/16	ma 12/4/16	21 días
##	<b>02.10.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	<b>6 días</b>	<b>vi 8/4/16</b>	<b>mi 13/4/16</b>	<b>4 días</b>
##	<b>02.10.02.01</b>	<b>CIMENTOS CORRIDOS</b>	<b>1 día</b>	<b>lu 11/4/16</b>	<b>lu 11/4/16</b>	<b>4 días</b>
##	02.10.02.01.01	CONCRETO P/CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30% P.G ØMAX. 6"	1 día	lu 11/4/16	lu 11/4/16	4 días
##	<b>02.10.02.02</b>	<b>SOBRECIMIENTO</b>	<b>6 días</b>	<b>vi 8/4/16</b>	<b>mi 13/4/16</b>	<b>4 días</b>
##	02.10.02.02.01	CONCRETO P/SOBRECIMIENTO 1:8 C:H + 25% P.M ØMAX. 3"	1 día	mi 13/4/16	mi 13/4/16	4 días
##	02.10.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOBRECIMIENTO	1 día	ma 12/4/16	ma 12/4/16	4 días
##	02.10.02.02.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/SOBRECIMIENTO (MECHAS)	1 día	vi 8/4/16	vi 8/4/16	7 días
##	<b>02.10.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>	<b>19 días</b>	<b>lu 11/4/16</b>	<b>vi 29/4/16</b>	<b>4 días</b>
##	<b>02.10.03.01</b>	<b>COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO</b>	<b>9 días</b>	<b>lu 11/4/16</b>	<b>ma 19/4/16</b>	<b>10 días</b>
##	02.10.03.01.01	CONCRETO f'c=kg/cm2 P/COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	1 día	ma 19/4/16	ma 19/4/16	4 días
##	02.10.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	2 días	do 17/4/16	lu 18/4/16	4 días
##	02.10.03.01.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	1 día	lu 11/4/16	lu 11/4/16	20 días
##	<b>02.10.03.02</b>	<b>VIGUETAS DE CONFINAMIENTO</b>	<b>11 días</b>	<b>ma 12/4/16</b>	<b>vi 22/4/16</b>	<b>10 días</b>
##	02.10.03.02.01	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	1 día	vi 22/4/16	vi 22/4/16	4 días
##	02.10.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	2 días	mi 20/4/16	ju 21/4/16	4 días
##	02.10.03.02.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	1 día	ma 12/4/16	ma 12/4/16	20 días
##	<b>02.10.04</b>	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>	<b>1 día</b>	<b>ju 14/4/16</b>	<b>ju 14/4/16</b>	<b>4 días</b>
##	02.10.04.01	MURO DE LADRILLO SOGA KK 18 HUECOS C:A 1:5; JUNTA 1.5 CM.	1 día	ju 14/4/16	ju 14/4/16	4 días
##	<b>02.10.05</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTO</b>	<b>4 días</b>	<b>sá 23/4/16</b>	<b>ma 26/4/16</b>	<b>4 días</b>
##	02.10.05.01	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	2 días	sá 23/4/16	do 24/4/16	4 días
##	02.10.05.02	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	2 días	lu 25/4/16	ma 26/4/16	4 días
##	<b>02.10.06</b>	<b>CONTRAZOCALOS</b>	<b>1 día</b>	<b>mi 27/4/16</b>	<b>mi 27/4/16</b>	<b>4 días</b>
##	02.10.06.01	CONTRAZOCALOS DE CEMENTO SEMIPULIDO h=0.20m	1 día	mi 27/4/16	mi 27/4/16	4 días
##	<b>02.10.07</b>	<b>PINTURA</b>	<b>2 días</b>	<b>ju 28/4/16</b>	<b>vi 29/4/16</b>	<b>4 días</b>
##	02.10.07.01	PINTURA MUROS EXTERIORES OLEO MATE - 2 MANOS COLOR AMARILLO MARACUYA	1 día	ju 28/4/16	ju 28/4/16	5 días
##	02.10.07.02	PINTURA AL OLEO MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO	1 día	ju 28/4/16	ju 28/4/16	4 días
##	02.10.07.03	PINTURA ESMALTE SINTETICO ROJO TEJA - 2 MANOS ZOCALO COLOR ROJO TEJA H=0.20m	1 día	vi 29/4/16	vi 29/4/16	4 días
##	<b>02.10.08</b>	<b>BANCA DE CONCRETO EN PATIO</b>	<b>12 días</b>	<b>mi 13/4/16</b>	<b>do 24/4/16</b>	<b>9 días</b>
##	02.10.08.01	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/BANCA EN PATIO	1 día	do 24/4/16	do 24/4/16	9 días
##	02.10.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/BANCA EN PATIO	2 días	vi 22/4/16	sá 23/4/16	9 días
##	02.10.08.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200kg/cm2 GRADO 60-P/BANCA EN PATIO	1 día	mi 13/4/16	mi 13/4/16	20 días
##	<b>02.11</b>	<b>POZO DE CAPTACION Y CASETA DE BOMBEO</b>	<b>71 días</b>	<b>ma 23/2/16</b>	<b>ma 3/5/16</b>	<b>0 días</b>
##	<b>02.11.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>	<b>2 días</b>	<b>lu 29/2/16</b>	<b>ma 1/3/16</b>	<b>0 días</b>
##	02.11.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	1 día	lu 29/2/16	lu 29/2/16	0 días
##	02.11.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	1 día	ma 1/3/16	ma 1/3/16	0 días
##	<b>02.11.02</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>4 días</b>	<b>mi 2/3/16</b>	<b>sá 5/3/16</b>	<b>0 días</b>

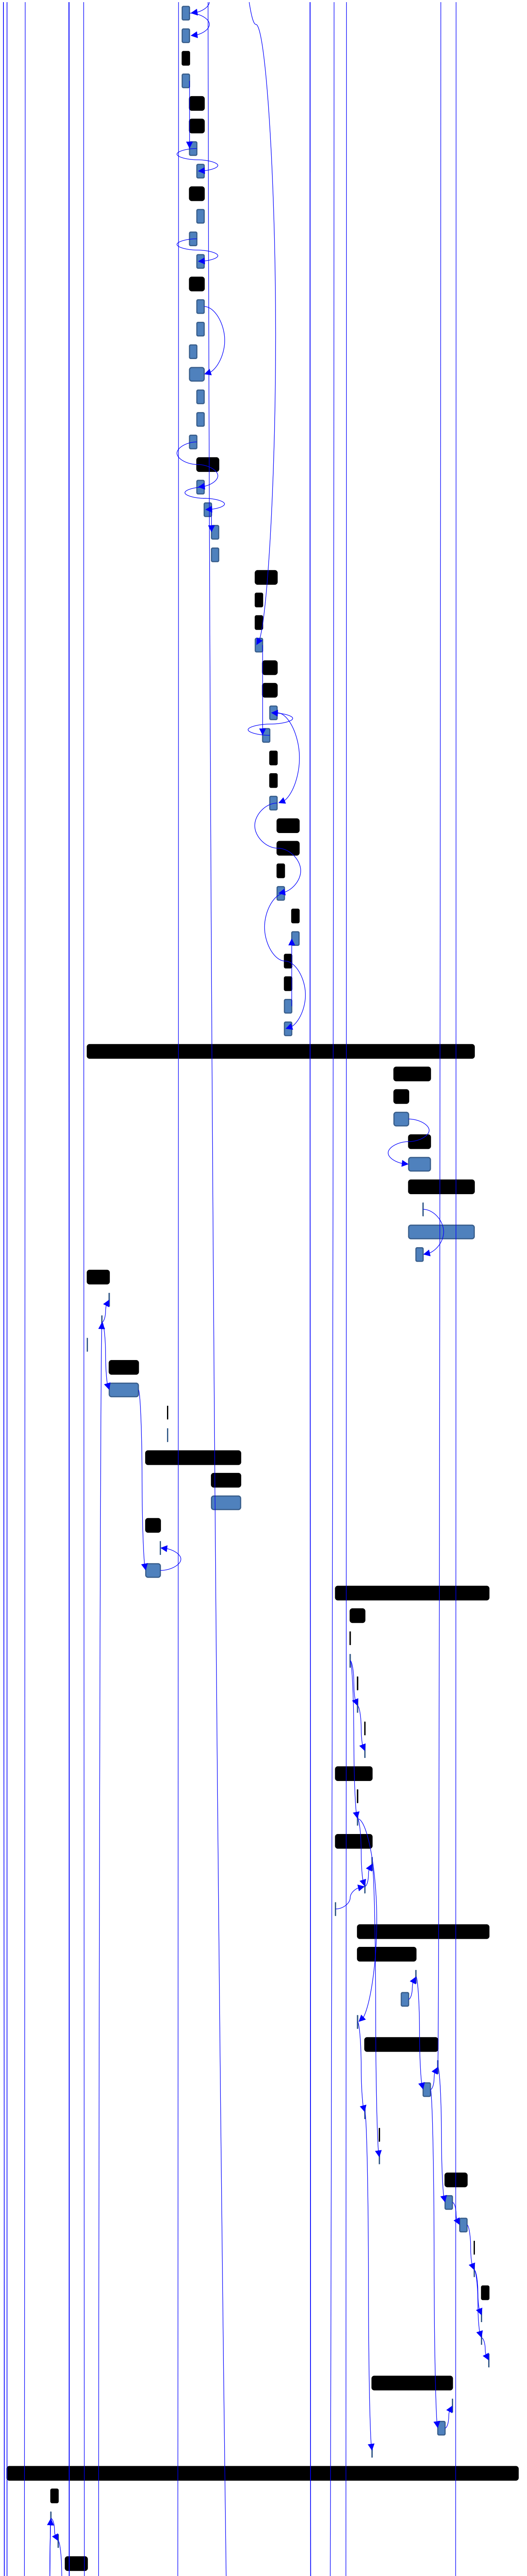


##	02.11.02.01	EXCAVACIONES	4 días	mi 2/3/16	sá 5/3/16	0 días
##	02.11.02.02	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	4 días	mi 2/3/16	sá 5/3/16	0 días
##	02.11.03	RELLENOS	15 días	do 6/3/16	do 20/3/16	0 días
##	02.11.03.01	REFINE Y COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	2 días	do 6/3/16	lu 7/3/16	0 días
##	02.11.03.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/ EQUIPO MENOR	1 día	ma 8/3/16	ma 8/3/16	0 días
##	02.11.03.03	FILTRO CON MATERIAL SELECCIONADO Ø3/4"	1 día	mi 9/3/16	mi 9/3/16	0 días
##	02.11.03.04	FILTRO CON MATERIAL SELECCIONADO Ø1/4 "	1 día	mi 9/3/16	mi 9/3/16	0 días
##	02.11.03.05	RELLENO CON GRAVA Y ARENA SELECCIONADA	8 días	do 13/3/16	do 20/3/16	44 días
##	02.11.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	5 días	mi 9/3/16	do 13/3/16	51 días
##	02.11.04.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=50M	5 días	mi 9/3/16	do 13/3/16	51 días
##	02.11.05	TABLADO ESTACADO PARA EXCAVACIONES DE POZO	6 días	lu 29/2/16	sá 5/3/16	0 días
##	02.11.05.01	ENTIBADO DE POZO	6 días	lu 29/2/16	sá 5/3/16	0 días
##	02.11.06	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	21 días	mi 23/3/16	ma 12/4/16	0 días
##	02.11.06.01	CIMENTOS CORRIDOS	4 días	mi 23/3/16	sá 26/3/16	0 días
##	02.11.06.01.01	CONCRETO P/CIMIENTO CORRIDO C.A - 1:8	4 días	mi 23/3/16	sá 26/3/16	0 días
##	02.11.06.02	SOBRECIMENTOS	6 días	do 27/3/16	vi 1/4/16	32 días
##	02.11.06.02.01	CONCRETO P/SOBRECIMENTOS 1:6 C:H	3 días	mi 30/3/16	vi 1/4/16	32 días
##	02.11.06.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOBRECIMIENTO	3 días	do 27/3/16	ma 29/3/16	32 días
##	02.11.06.03	VEREDAS	3 días	do 10/4/16	ma 12/4/16	21 días
##	02.11.06.03.01	CONCRETO f'c=175kg/cm2	1 día	ma 12/4/16	ma 12/4/16	21 días
##	02.11.06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDAS	2 días	do 10/4/16	lu 11/4/16	21 días
##	02.11.06.03.03	JUNTA ASFALTICA DE DILATAION Y CONTRACCION 1/2 " P/VEREDAS	1 día	ma 12/4/16	ma 12/4/16	21 días
##	02.11.07	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	32 días	ju 10/3/16	do 10/4/16	0 días
##	02.11.07.01	ANILLOS DE CONCRETO CIEGO	10 días	ju 10/3/16	sá 19/3/16	0 días
##	02.11.07.01.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 P/ANILLOS	8 días	sá 12/3/16	sá 19/3/16	0 días
##	02.11.07.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANILLOS	8 días	vi 11/3/16	vi 18/3/16	0 días
##	02.11.07.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	8 días	ju 10/3/16	ju 17/3/16	0 días
##	02.11.07.02	COLUMNAS	11 días	mi 23/3/16	sá 2/4/16	0 días
##	02.11.07.02.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 P/COLUMNAS	2 días	vi 1/4/16	sá 2/4/16	0 días
##	02.11.07.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/COLUMNAS	4 días	lu 28/3/16	ju 31/3/16	0 días
##	02.11.07.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	2 días	mi 23/3/16	ju 24/3/16	0 días
##	02.11.07.03	VIGAS	7 días	do 3/4/16	sá 9/4/16	0 días
##	02.11.07.03.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 P/VIGAS	2 días	vi 8/4/16	sá 9/4/16	0 días
##	02.11.07.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VIGAS	3 días	ma 5/4/16	ju 7/4/16	0 días
##	02.11.07.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	2 días	do 3/4/16	lu 4/4/16	0 días
##	02.11.07.04	LOSAS MACISAS	6 días	ma 5/4/16	do 10/4/16	5 días
##	02.11.07.04.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm2-P/LOSA MACIZA	1 día	do 10/4/16	do 10/4/16	0 días
##	02.11.07.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA MACIZA	3 días	vi 8/4/16	do 10/4/16	23 días
##	02.11.07.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	3 días	ma 5/4/16	ju 7/4/16	26 días
##	02.11.07.05	TAPAS DE CONCRETO DE POZO	3 días	do 20/3/16	ma 22/3/16	0 días
##	02.11.07.05.01	CONCRETO f'c=210 Kg/cm2-P/TAPAS	1 día	ma 22/3/16	ma 22/3/16	0 días
##	02.11.07.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TAPAS	1 día	lu 21/3/16	lu 21/3/16	0 días
##	02.11.07.05.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	1 día	do 20/3/16	do 20/3/16	0 días
##	02.11.08	ALBAÑILERIA	3 días	vi 25/3/16	do 27/3/16	0 días
##	02.11.08.01	MURO LADRILLO SOGA KK 18 HUECOS C:A 1:5; JUNTA 1.5 CM	3 días	vi 25/3/16	do 27/3/16	0 días
##	02.11.09	REVOQUES Y ENLUCIDOS	11 días	ma 12/4/16	vi 22/4/16	0 días
##	02.11.09.01	TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	4 días	ma 12/4/16	vi 15/4/16	0 días
##	02.11.09.02	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	4 días	lu 18/4/16	ju 21/4/16	0 días
##	02.11.09.03	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	2 días	sá 16/4/16	do 17/4/16	0 días
##	02.11.09.04	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	4 días	ma 12/4/16	vi 15/4/16	18 días
##	02.11.09.05	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	2 días	mi 20/4/16	ju 21/4/16	0 días
##	02.11.09.06	VESTIDURA DE DERRAMES MEZ. C:A 1:5 E=1.0 CM	1 día	vi 22/4/16	vi 22/4/16	0 días
##	02.11.10	CIELORRASOS	1 día	lu 11/4/16	lu 11/4/16	0 días
##	02.11.10.01	CIELORRASO CON MEZCLA	1 día	lu 11/4/16	lu 11/4/16	0 días
##	02.11.10.01.01	CIELORRASO CON MEZC. C:A 1:4, E=1.5 CM	1 día	lu 11/4/16	lu 11/4/16	0 días
##	02.11.11	PISOS Y PAVIMENTOS	1 día	sá 23/4/16	sá 23/4/16	0 días
##	02.11.11.01	PISOS DE CONCRETO	1 día	sá 23/4/16	sá 23/4/16	0 días
##	02.11.11.01.01	PISO CEMENTO PULIDO BRUÑADO EN CUADRADOS S=1%	1 día	sá 23/4/16	sá 23/4/16	0 días
##	02.11.12	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	4 días	do 24/4/16	mi 27/4/16	0 días
##	02.11.12.01	ZOCALOS	2 días	ma 26/4/16	mi 27/4/16	0 días
##	02.11.12.01.01	ZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 0.60M.	2 días	ma 26/4/16	mi 27/4/16	0 días
##	02.11.12.02	CONTRAZOCALOS	2 días	do 24/4/16	lu 25/4/16	0 días
##	02.11.12.02.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO h=0.10 m	2 días	do 24/4/16	lu 25/4/16	0 días
##	02.11.13	CARPINTERIA DE MADERA	2 días	ju 28/4/16	vi 29/4/16	0 días
##	02.11.13.01	PUERTA DE MADERA ESTRUCTURAL MACIZA INC. TOPES TIPO MEDIA LUNA	1 día	ju 28/4/16	ju 28/4/16	0 días
##	02.11.13.02	VENTANA DE MADERA CON MARCO DE MADERA TORNILLO CON BARROTES DE SEGURIDAD DE FIERRO LISO 1/2 "	1 día	vi 29/4/16	vi 29/4/16	0 días
##	02.11.14	CERRAJERIA	1 día	ju 28/4/16	ju 28/4/16	5 días
##	02.11.14.01	BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2 "	1 día	ju 28/4/16	ju 28/4/16	5 días
##	02.11.14.02	CERRADURA 3 GOLPES DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA EXTERIOR	1 día	ju 28/4/16	ju 28/4/16	5 días
##	02.11.14.03	CANDADO (PUERTA DOBLE HOJA)	1 día	ju 28/4/16	ju 28/4/16	5 días
##	02.11.15	PINTURA	4 días	sá 30/4/16	ma 3/5/16	0 días
##	02.11.15.01	PINTURA MUROS INTERIORES LATEX MATE - 2 MANOS COLOR BLANCO HUMO	2 días	sá 30/4/16	do 1/5/16	0 días
##	02.11.15.02	PINTURA MUROS EXTERIORES ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO MARACUYA	2 días	lu 2/5/16	ma 3/5/16	0 días
##	02.11.15.03	PINTURA LATEX MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR BLANCO HUMO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	02.11.15.04	PINTURA ESMALTE SINTETICO - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO	1 día	ma 3/5/16	ma 3/5/16	0 días
##	02.11.16	OTROS	53 días	ma 23/2/16	vi 15/4/16	0 días
##	02.11.16.01	ACCESORIOS PARA POZO	16 días	sá 12/3/16	do 27/3/16	37 días
##	02.11.16.01.01	GEOTEXTIL PARA PROTECCION CONTRA SEDIMENTOS	8 días	sá 12/3/16	sá 19/3/16	37 días
##	02.11.16.01.02	ACCESORIOS DE VENTILACION,RED DE SUCCION Y RED DE CONDUCCION	8 días	do 20/3/16	do 27/3/16	37 días
##	02.11.16.02	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA	2 días	lu 21/3/16	ma 22/3/16	42 días
##	02.11.16.02.01	TUBERIA PVC-P Ø 2 "	2 días	lu 21/3/16	ma 22/3/16	42 días
##	02.11.16.03	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA	1 día	ma 22/3/16	ma 22/3/16	42 días
##	02.11.16.03.01	CODO PVC SAP 90° x Ø2 "	1 día	ma 22/3/16	ma 22/3/16	42 días
##	02.11.16.03.02	CODO PVC SAP 90° x Ø1/2 "	1 día	ma 22/3/16	ma 22/3/16	42 días
##	02.11.16.03.03	TEE PVC SAP 90° x Ø1.1/2 "	1 día	ma 22/3/16	ma 22/3/16	42 días
##	02.11.16.03.04	TAPON PVC SAP DE CEBADO Ø1.1/2 "	1 día	ma 22/3/16	ma 22/3/16	42 días
##	02.11.16.03.05	UNION UNIVERSAL PVC SAP 2 "	1 día	ma 22/3/16	ma 22/3/16	42 días
##	02.11.16.03.06	UNION UNIVERSAL PVC SAP 1.1/2 "	1 día	ma 22/3/16	ma 22/3/16	42 días
##	02.11.16.03.07	TUBERIA DE VENTILACION DE F"6" DE 2 "	1 día	ma 22/3/16	ma 22/3/16	42 días
##	02.11.16.03.08	SOPORTE DE TUBERIA DE IMPULSION	1 día	ma 22/3/16	ma 22/3/16	42 días
##	02.11.16.04	VALVULAS	1 día	vi 15/4/16	vi 15/4/16	18 días
##	02.11.16.04.01	VALVULA DE PIE CON CANASTILLA DE BRONCE DE 2 "	1 día	vi 15/4/16	vi 15/4/16	18 días
##	02.11.16.04.02	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2 "	1 día	vi 15/4/16	vi 15/4/16	18 días
##	02.11.16.04.03	VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2 "	1 día	vi 15/4/16	vi 15/4/16	18 días
##	02.11.16.05	ESTUDIOS PREVIOS A LA EJECUCION	6 días	ma 23/2/16	do 28/2/16	0 días
##	02.11.16.05.01	ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGIVO DEL AGUA	6 días	ma 23/2/16	do 28/2/16	0 días
##	02.11.16.05.02	ESTUDIOS DE PROSPECCION GEOFISICA:SONDEOS ELECTRICO VERTICALES	6 días	ma 23/2/16	do 28/2/16	0 días
##	03	ARQUITECTURA	71 días	ma 23/2/16	ma 3/5/16	0 días
##	03.01	EDIFICACION	71 días	ma 23/2/16	ma 3/5/16	0 días
##	03.01.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA	4 días	ma 23/2/16	sá 27/2/16	0 días
##	03.01.01.01	MURO DE LADRILLO SOGA KK 18 HUECOS C:A 1:5; JUNTA 1.5 CM.	4 días	ma 23/2/16	sá 27/2/16	0 días
##	03.01.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTO	24 días	ma 23/2/16	ju 17/3/16	0 días
##	03.01.02.01	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MEZCLA C:A 1:5	3 días	ma 23/2/16	ju 25/2/16	0 días
##	03.01.02.02	TARRAJEO MUROS INT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	9 días	vi 26/2/16	sá 5/3/16	0 días
##	03.01.02.03	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	9 días	do 6/3/16	lu 14/3/16	0 días
##	03.01.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	3 días	ma 15/3/16	ju 17/3/16	0 días
##	03.01.02.05	ENCHAPES CON PORCELANATO 0.60X0.60M EN OVALIN	1 día	sá 5/3/16	sá 5/3/16	38 días
##	03.01.02.06	ENCHAPES CON PORCELANATO 0.60X0.60M EN COCINA	1 día	do 6/3/16	do 6/3/16	38 días
##	03.01.02.07	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	8 días	sá 27/2/16	sá 5/3/16	59 días
##	03.01.02.08	TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES MEZ. C:A 1:5, E=1.0 CM	7 días	ma 8/3/16	lu 14/3/16	50 días
##	03.01.03	CIELORRASOS	9 días	vi 15/4/16	sá 23/4/16	8 días
##	03.01.03.01	CIELORRASO DE PLANCHA SUPERBOARD INTERIOR Y EXTERIOR (INC. INSTALACION)	9 días	vi 15/4/16	sá 23/4/16	8 días
##	03.01.04	PISOS Y PAVIMENTOS	7 días	ma 5/4/16	lu 11/4/16	0 días
##	03.01.04.01	CONTRAPISOS	1 día	ma 5/4/16	ma 5/4/16	8 días

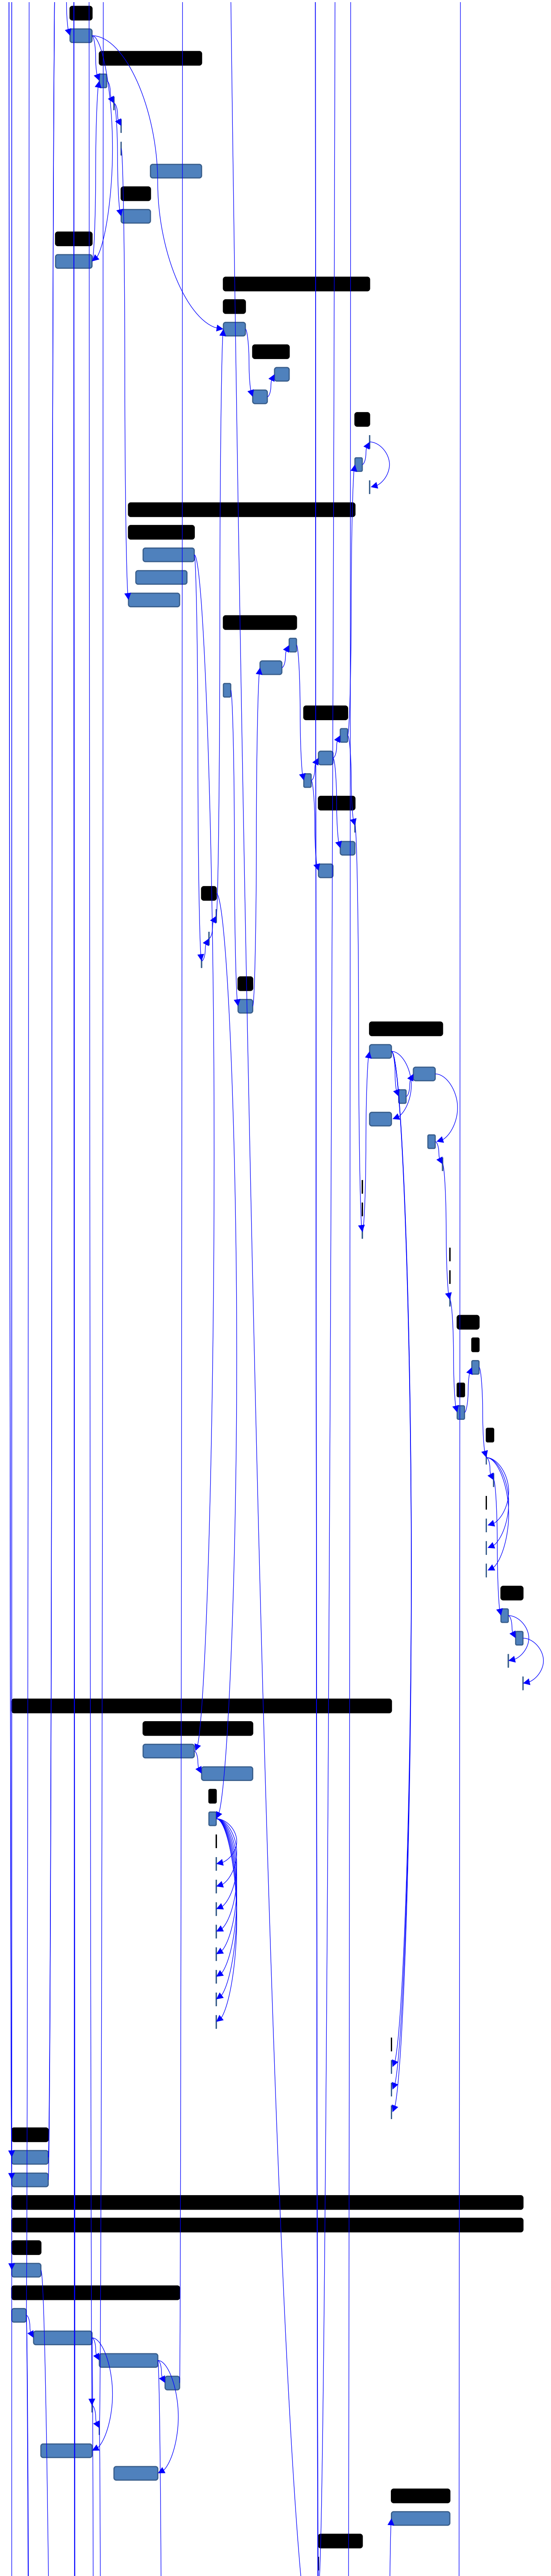


##	03.01.04.01.01	CONTRAPISO E=4 CM BASE 3 CM. MEZC. C:H 1:5 ACAB. 1 CM. PASTA C:A 1:2 (ACABADO SEMIPULIDO)	1 día	ma 5/4/16	ma 5/4/16	8 días
##	03.01.04.02	PISOS	7 días	ma 5/4/16	lu 11/4/16	0 días
##	03.01.04.02.01	PISO CERAMICO 30x30cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO E=7.2mm	3 días	mi 6/4/16	vi 8/4/16	8 días
##	03.01.04.02.02	PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO COLOR ROJO INDIO	1 día	ma 5/4/16	ma 5/4/16	4 días
##	03.01.04.02.03	PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA DE 3/4", INC DURMIENTES	7 días	ma 5/4/16	lu 11/4/16	0 días
##	03.01.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	12 días	mi 6/4/16	do 17/4/16	4 días
##	03.01.05.01	ZOCALOS	9 días	sá 9/4/16	do 17/4/16	8 días
##	03.01.05.01.01	ZOCALO DE CERAMICO 30 X 30 cm	9 días	sá 9/4/16	do 17/4/16	8 días
##	03.01.05.02	CONTRAZOCALOS	12 días	mi 6/4/16	do 17/4/16	4 días
##	03.01.05.02.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO h=0.10m	1 día	mi 6/4/16	mi 6/4/16	4 días
##	03.01.05.02.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMIPULIDO EN EXTERIORES H=0.60m y H=0.75m	3 días	ju 7/4/16	sá 9/4/16	4 días
##	03.01.05.02.03	CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.10M	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	12 días
##	03.01.05.02.04	CONTRAZOCALO LISTON DE MADERA H=0.10m	1 día	ma 12/4/16	ma 12/4/16	0 días
##	03.01.06	CARPINTERIA DE MADERA	14 días	lu 18/4/16	do 1/5/16	2 días
##	03.01.06.01	PUERTAS	6 días	lu 25/4/16	sá 30/4/16	0 días
##	03.01.06.01.01	PUERTA DE MADERA TORNILLO MACIZA C/MARCO DE MADERA 2"x6" C/TOPE DE ACERO DE MEDIA LUNA	4 días	lu 25/4/16	ju 28/4/16	0 días
##	03.01.06.01.02	PUERTA CONTRAPLACADA DE 45 mm TRIPLAY LUPUNA DE 6 mm, CON MARCO DE MADERA TORNILLO 2"x6" INI 2	2 días	vi 29/4/16	sá 30/4/16	2 días
##	03.01.06.02	VENTANAS	3 días	vi 29/4/16	do 1/5/16	0 días
##	03.01.06.02.01	VENTANA DE MADERA CON MARCO DE MADERA TORNILLO CON BARROTES DE SEGURIDAD DE FIERRO LISO Ø1,3	3 días	vi 29/4/16	do 1/5/16	0 días
##	03.01.06.03	MUEBLES DE COCINA Y SIMILARES	4 días	lu 18/4/16	ju 21/4/16	12 días
##	03.01.06.03.01	MUEBLE BAJO DE MADERA P/COCINA H=0.65m	4 días	lu 18/4/16	ju 21/4/16	12 días
##	03.01.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	4 días	ma 15/3/16	vi 18/3/16	46 días
##	03.01.07.01	PUERTAS DE FIERRO	4 días	ma 15/3/16	vi 18/3/16	46 días
##	03.01.07.01.01	PUERTA METALICA PR-01 (2.80x2.55m) INCL. INSTALACION	1 día	ma 15/3/16	ma 15/3/16	46 días
##	03.01.07.01.02	PUERTA METALICA PR-02 (2.00x2.55m) INCL. INSTALACION	1 día	mi 16/3/16	mi 16/3/16	46 días
##	03.01.07.01.03	PUERTA METALICA P10 (0.80x2.55m) INCL. INSTALACION	1 día	ju 17/3/16	ju 17/3/16	46 días
##	03.01.07.01.04	PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO M3 (1.25 x 2.55m) INCL. INSTALACION	1 día	vi 18/3/16	vi 18/3/16	46 días
##	03.01.08	CERRAJERIA	48 días	ju 17/3/16	ma 3/5/16	0 días
##	03.01.08.01	BISAGRAS	41 días	ju 17/3/16	ma 26/4/16	7 días
##	03.01.08.01.01	BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 4" PARA PUERTAS DE MADERA	2 días	lu 25/4/16	ma 26/4/16	7 días
##	03.01.08.01.02	BISAGRAS METALICAS DE 3 1/2" x 3 1/2"	1 día	ju 17/3/16	ju 17/3/16	47 días
##	03.01.08.02	CERRADURAS	7 días	mi 27/4/16	ma 3/5/16	0 días
##	03.01.08.02.01	CERRADURA 3 GOLPES DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA EXTERIOR	2 días	mi 27/4/16	ju 28/4/16	5 días
##	03.01.08.02.02	CERRADURA DE POMO DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA INTERIOR	2 días	vi 29/4/16	sá 30/4/16	3 días
##	03.01.08.02.03	CERROJO TIPO SAPITO DE ACERO INOXIDABLE C/CADENA L=1.20m. (VENTANAS)	3 días	vi 29/4/16	do 1/5/16	2 días
##	03.01.08.02.04	PICAPORTE ALUMINIZADA DE 1"x3"	2 días	lu 2/5/16	ma 3/5/16	0 días
##	03.01.08.03	ACCESORIOS DE CIERRE	2 días	lu 2/5/16	ma 3/5/16	0 días
##	03.01.08.03.01	CANDADO (PUERTA DOBLE HOJA)	2 días	lu 2/5/16	ma 3/5/16	0 días
##	03.01.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES	16 días	lu 18/4/16	ma 3/5/16	0 días
##	03.01.09.01	ESPEJO BISELADO 1.15x0.75M	1 día	lu 18/4/16	lu 18/4/16	15 días
##	03.01.09.02	ESPEJO BISELADO 0.60x0.75M	1 día	lu 18/4/16	lu 18/4/16	15 días
##	03.01.09.03	VIDRIO CRUDO DE 8mm. INC. LAMINA DE SEGURIDAD P/VENTANA	2 días	lu 2/5/16	ma 3/5/16	0 días
##	03.01.10	PINTURA	45 días	ju 17/3/16	sá 30/4/16	3 días
##	03.01.10.01	PINTURA MUROS INTERIORES LATEX MATE - 2 MANOS COLOR BLANCO HUMO	6 días	mi 13/4/16	lu 18/4/16	0 días
##	03.01.10.02	PINTURA MUROS EXTERIORES OLEO MATE - 2 MANOS COLOR AMARILLO MARACUYA	6 días	vi 15/4/16	mi 20/4/16	0 días
##	03.01.10.03	PINTURA AL LATEX MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR AMARILLO MARACUYÁ	2 días	mi 13/4/16	ju 14/4/16	0 días
##	03.01.10.04	PINTURA AL OLEO MATE - 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO	4 días	vi 15/4/16	lu 18/4/16	0 días
##	03.01.10.05	PINTURA ESMALTE SINTETICO ROJO TEJA - 2 MANOS EN CONTRAZOCALO EN EXTERIORES	4 días	ma 19/4/16	vi 22/4/16	0 días
##	03.01.10.06	PINTURA ESMALTE SINTETICO ROJO INDIO - 2 MANOS EN CONTRAZOCALO EN INTERIORES	2 días	sá 23/4/16	do 24/4/16	0 días
##	03.01.10.07	PINTURA BARNIZ MARINO EN CARPINTERIA DE MADERA	2 días	vi 29/4/16	sá 30/4/16	3 días
##	03.01.10.08	PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS	1 día	ju 17/3/16	ju 17/3/16	47 días
##	03.01.11	OTROS	7 días	sá 23/4/16	vi 29/4/16	4 días
##	03.01.11.01	PLACA DE OBRA	1 día	lu 25/4/16	lu 25/4/16	4 días
##	03.01.11.01.01	PLACA DE OBRA	1 día	lu 25/4/16	lu 25/4/16	4 días
##	03.01.11.02	SEÑALIZACION	4 días	ma 26/4/16	vi 29/4/16	4 días
##	03.01.11.02.01	SEÑALÉTICA DE NOMBRES DE AMBIENTES 0.10Mx0.30M (ADHESIVO+DOBLE ACRILICO CRISTAL 3mm)	1 día	ma 26/4/16	ma 26/4/16	7 días
##	03.01.11.02.02	SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD 0.20Mx0.30M (ADHESIVO+DOBLE ACRILICO CRISTAL 3mm)	1 día	ma 26/4/16	ma 26/4/16	4 días
##	03.01.11.02.03	SEÑALÉTICA DE AVISOS (ADHESIVOS+DOBLE ACRILICO 3MM)	1 día	mi 27/4/16	mi 27/4/16	4 días
##	03.01.11.02.04	PANEL DE SECTORES 0.90X1.10M. EN MADERA TIPO MDF 18MM (CON ETIQUETAS TIPO GALLETAS 0.10x0.40M EN	1 día	ju 28/4/16	ju 28/4/16	4 días
##	03.01.11.02.05	LETRERO DE TAMBOS 1.30X0.70M EN TRIPLAY 19MM (CON LETRAS EN ACRILICO 5MM SEGUN MODELO)	1 día	vi 29/4/16	vi 29/4/16	4 días
##	03.01.11.03	MURAL	1 día	sá 23/4/16	sá 23/4/16	10 días
##	03.01.11.03.01	MURAL CON PINTURA LATEX SATINADO 2.85X8.35M (SEGUN MODELO)	1 día	sá 23/4/16	sá 23/4/16	10 días
##	04	INSTALACIONES SANITARIAS	60 días	vi 26/2/16	ma 26/4/16	8 días
##	04.01	EDIFICACION	60 días	vi 26/2/16	ma 26/4/16	8 días
##	04.01.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	9 días	do 17/4/16	ma 26/4/16	8 días
##	04.01.01.01	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.01.01	INODORO ONE PICE LIBERTY	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.01.02	LAVATORIO PEDESTAL NACIONAL BLANCO	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.01.03	LAVATORIO NACIONAL OVALIN COLOR	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.01.04	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POZA CON ESCURRIDERA	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.01.05	URINARIO TIPO ACADEMY BLANCO	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.02.01	JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO PARA EMPOTRAR	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.02.02	GANCHO DOBLE LOSA BLANCA	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.02.03	PAPELERA DE LOSA BLANCA, PARA EMPOTRAR	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.02.04	GRIFERIA PARA DUCHA CROMADA, INCL. ACCESORIOS	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.02.05	GRIFERIA PARA DUCHA CROMADA TIPO TELEFONO, INCL. ACCESORIOS	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.02.06	GRIFERIA CROMADA MONOMANDO P/LAVATORIO	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.02.07	GRIFERIA CROMADA TIPO CUELLO DE GANSO PARA LAVADERO COCINA	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.02.08	GRIFERIA CROMADA TIPO CUELLO DE GANSO PARA LAVADERO COCINA	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.02.09	GRIFERIA SIMPLE P/URINARIO	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.02.10	AGARRADERA DE TUBO DE FIERRO D=2" CROMADO	1 día	do 17/4/16	do 17/4/16	16 días
##	04.01.01.03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	3 días	ju 21/4/16	sá 23/4/16	8 días
##	04.01.01.03.01	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	3 días	ju 21/4/16	sá 23/4/16	8 días
##	04.01.01.04	INSTALACION DE ACCESORIOS	2 días	do 24/4/16	ma 26/4/16	8 días
##	04.01.01.04.01	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	2 días	do 24/4/16	ma 26/4/16	8 días
##	04.01.02	SISTEMA DE AGUA FRIA	12 días	vi 26/2/16	mi 9/3/16	35,25 días
##	04.01.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA	6 días	vi 26/2/16	mi 2/3/16	60 días
##	04.01.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1/2"	6 días	vi 26/2/16	mi 2/3/16	60 días
##	04.01.02.02	REDES DE DISTRIBUCION	2 días	ju 3/3/16	sá 5/3/16	29,25 días
##	04.01.02.02.01	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1.1/2"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.02.02.02	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.02.02.03	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø3/4"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	29,25 días
##	04.01.02.02.04	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1/2"	1 día	vi 4/3/16	sá 5/3/16	29,25 días
##	04.01.02.03	REDES DE ALIMENTACION	1,12 días	sá 5/3/16	do 6/3/16	29,37 días
##	04.01.02.03.01	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1" DE CAJA DE REGISTRO AL TAMBO	1,12 días	sá 5/3/16	do 6/3/16	29,37 días
##	04.01.02.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA	3 días	mi 2/3/16	sá 5/3/16	60 días
##	04.01.02.04.01	CODO PVC SAP 90° x Ø1.1/2"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.02.04.02	CODO PVC SAP 90° x Ø1	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.02.04.03	CODO PVC SAP 90° x Ø3/4	2 días	mi 2/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.02.04.04	CODO PVC SAP 90° x Ø1/2"	3 días	mi 2/3/16	sá 5/3/16	60 días
##	04.01.02.04.05	TEE PVC SAP Ø1.1/2"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.02.04.06	TEE PVC SAP Ø1"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.02.04.07	TEE PVC SAP xØ3/4"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.02.04.08	TEE PVC SAP x Ø1/2	1 día	vi 4/3/16	sá 5/3/16	60 días
##	04.01.02.04.09	REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.02.04.10	REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.02.04.11	REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.02.04.12	UNION UNIVERSAL PVC SAP 1 1/2"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.02.04.13	UNIONES UNIVERSALES 1"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.02.04.14	UNIONES UNIVERSALES 3/4"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.02.04.15	UNIONES UNIVERSALES 1/2"	1 día	vi 4/3/16	sá 5/3/16	60 días
##	04.01.02.05	VALVULAS	2 días	ju 3/3/16	sá 5/3/16	60 días
##	04.01.02.05.01	VALVULA DE PASO 1.1/2"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días

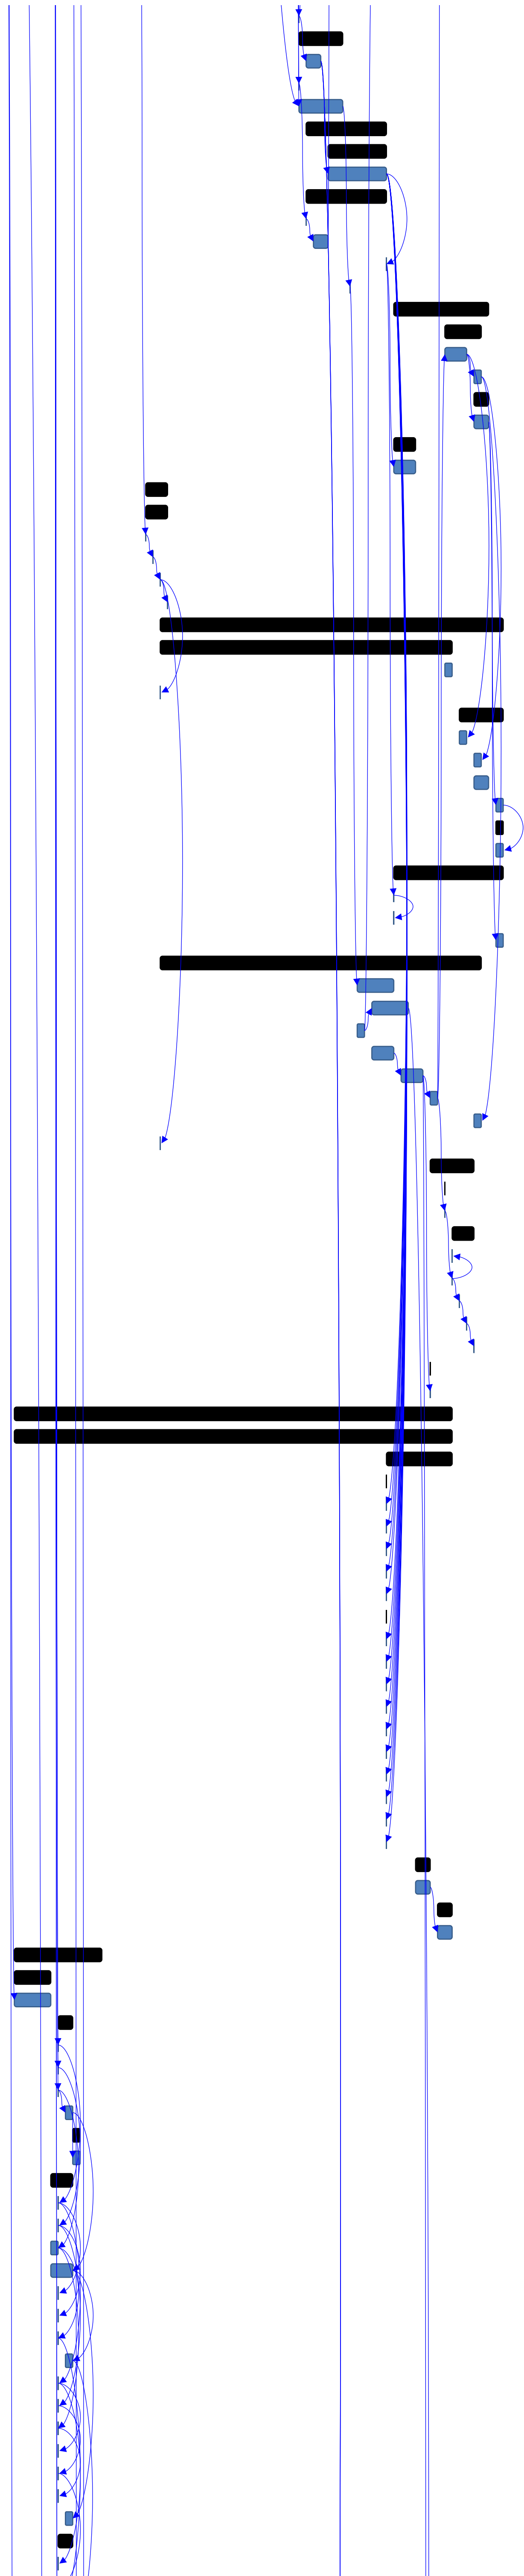

##	04.01.02.05.02	VALVULA DE PASO 1"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.02.05.03	VALVULA DE PASO 3/4	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.02.05.04	VALVULA DE PASO 1/2"	1 día	vi 4/3/16	sá 5/3/16	60 días
##	04.01.02.05.05	GRIFO DE RIEGO 1/2"	1 día	vi 4/3/16	sá 5/3/16	60 días
##	<b>04.01.02.06</b>	<b>TRABAJOS PARA REDES DE AGUA FRIA</b>	<b>5 días</b>	<b>vi 4/3/16</b>	<b>mi 9/3/16</b>	<b>30,38 días</b>
##	04.01.02.06.01	EXCAVACION DE ZANJAS H=0.60M, A=0.40M	4 días	sá 5/3/16	mi 9/3/16	29,37 días
##	04.01.02.06.02	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	ma 8/3/16	mi 9/3/16	56 días
##	04.01.02.06.03	CAMA DE APOYO E=0.10M CON MATERIAL SELECCIONADO ZARANDEADO	2 días	lu 7/3/16	mi 9/3/16	56 días
##	04.01.02.06.04	PRIMER RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO Y ZARANDEADO E=0.50M	5 días	vi 4/3/16	mi 9/3/16	56 días
##	<b>04.01.02.07</b>	<b>CAJAS DE REGISTRO-CUERPO</b>	<b>1 día</b>	<b>lu 29/2/16</b>	<b>lu 29/2/16</b>	<b>63 días</b>
##	04.01.02.07.01	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/CAJAS DE REGISTRO	1 día	lu 29/2/16	lu 29/2/16	63 días
##	04.01.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día	lu 29/2/16	lu 29/2/16	63 días
##	<b>04.01.02.08</b>	<b>VEREDAS EN CONTORNO DE CAJA DE REGISTRO</b>	<b>1 día</b>	<b>ma 1/3/16</b>	<b>ma 1/3/16</b>	<b>63 días</b>
##	04.01.02.08.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VEREDAS	1 día	ma 1/3/16	ma 1/3/16	63 días
##	04.01.02.08.02	CONCRETO f'c=175kg/cm2 P/VEREDAS	1 día	ma 1/3/16	ma 1/3/16	63 días
##	04.01.02.08.03	TAPA DE REGISTRO GALVANIZADO	1 día	ma 1/3/16	ma 1/3/16	63 días
##	<b>04.01.03</b>	<b>SISTEMA DE AGUA CALIENTE</b>	<b>7 días</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>ju 3/3/16</b>	<b>61 días</b>
##	<b>04.01.03.01</b>	<b>SALIDAS DE AGUA CALIENTE</b>	<b>1 día</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>vi 26/2/16</b>	<b>67 días</b>
##	04.01.03.01.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE PARA TUBERIA C-PVC C-10 1/2"	1 día	vi 26/2/16	vi 26/2/16	67 días
##	<b>04.01.03.02</b>	<b>REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE</b>	<b>1 día</b>	<b>ju 3/3/16</b>	<b>ju 3/3/16</b>	<b>61 días</b>
##	04.01.03.02.01	TUBERIA CPVC C-10 Ø3/4"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.03.02.02	TUBERIA CPVC C-10 Ø1/2"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	<b>04.01.03.03</b>	<b>ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE</b>	<b>2 días</b>	<b>mi 2/3/16</b>	<b>ju 3/3/16</b>	<b>61 días</b>
##	04.01.03.03.01	CODO CPVC SAP 90° x Ø3/4"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.03.03.02	CODO CPVC SAP 90° x Ø1/2"	2 días	mi 2/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.03.03.03	TEE CPVC SAP 90° x Ø3/4"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.03.03.04	TEE CPVC SAP 90° x Ø1/2"	1 día	mi 2/3/16	mi 2/3/16	61 días
##	04.01.03.03.05	REDUCCION CPVC SAP 3/4" A 1/2"	1 día	mi 2/3/16	mi 2/3/16	61 días
##	04.01.03.03.06	REDUCCION CPVC SAP 4" A 2"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.03.03.07	TRAMPA P PVC SAP Ø2	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.03.03.08	UNIONES UNIVERSALES CPVC 3/4	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.03.03.09	UNIONES UNIVERSALES CPVC 1/2"	1 día	mi 2/3/16	mi 2/3/16	62 días
##	<b>04.01.03.04</b>	<b>VALVULAS</b>	<b>2 días</b>	<b>mi 2/3/16</b>	<b>ju 3/3/16</b>	<b>61 días</b>
##	04.01.03.04.01	VALVULA DE PASO Ø 3/4"	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.03.04.02	VALVULA DE PASO Ø 1/2"	1 día	mi 2/3/16	mi 2/3/16	62 días
##	04.01.03.04.03	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4"	1 día	mi 2/3/16	mi 2/3/16	62 días
##	04.01.03.04.04	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2"	1 día	mi 2/3/16	mi 2/3/16	62 días
##	04.01.03.04.05	VALVULA ESFERICA DE 3/4"	1 día	mi 2/3/16	mi 2/3/16	62 días
##	04.01.03.04.06	VALVULA ESFERICA DE 1/2"	1 día	mi 2/3/16	mi 2/3/16	62 días
##	<b>04.01.03.05</b>	<b>TRABAJOS PARA REDES DE AGUA CALIENTE</b>	<b>1 día</b>	<b>ju 3/3/16</b>	<b>ju 3/3/16</b>	<b>61 días</b>
##	04.01.03.05.01	EXCAVACION DE ZANJAS H=0.60M, A=0.40M	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.03.05.02	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.03.05.03	CAMA DE APOYO E=0.10M CON MATERIAL SELECCIONADO ZARANDEADO	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	04.01.03.05.04	PRIMER RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO Y ZARANDEADO E=0.50M	1 día	ju 3/3/16	ju 3/3/16	61 días
##	<b>04.01.04</b>	<b>DESAGUE Y VENTILACION</b>	<b>41 días</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>mi 20/4/16</b>	<b>13 días</b>
##	<b>04.01.04.01</b>	<b>SALIDAS DE DESAGUE</b>	<b>3,13 días</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>29,37 días</b>
##	04.01.04.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4"	1 día	vi 11/3/16	sá 12/3/16	29,37 días
##	04.01.04.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2"	1,13 días	sá 12/3/16	do 13/3/16	49,87 días
##	04.01.04.01.03	SALIDA DE VENTILACION DE PVC SAL 2"	1 día	do 13/3/16	lu 14/3/16	49,87 días
##	<b>04.01.04.02</b>	<b>REDES DE DERIVACION</b>	<b>1 día</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>50 días</b>
##	04.01.04.02.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC UF 110MM S-20	1 día	lu 14/3/16	ma 15/3/16	50 días
##	04.01.04.02.02	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL Ø4"	1 día	lu 14/3/16	ma 15/3/16	50 días
##	<b>04.01.04.03</b>	<b>REDES COLECTORAS INTERIORES</b>	<b>3,13 días</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>29,37 días</b>
##	04.01.04.03.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL Ø4	1 día	vi 11/3/16	sá 12/3/16	29,37 días
##	04.01.04.03.02	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL Ø2"	1,13 días	sá 12/3/16	do 13/3/16	51,87 días
##	04.01.04.03.03	TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL Ø2"	1 día	do 13/3/16	lu 14/3/16	49,87 días
##	<b>04.01.04.04</b>	<b>ACCESORIOS DE REDES DESAGUE</b>	<b>4,13 días</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>49,87 días</b>
##	04.01.04.04.01	YEE PVC SAL Ø4"x2"	1 día	vi 11/3/16	sá 12/3/16	53 días
##	04.01.04.04.02	YEE PVC SAL Ø2"	1,13 días	sá 12/3/16	do 13/3/16	51,87 días
##	04.01.04.04.03	DOBLE YEE PVC SAL Ø4"x2"	1 día	vi 11/3/16	sá 12/3/16	53 días
##	04.01.04.04.04	DOBLE YEE PVC SAL Ø2"	1,13 días	sá 12/3/16	do 13/3/16	51,87 días
##	04.01.04.04.05	CODO PVC SAL 90° x Ø2"	2,12 días	vi 11/3/16	do 13/3/16	51,87 días
##	04.01.04.04.06	CODO PVC SAL 45° x Ø2"	1,13 días	sá 12/3/16	do 13/3/16	51,87 días
##	04.01.04.04.07	CODO CON VENTILACION PVC SAL 90° x Ø2"	1 día	do 13/3/16	lu 14/3/16	49,87 días
##	04.01.04.04.08	TEE SANITARIA PVC SAL Ø4	1 día	vi 11/3/16	sá 12/3/16	53 días
##	04.01.04.04.09	TEE SANITARIA PVC SAL Ø2	1,12 días	sá 12/3/16	do 13/3/16	51,87 días
##	04.01.04.04.10	TRAMPA P PVC SAL Ø2	1 día	lu 14/3/16	ma 15/3/16	49,87 días
##	<b>04.01.04.05</b>	<b>INSTALACIONES ESPECIALES</b>	<b>13 días</b>	<b>vi 8/4/16</b>	<b>mi 20/4/16</b>	<b>13 días</b>
##	04.01.04.05.01	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE 2"	1 día	vi 8/4/16	vi 8/4/16	25 días
##	04.01.04.05.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"	1 día	vi 8/4/16	vi 8/4/16	25 días
##	04.01.04.05.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	1 día	vi 8/4/16	vi 8/4/16	25 días
##	04.01.04.05.04	REJILLA DE BRONCE PARA DUCHA DE 2"	1 día	vi 8/4/16	vi 8/4/16	25 días
##	04.01.04.05.05	REJILLA DE BRONCE PARA VENTILACION DE 2"	1 día	mi 20/4/16	mi 20/4/16	13 días
##	<b>04.01.04.06</b>	<b>TRABAJOS PARA REDES DE DESAGUE</b>	<b>3 días</b>	<b>vi 11/3/16</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>29,37 días</b>
##	04.01.04.06.01	EXCAVACION DE ZANJAS H=0.60M, A=0.40M	3 días	vi 11/3/16	lu 14/3/16	29,37 días
##	04.01.04.06.02	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	do 13/3/16	lu 14/3/16	47,87 días
##	04.01.04.06.03	CAMA DE APOYO E=0.10M CON MATERIAL SELECCIONADO ZARANDEADO	2 días	sá 12/3/16	lu 14/3/16	47,87 días
##	04.01.04.06.04	PRIMER RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO Y ZARANDEADO E=0.50M	3 días	vi 11/3/16	lu 14/3/16	47,87 días
##	<b>04.01.04.07</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO</b>	<b>3,13 días</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>ju 17/3/16</b>	<b>47,87 días</b>
##	<b>04.01.04.07.01</b>	<b>CAJAS DE INSPECCION DE DESAGUE-CUERPO</b>	<b>2 días</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>mi 16/3/16</b>	<b>47,87 días</b>
##	04.01.04.07.01.01	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/CAJAS DE REGISTRO	1 día	ma 15/3/16	mi 16/3/16	49 días
##	04.01.04.07.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	2 días	lu 14/3/16	mi 16/3/16	47,87 días
##	<b>04.01.04.07.02</b>	<b>CAJAS DE INSPECCION-TAPAS</b>	<b>1,13 días</b>	<b>mi 16/3/16</b>	<b>ju 17/3/16</b>	<b>47,87 días</b>
##	04.01.04.07.02.01	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/CAJAS DE REGISTRO	1,13 días	mi 16/3/16	ju 17/3/16	47,87 días
##	04.01.04.07.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1,13 días	mi 16/3/16	ju 17/3/16	47,87 días
##	04.01.04.07.02.03	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	1,13 días	mi 16/3/16	ju 17/3/16	47,87 días
##	<b>04.02</b>	<b>SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE MEDIANTE BIODIGESTOR</b>	<b>11,38 días</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>lu 4/4/16</b>	<b>29,37 días</b>
##	<b>04.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>6 días</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>29,37 días</b>
##	<b>04.02.01.01</b>	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>5 días</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>ma 29/3/16</b>	<b>29,37 días</b>
##	04.02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	5 días	ju 24/3/16	ma 29/3/16	29,37 días
##	<b>04.02.01.02</b>	<b>RELLENOS</b>	<b>6 días</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>29,37 días</b>
##	04.02.01.02.01	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	ju 24/3/16	vi 25/3/16	29,37 días
##	04.02.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO MENOR	4 días	sá 26/3/16	mi 30/3/16	33 días
##	04.02.01.02.03	RELLENO CON GRAVA SELECCIONADA DE 2" A 5"	2 días	lu 28/3/16	mi 30/3/16	33 días
##	<b>04.02.01.03</b>	<b>ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE</b>	<b>1 día</b>	<b>ma 29/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>35 días</b>
##	04.02.01.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	ma 29/3/16	mi 30/3/16	35 días
##	<b>04.02.02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	<b>2,13 días</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>do 27/3/16</b>	<b>29,37 días</b>
##	<b>04.02.02.01</b>	<b>SOLIDOS</b>	<b>1 día</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>sá 26/3/16</b>	<b>29,37 días</b>
##	04.02.02.01.01	SOLADO C/MEZCLA 1:10 C:H E=2"	1 día	vi 25/3/16	sá 26/3/16	29,37 días
##	<b>04.02.02.02</b>	<b>LOSA DE CONCRETO EN BASE Y TAPA DE BIODIGESTOR</b>	<b>1,13 días</b>	<b>sá 26/3/16</b>	<b>do 27/3/16</b>	<b>29,5 días</b>
##	04.02.02.02.01	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/LOSAS	1,13 días	sá 26/3/16	do 27/3/16	29,5 días
##	<b>04.02.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>	<b>8,25 días</b>	<b>do 27/3/16</b>	<b>lu 4/4/16</b>	<b>29,5 días</b>
##	<b>04.02.03.01</b>	<b>POZO DE LODOS C/TAPA CONCRETO</b>	<b>2 días</b>	<b>do 27/3/16</b>	<b>ma 29/3/16</b>	<b>29,5 días</b>
##	04.02.03.01.01	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/POZO	1 día	lu 28/3/16	ma 29/3/16	31,87 días
##	04.02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	2 días	do 27/3/16	ma 29/3/16	29,5 días
##	04.02.03.01.03	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	lu 28/3/16	ma 29/3/16	29,5 días
##	<b>04.02.03.02</b>	<b>CAJA DE DISTRIBUCION C/TAPA CONCRETO</b>	<b>1 día</b>	<b>ma 29/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>29,5 días</b>
##	04.02.03.02.01	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/POZO	1 día	ma 29/3/16	mi 30/3/16	30,75 días
##	04.02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día	ma 29/3/16	mi 30/3/16	29,5 días
##	04.02.03.02.03	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	ma 29/3/16	mi 30/3/16	29,5 días
##	<b>04.02.03.03</b>	<b>CAJA DE VALVULAS C/TAPA DE CONCRETO</b>	<b>1,13 días</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>ju 31/3/16</b>	<b>29,5 días</b>
##	04.02.03.03.01	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/CAJA	1,12 días	mi 30/3/16	ju 31/3/16	33,75 días
##	04.02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1,13 días	mi 30/3/16	ju 31/3/16	29,5 días
##	04.02.03.03.03	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	1,12 días	mi 30/3/16	ju 31/3/16	29,5 días

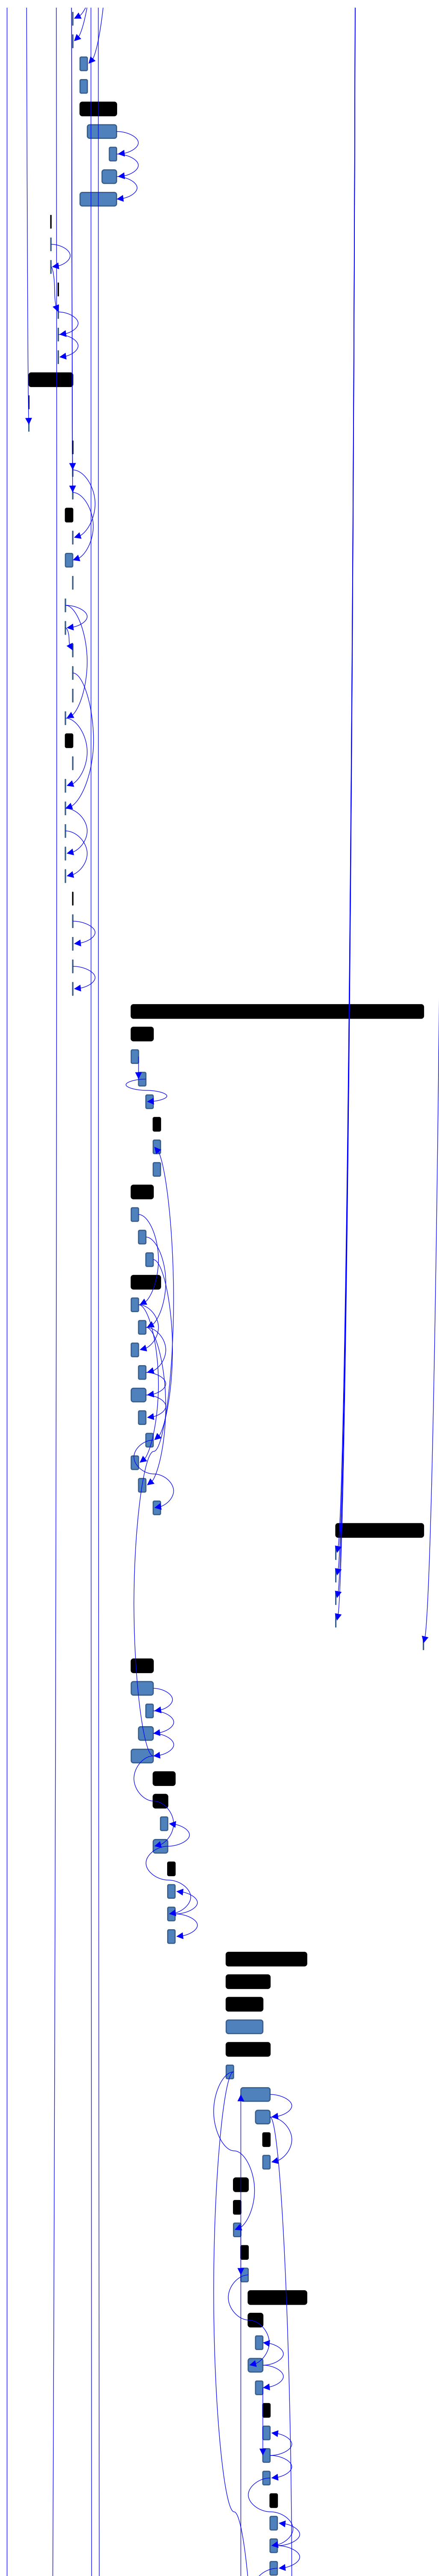


##	04.02.03.04	BIOFILTRO	3,13 días	ju 31/3/16	do 3/4/16	29,5 días
##	04.02.03.04.01	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/BIOFILTRO	1,13 días	sá 2/4/16	do 3/4/16	29,62 días
##	04.02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	2 días	ju 31/3/16	sá 2/4/16	29,5 días
##	04.02.03.04.03	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	vi 1/4/16	sá 2/4/16	31,75 días
##	04.02.03.05	TAPA DE BIODIGESTOR	1 día	do 3/4/16	lu 4/4/16	29,62 días
##	04.02.03.05.01	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/TAPAS	1 día	do 3/4/16	lu 4/4/16	29,62 días
##	04.02.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día	do 3/4/16	lu 4/4/16	29,62 días
##	04.02.03.05.03	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	do 3/4/16	lu 4/4/16	29,62 días
##	04.02.04	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	3,25 días	vi 1/4/16	lu 4/4/16	29,62 días
##	04.02.04.01	POZO DE LODOS C/TAPAS DE CONCRETO	1 día	vi 1/4/16	sá 2/4/16	31,87 días
##	04.02.04.01.01	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN SUPERFICIES INTERIORES	1 día	vi 1/4/16	sá 2/4/16	31,87 días
##	04.02.04.02	CAJA DE DISTRIBUCION C/TAPA CONCRETO	1,13 días	sá 2/4/16	do 3/4/16	30,75 días
##	04.02.04.02.01	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN SUPERFICIES INTERIORES C:A 1:5 E=1.0CM	1,13 días	sá 2/4/16	do 3/4/16	30,75 días
##	04.02.04.03	BIOFILTRO	1 día	do 3/4/16	lu 4/4/16	29,62 días
##	04.02.04.03.01	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN SUPERFICIES INTERIORES C:A 1:5 E=1.0CM	1 día	do 3/4/16	lu 4/4/16	29,62 días
##	04.02.05	BIODIGESTOR	1 día	vi 25/3/16	sá 26/3/16	33 días
##	04.02.05.01	BIODIGESTOR DE 3000L. INC. ACCESORIOS E INSTALACION	1 día	vi 25/3/16	sá 26/3/16	33 días
##	04.02.06	BIOFILTRO	1,13 días	sá 26/3/16	do 27/3/16	37,87 días
##	04.02.06.01	BIOFILTRO INC. ACCESORIOS E INSTALACION	1,13 días	sá 26/3/16	do 27/3/16	37,87 días
##	04.02.07	TUBERIAS Y ACCESORIOS	3 días	do 27/3/16	mi 30/3/16	35 días
##	04.02.07.01	TUBERIA DE PVC SAL 4"	1 día	do 27/3/16	lu 28/3/16	36 días
##	04.02.07.02	TUBERIA DE PVC SAL 4" PERFORADA	1 día	ma 29/3/16	mi 30/3/16	33 días
##	04.02.07.03	TUBERIA DE PVC SAL 2"	1 día	do 27/3/16	lu 28/3/16	36 días
##	04.02.07.04	ACCESORIOS DE INSTALACION DE TUBERIAS	1 día	lu 28/3/16	ma 29/3/16	36 días
##	04.03	CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DESDE EXTERIOR	8 días	vi 26/2/16	vi 4/3/16	60 días
##	04.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	8 días	vi 26/2/16	vi 4/3/16	60 días
##	04.03.01.01	EXCAVACIONES	4 días	vi 26/2/16	lu 29/2/16	60 días
##	04.03.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS A=0.50M X H=1.00M (RED DE AGUA)	4 días	vi 26/2/16	lu 29/2/16	60 días
##	04.03.01.02	RELLENOS	8 días	vi 26/2/16	vi 4/3/16	60 días
##	04.03.01.02.01	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	vi 26/2/16	vi 26/2/16	60 días
##	04.03.01.02.02	CAMA DE APOYO E=0.10M CON MATERIAL SELECCIONADO ZARANDEADO	1 día	sá 27/2/16	sá 27/2/16	60 días
##	04.03.01.02.03	PRIMER RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO Y ZARANDEADO E=0.40M	2 días	do 28/2/16	lu 29/2/16	60 días
##	04.03.01.02.04	SEGUNDO RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO MENOR E=0.50M	4 días	ma 1/3/16	vi 4/3/16	60 días
##	04.03.02	SISTEMA DE REDES AGUA FRIA	1 día	do 28/2/16	do 28/2/16	65 días
##	04.03.02.01	REDES DE DISTRIBUCION	1 día	do 28/2/16	do 28/2/16	65 días
##	04.03.02.01.01	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø1"	1 día	do 28/2/16	do 28/2/16	65 días
##	04.04	PRUEBAS HIDRAULICAS DE TUBERIAS	2 días	mi 30/3/16	vi 1/4/16	33 días
##	04.04.01	PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	2 días	mi 30/3/16	vi 1/4/16	33 días
##	04.04.02	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	1 día	ju 31/3/16	vi 1/4/16	33 días
##	05	INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS	64 días	lu 22/2/16	lu 25/4/16	8 días
##	05.01	CONEXION A LA RED EXTERNA DE MEDIDOR (A FUTURO)	12,25 días	lu 22/2/16	sá 5/3/16	59,75 días
##	05.01.01	TRABAJOS PARA REDES E INSTALACIONES EXTERIORES	3,25 días	ma 23/2/16	vi 26/2/16	59,75 días
##	05.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE REDES	1,12 días	ma 23/2/16	mi 24/2/16	59,75 días
##	05.01.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1,13 días	mi 24/2/16	ju 25/2/16	59,75 días
##	05.01.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y CINTA DE SEÑALIZACION	1 día	ju 25/2/16	vi 26/2/16	59,75 días
##	05.01.01.04	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm (PORTAMEDIDOR-TABLERO GENERAL)	1 día	ju 25/2/16	vi 26/2/16	67,75 días
##	05.01.02	MURETE PARA SUMINISTRO ELECTRICO	8 días	vi 26/2/16	sá 5/3/16	59,75 días
##	05.01.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1 día	vi 26/2/16	sá 27/2/16	59,75 días
##	05.01.02.02	CONCRETO P/CIMIENTO CORRIDO 1:10 C:H + 30% P.G ØMAX. 6"	1 día	sá 27/2/16	do 28/2/16	59,75 días
##	05.01.02.03	MURO DE LADRILLO CABEZA KK 18 HUECOS C:A 1:5; JUNTA 1.5 CM	1 día	do 28/2/16	lu 29/2/16	59,75 días
##	05.01.02.04	TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:5; E=1.0 CM	1 día	lu 29/2/16	ma 1/3/16	59,75 días
##	05.01.02.05	CAJA METALICA DE MEDIDOR	1 día	lu 29/2/16	ma 1/3/16	63,75 días
##	05.01.02.06	PINTURA ESMALTE SINTETICO	1 día	vi 4/3/16	sá 5/3/16	59,75 días
##	05.01.03	ACOMETIDA ELECTRICA	1 día	lu 22/2/16	ma 23/2/16	71 días
##	05.01.03.01	ACOMETIDA DOMICILIARIA ELECTRICA	1 día	lu 22/2/16	ma 23/2/16	71 días
##	05.02	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES	57 días	vi 26/2/16	vi 22/4/16	11 días
##	05.02.01	SALIDA	47 días	lu 7/3/16	vi 22/4/16	11 días
##	05.02.01.01	SALIDAS PARA CENTRO DE LUZ	7 días	sá 16/4/16	vi 22/4/16	8 días
##	05.02.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA	6 días	lu 7/3/16	sá 12/3/16	43 días
##	05.02.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	2 días	vi 11/3/16	sá 12/3/16	52 días
##	05.02.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	2 días	vi 11/3/16	sá 12/3/16	52 días
##	05.02.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE	1 día	sá 12/3/16	sá 12/3/16	43 días
##	05.02.01.06	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION.	1 día	sá 12/3/16	sá 12/3/16	52 días
##	05.02.01.07	SALIDA PARA SENSORES DE APERTURA DE PUERTAS (OFICINAS)	1 día	do 13/3/16	do 13/3/16	43 días
##	05.02.01.08	SALIDAS PARA PANEL DE INTRUSION	1 día	lu 14/3/16	lu 14/3/16	43 días
##	05.02.01.09	SALIDA PARA SENSOR DE INTRUSION	2 días	ma 15/3/16	mi 16/3/16	43 días
##	05.02.01.10	SALIDAS PARA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO	3 días	ju 17/3/16	sá 19/3/16	43 días
##	05.02.01.11	SALIDAS PARA ALTO PARLANTE	1 día	do 20/3/16	do 20/3/16	43 días
##	05.02.01.12	SALIDAS PARA TERMA ELECTRICA	1 día	lu 21/3/16	lu 21/3/16	43 días
##	05.02.02	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS	9 días	vi 26/2/16	sá 5/3/16	59 días
##	05.02.02.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm (TABLERO GENERAL-T. DISTRIBUCION)	1 día	vi 26/2/16	sá 27/2/16	59 días
##	05.02.02.02	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm (TECHO-MALLA A TIERRA)	1 día	vi 26/2/16	vi 26/2/16	59 días
##	05.02.02.03	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20mm (ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE)	9 días	vi 26/2/16	sá 5/3/16	59 días
##	05.02.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS	6 días	lu 7/3/16	sá 12/3/16	39 días
##	05.02.03.01	CABLE ELECTRICO 2-1x2.5mm2 NH + 1x2.5mm2 LSOH(T) - ALUMBRADO	2 días	lu 7/3/16	ma 8/3/16	39 días
##	05.02.03.02	CABLE ELECTRICO 2-1x4mm2 NH+ 1x2.5mm2 LSOH (T) - TOMACORRIENTE	2 días	mi 9/3/16	ju 10/3/16	39 días
##	05.02.03.03	CABLE ELECTRICO 2-1x6mm2 NH +1x4mm2 (T) LSOH (T-G-TD)	1 día	vi 11/3/16	vi 11/3/16	39 días
##	05.02.03.04	CABLE ELECTRICO 2-1x10mm2 NH + 1x6mm2 (T) LSOH (GRUPO G. -TABLERO GENERAL)	1 día	sá 12/3/16	sá 12/3/16	39 días
##	05.02.04	TABLEROS DE DISTRIBUCION	1 día	do 6/3/16	do 6/3/16	33 días
##	05.02.04.01	TABLERO GENERAL TGD	1 día	do 6/3/16	do 6/3/16	33 días
##	05.02.04.02	TABLEROS DE DISTRIBUCION TD-1	1 día	do 6/3/16	do 6/3/16	33 días
##	05.02.04.03	TABLEROS DE DISTRIBUCION TD-2	1 día	do 6/3/16	do 6/3/16	33 días
##	05.02.04.04	TABLEROS DE DISTRIBUCION TD-3	1 día	do 6/3/16	do 6/3/16	33 días
##	05.02.04.05	TABLEROS ESTABILIZADO TD-E	1 día	do 6/3/16	do 6/3/16	33 días
##	05.02.04.06	TABLERO DE TRANSFERENCIA (CON LLAVE DE CONMUTACION)	1 día	do 6/3/16	do 6/3/16	33 días
##	05.02.04.07	TABLERO AUTOMATICO PARA CONTROL DE ELECTROBOMBA (0.6HP)	1 día	do 6/3/16	do 6/3/16	33 días
##	05.03	INSTALACION DE PARARRAYOS	10 días	ma 22/3/16	ju 31/3/16	33 días
##	05.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	2 días	ma 22/3/16	mi 23/3/16	33 días
##	05.03.01.01	EXCAVACIONES	1 día	ma 22/3/16	ma 22/3/16	33 días
##	05.03.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	1 día	ma 22/3/16	ma 22/3/16	33 días
##	05.03.01.02	RELLENOS	1 día	mi 23/3/16	mi 23/3/16	33 días
##	05.03.01.02.01	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	mi 23/3/16	mi 23/3/16	33 días
##	05.03.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO MENOR	1 día	mi 23/3/16	mi 23/3/16	41 días
##	05.03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	mi 23/3/16	mi 23/3/16	41 días
##	05.03.01.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	mi 23/3/16	mi 23/3/16	41 días
##	05.03.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	6 días	ju 24/3/16	ma 29/3/16	33 días
##	05.03.02.01	SOLIDOS	1 día	ju 24/3/16	ju 24/3/16	33 días
##	05.03.02.01.01	SOLADO C/MEZCLA 1:10 C:H E=2"	1 día	ju 24/3/16	ju 24/3/16	33 días
##	05.03.02.02	DADO DE CONCRETO 0.50X0.50X1.00M P/ ANCLAJE DE TEMPLADORES	1 día	ma 29/3/16	ma 29/3/16	35 días
##	05.03.02.02.01	CONCRETO f'c=140kg/cm2-P/DADOS	1 día	ma 29/3/16	ma 29/3/16	35 días
##	05.03.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	3 días	vi 25/3/16	do 27/3/16	33 días
##	05.03.03.01	ZAPATAS	1 día	vi 25/3/16	vi 25/3/16	33 días
##	05.03.03.01.01	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/ZAPATAS	1 día	vi 25/3/16	vi 25/3/16	33 días
##	05.03.03.01.02	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	vi 25/3/16	vi 25/3/16	33 días
##	05.03.03.02	COLUMNAS	2 días	vi 25/3/16	do 27/3/16	33 días
##	05.03.03.02.01	CONCRETO f'c=210kg/cm2 P/COLUMNAS	1 día	do 27/3/16	do 27/3/16	33 días
##	05.03.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/COLUMNAS	1 día	sá 26/3/16	sá 26/3/16	33 días
##	05.03.03.02.03	ACERO CORRUGADO Fy=4,200kg/cm2 GRADO 60	1 día	vi 25/3/16	sá 26/3/16	38 días
##	05.03.04	ESTRUCTURAS METALICAS	1 día	lu 28/3/16	lu 28/3/16	33 días
##	05.03.04.01	TORRE VENTADA DE ESTRUCTURA METALICA H=9M. INC. TEMPLADORES DE CABLE DE RETENIDA 1/4" ASTM A416	1 día	lu 28/3/16	lu 28/3/16	33 días
##	05.03.05	PINTURA	2 días	mi 30/3/16	ju 31/3/16	33 días
##	05.03.05.01	PINTURA ANTICORROSIVA EN TORRE VENTADA	1 día	mi 30/3/16	mi 30/3/16	33 días
##	05.03.05.02	PINTURA ESMALTE SINTETICO ROJO-BLANCO PARA CARPINTERIA METALICA EN TORRE VENTADA	1 día	ju 31/3/16	ju 31/3/16	33 días
##	05.03.06	PARARRAYOS	1 día	ma 29/3/16	ma 29/3/16	33 días

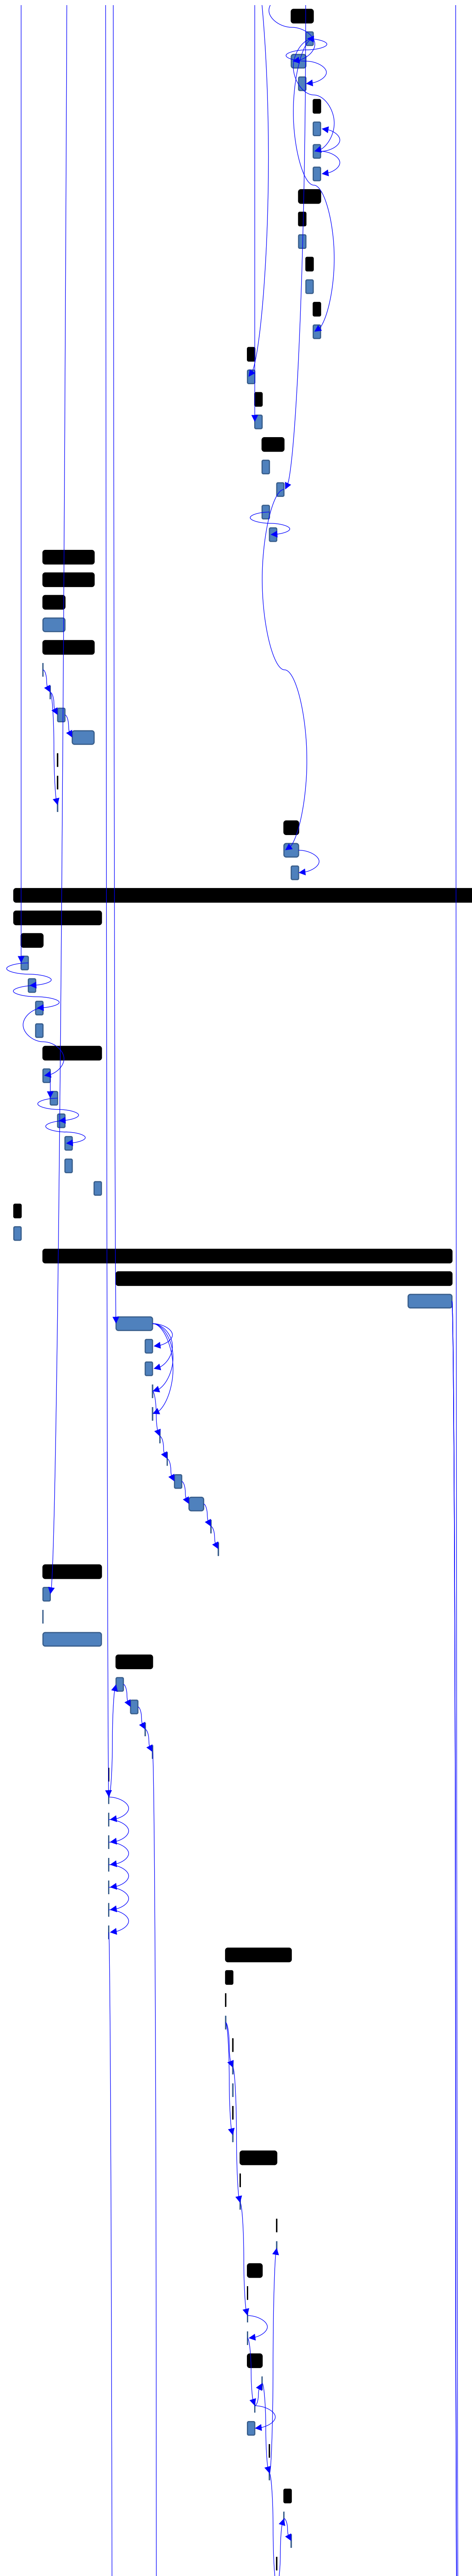



## 05.03.06.01	PARARRAYOS PDC, INCLUYE PEDESTAL	1 día	ma 29/3/16	ma 29/3/16	33 días
## 05.04	<b>INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA</b>	<b>8 días</b>	<b>sá 19/3/16</b>	<b>do 27/3/16</b>	<b>37 días</b>
## 05.04.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	5 días	ma 22/3/16	sá 26/3/16	37 días
## 05.04.02	COMPACTACION DE NIVELES DE FONDO	1 día	vi 25/3/16	sá 26/3/16	37 días
## 05.04.03	CAMA DE APOYO E=0.10M CON MATERIAL SELECCIONADO ZARANDEADO	2 días	ju 24/3/16	sá 26/3/16	37 días
## 05.04.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y CINTA DE SEÑALIZACION	3 días	ju 24/3/16	do 27/3/16	37 días
## 05.04.05	POZO DE TIERRA	6 días	lu 21/3/16	do 27/3/16	37 días
## 05.04.06	CABLE 1X70mm2 COBRE DESNUDO	2 días	vi 25/3/16	do 27/3/16	37 días
## 05.04.07	BENOTINA Y SAL	8 días	sá 19/3/16	do 27/3/16	37 días
## 05.04.08	ACCESORIOS DE TERMOFUSION	1 día	sá 26/3/16	do 27/3/16	37 días
## 05.05	<b>ARTEFACTOS</b>	<b>3 días</b>	<b>sá 23/4/16</b>	<b>lu 25/4/16</b>	<b>8 días</b>
## 05.05.01	<b>LAMPARAS</b>	<b>2 días</b>	<b>sá 23/4/16</b>	<b>do 24/4/16</b>	<b>8 días</b>
## 05.05.01.01	LAMPARA LED DOWN LIGTH 20W	2 días	sá 23/4/16	do 24/4/16	9 días
## 05.05.01.02	LAMPARA LED DOWN LIGTH 28W	1 día	sá 23/4/16	sá 23/4/16	10 días
## 05.05.01.03	PANEL 120x30CM LED LIGHT 36W	2 días	sá 23/4/16	do 24/4/16	8 días
## 05.05.01.04	LUZ DE EMERGENCIA	1 día	sá 23/4/16	sá 23/4/16	10 días
## 05.05.02	<b>REFLECTORES</b>	<b>1 día</b>	<b>lu 25/4/16</b>	<b>lu 25/4/16</b>	<b>8 días</b>
## 05.05.02.01	REFLECTOR LED FLOOD LIGTH 50W-EXTERIORES	1 día	lu 25/4/16	lu 25/4/16	8 días
## 05.06	<b>EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS</b>	<b>12 días</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>39 días</b>
## 05.06.01	<b>BOMBAS PARA AGUA</b>	<b>2 días</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>39 días</b>
## 05.06.01.01	<b>SALIDA</b>	<b>1 día</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>39 días</b>
## 05.06.01.01.01	SALIDAS DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA	1 día	do 13/3/16	do 13/3/16	39 días
## 05.06.01.02	<b>CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS</b>	<b>1 día</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>39 días</b>
## 05.06.01.02.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm	1 día	do 13/3/16	do 13/3/16	39 días
## 05.06.01.03	<b>CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS</b>	<b>1 día</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>lu 14/3/16</b>	<b>39 días</b>
## 05.06.01.03.01	CABLE ELECTRICO 2-1x4mm2 NH+ 1x2.5mm2 LSOH (T) - TOMACORRIENTE	1 día	lu 14/3/16	lu 14/3/16	39 días
## 05.06.02	<b>SISTEMAS DE SEGURIDAD</b>	<b>10 días</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>39 días</b>
## 05.06.02.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>	<b>1 día</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>39 días</b>
## 05.06.02.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE EJES	1 día	ma 15/3/16	ma 15/3/16	39 días
## 05.06.02.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>6 días</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>do 20/3/16</b>	<b>39 días</b>
## 05.06.02.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS	2 días	ma 15/3/16	mi 16/3/16	39 días
## 05.06.02.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO INC. CAMA DE ARENA Y CINTA DE SEÑALIZACION	3 días	ju 17/3/16	do 20/3/16	44 días
## 05.06.02.03	<b>SISTEMAS ELECTROMECANICOS</b>	<b>1 día</b>	<b>do 20/3/16</b>	<b>do 20/3/16</b>	<b>44 días</b>
## 05.06.02.03.01	OBRAS PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (3 CAMARAS FIJAS Y 1 DOMO PTZ180/360)	1 día	do 20/3/16	do 20/3/16	44 días
## 05.06.02.03.02	OBRAS PARA SISTEMA DE SEGURIDAD - ALARMA CONTRA ROBO	1 día	do 20/3/16	do 20/3/16	44 días
## 05.06.02.03.03	OBRAS PARA SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO	1 día	do 20/3/16	do 20/3/16	44 días
## 05.06.02.03.04	OBRAS PARA ALTOPARLANTES	1 día	do 20/3/16	do 20/3/16	44 días
## 05.06.02.04	<b>TUBERIAS</b>	<b>3 días</b>	<b>vi 18/3/16</b>	<b>do 20/3/16</b>	<b>39 días</b>
## 05.06.02.04.01	TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4" X 3M(SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA)	3 días	vi 18/3/16	do 20/3/16	39 días
## 05.06.02.04.02	TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4" X 3M(SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO)	2 días	vi 18/3/16	do 20/3/16	39 días
## 05.06.02.04.03	TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4" X 3M (ALARMA CONTRA INCENDIO)	2 días	vi 18/3/16	do 20/3/16	39 días
## 05.06.02.04.04	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm (SISTEMA DE ALTO PARLANTE)	1 día	sá 19/3/16	do 20/3/16	39 días
## 05.06.02.05	<b>SALIDAS</b>	<b>1 día</b>	<b>lu 21/3/16</b>	<b>lu 21/3/16</b>	<b>39 días</b>
## 05.06.02.05.01	SALIDAS PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1 día	lu 21/3/16	lu 21/3/16	39 días
## 05.06.02.06	<b>CABLEADO DE DATA</b>	<b>3 días</b>	<b>ma 22/3/16</b>	<b>ju 24/3/16</b>	<b>39 días</b>
## 05.06.02.06.01	CABLE UTP CAT 6 (SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA)	1 día	ma 22/3/16	ma 22/3/16	39 días
## 05.06.02.06.02	CABLE 2-1X16 AWG (SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO)	1 día	mi 23/3/16	mi 23/3/16	39 días
## 05.06.02.06.03	CABLE 2-1X16 AWG (SISTEMA CONTRA INCENDIO)	1 día	ju 24/3/16	ju 24/3/16	39 días
## 05.07	<b>POSTES DE SOPORTE DE CAMARAS DE VIGILANCIA</b>	<b>1 día</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>vi 25/3/16</b>	<b>39 días</b>
## 05.07.01	POSTES DE SOPORTE DE CAMARA DE VIGILANCIA Ø1.1/2" H=1.50M	1 día	vi 25/3/16	vi 25/3/16	39 días
## 05.08	<b>VIARIOS</b>	<b>1 día</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>34 días</b>
## 05.08.01	<b>PRUEBAS ELECTRICAS</b>	<b>1 día</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>mi 30/3/16</b>	<b>34 días</b>
## 05.08.01.01	PRUEBA DE RESISTIVIDAD DE POZO A TIERRA	1 día	mi 30/3/16	mi 30/3/16	34 días
## 05.09	<b>INSTALACIONES DE COMUNICACIONES</b>	<b>11 días</b>	<b>lu 7/3/16</b>	<b>ju 17/3/16</b>	<b>47 días</b>
## 05.09.01	<b>CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICACION</b>	<b>11 días</b>	<b>lu 7/3/16</b>	<b>ju 17/3/16</b>	<b>47 días</b>
## 05.09.01.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>	<b>1 día</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>47 días</b>
## 05.09.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE EJES	1 día	do 13/3/16	do 13/3/16	47 días
## 05.09.01.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	<b>5 días</b>	<b>do 13/3/16</b>	<b>ju 17/3/16</b>	<b>47 días</b>
## 05.09.01.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS	2 días	do 13/3/16	lu 14/3/16	47 días
## 05.09.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO INC. CAMA DE ARENA Y CINTA DE SEÑALIZACION	2 días	mi 16/3/16	ju 17/3/16	47 días
## 05.09.01.03	<b>CABLEADO Y ACCESORIOS</b>	<b>3 días</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>ju 17/3/16</b>	<b>47 días</b>
## 05.09.01.03.01	CABLE UTP CAT 6 (CABLEADO ESTRUCTURADO)	3 días	ma 15/3/16	ju 17/3/16	47 días
## 05.09.01.03.02	ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO INC. INSTALACION	1 día	ju 17/3/16	ju 17/3/16	47 días
## 05.09.01.03.03	INSTALACION PARA UPS'S INC. CABLE, TABLERO, INTERRUPTORES Y SUPRESORES TRANSITORIOS	1 día	ju 17/3/16	ju 17/3/16	47 días
## 05.09.01.04	<b>CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS</b>	<b>4 días</b>	<b>sá 12/3/16</b>	<b>ma 15/3/16</b>	<b>47 días</b>
## 05.09.01.04.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50mm	1 día	sá 12/3/16	sá 12/3/16	47 días
## 05.09.01.04.02	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm	1 día	do 13/3/16	do 13/3/16	51 días
## 05.09.01.04.03	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm	4 días	sá 12/3/16	ma 15/3/16	47 días
## 05.09.01.05	<b>SALIDAS DE COMUNICACIONES</b>	<b>3 días</b>	<b>lu 7/3/16</b>	<b>mi 9/3/16</b>	<b>54 días</b>
## 05.09.01.05.01	SALIDA PARA DATA / WIFI	1 día	lu 7/3/16	lu 7/3/16	54 días
## 05.09.01.05.02	SALIDA PARA DATA/ TELEFONO IP	3 días	lu 7/3/16	mi 9/3/16	54 días
## 05.09.01.06	<b>PATCH PANEL</b>	<b>1 día</b>	<b>ju 10/3/16</b>	<b>ju 10/3/16</b>	<b>54 días</b>
## 05.09.01.06.01	INSTALACION DE PATCH PANEL	1 día	ju 10/3/16	ju 10/3/16	54 días
## 05.09.01.07	<b>RACK DE COMUNICACIONES</b>	<b>1 día</b>	<b>ju 10/3/16</b>	<b>ju 10/3/16</b>	<b>54 días</b>
## 05.09.01.07.01	INSTALACION DE RACK DE COMUNICACIONES	1 día	ju 10/3/16	ju 10/3/16	54 días
## 06	<b>EQUIPAMIENTO</b>	<b>5 días</b>	<b>vi 29/4/16</b>	<b>ma 3/5/16</b>	<b>0 días</b>
## 06.01	<b>MOBILIARIO BASICO</b>	<b>2 días</b>	<b>do 1/5/16</b>	<b>lu 2/5/16</b>	<b>0 días</b>
## 06.01.01	MESA DE REUNIONES: MUEBLE 1.20X1.20M, MADERA QUINILLA	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	0 días
## 06.01.02	CAMA 1 1/2 PLAZAS DE MADERA TORNILLO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.01.03	CAMAROTES 1 1/2 PLAZAS DE MADERA TORNILLO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.01.04	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 CAJONES : 1.50 X .75 CORRIZAS TELESCOPICA (INC. CERRADURA)	1 día	do 1/5/16	lu 2/5/16	2 días
## 06.01.05	ESTANTES PARA DOCUMENTOS: DE 0.80x.40m MADERA	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.01.06	MESA RECTANGULAR DE MADERA TORNILLO: 1.50 X 0.90M	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.01.07	CLOSET EMPOTRADO DE MELAMINE DE 2.70 X 2.55 X 0.65	2 días	do 1/5/16	lu 2/5/16	1 día
## 06.01.08	CLOSET EMPOTRADO DE MELAMINE DE 1.05 X 2.55 X 0.65	2 días	do 1/5/16	lu 2/5/16	1 día
## 06.01.09	SILLA COMEDOR (SIN BRAZOS MADERA)	1 día	do 1/5/16	lu 2/5/16	2 días
## 06.01.10	SILLAS DE OFICINA: ESTRUCTURA DE PVC	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.01.11	SILLAS PLÁSTICAS APILABLE SIN CODERAS PVC	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.01.12	VELADOR DE MADERA TORNILLO: 0.48 X 0.48M	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.01.13	ESTANTE METALICO INDUSTRIAL CON 5 DIVISIONES L=5.15M, A=1.00M, H=2.40M.	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02	<b>EQUIPAMIENTO BASICO</b>	<b>5 días</b>	<b>vi 29/4/16</b>	<b>ma 3/5/16</b>	<b>0 días</b>
## 06.02.01	<b>OFICINAS</b>	<b>1 día</b>	<b>do 1/5/16</b>	<b>do 1/5/16</b>	<b>2 días</b>
## 06.02.01.01	CAMARA WEB 5MPX 1080P HD, CAP. VIDEO 720P, ZOOM DIGITAL 3X, MICROFONO INCORP.	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.02	CÁMARA DE FOTOS SEMI PROFESIONAL 12.1 MPX CMOS 1/1.7" SX(28mm-140mm) 4.OX + FILMADORA PANT. 3" LC 1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.03	ALTOPARLANTE -BOCINA DE PERIFONEO 20" POT. 200W RMS	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.04	MEZCLADORA /AMPLIFICADOR DE PODER 3 ENTRADAS DE MIC. DOS ENTRADAS DE LINEA. 240W EN SALIDA DE 40H 1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.05	MICROFONO DE PERIFONEO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.06	MICROFONO DE PERIFONEO INALAMBRICO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.07	AURICULAR ALTAVOZ: FREC. 75 HZ-20KHZ POT. ENTRADA 2X10nW, MICROFONO: FRECUENCIA 50HZ -20KHZ, USB 2 1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.08	ECRAM ELECTRICO SIST. PANTALLA ELECT. MOTORIZADO C/PULSADOR A PARED DE 2.14MX2.14M FORMATO 1:1 4:1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.09	PROYECTOR MULTIMEDIA 1600 LUMENES, RES. 1090X1080 PARLANTE INCORP. HIBRIDA LASER/LED	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.10	COMPUTADORA PORTATIL, PROCES 4 NUCLEOS, RAM: 8GB (2X4GB), PANT: 15.6" LED, C/SONIDO, CAMARA WEB, W 1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO -EN A3 EN RED/IMPRESORA, ESCANER, COPIADORA - LASER, V 1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.12	PIZARRA ACRILICA 1.8M X 1.20M	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.13	EQUIPO DE COMUNICACION INALAMBRICO ACCESS POINT VEL. TRANS. 300MBPS	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.14	BANDERAS(03 UNIDADES)	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.15	EXTINTOR PQS 2.5 GL. ANSI/UL 40F-120°F ALUMINIO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.16	EXTINTOR , ACETATO POTACIO 2.5GAL ANSI/UL 40F -120°F ALUMINIO 125PSI	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.17	PATCH PANEL 24 PUERTOS	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.18	SWITCH DE 24P PoE/24 PUERTOS GI, RAQUEABLE CAP. 12Gbps FLASH 32 MB MIN. DRAM 128 MB	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.01.19	CORTINAS ENRRROLLABLE DE POLIESTER 1.25X1.50 (INCL. ACC. FIJACION) EN SUM	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.02	<b>DORMITORIOS</b>	<b>1 día</b>	<b>do 1/5/16</b>	<b>do 1/5/16</b>	<b>2 días</b>
## 06.02.02.01	ALMOHADAS 1 1/2 PLAZAS DE POLIURETANO, DERIVADO ORGÁNICO TERMOPLÁSTICO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
## 06.02.02.02	SABANAS / FUNDA 1 1/2 PLAZAS ALGODON 100% MERCERIZADO Y SAFOROZADO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días

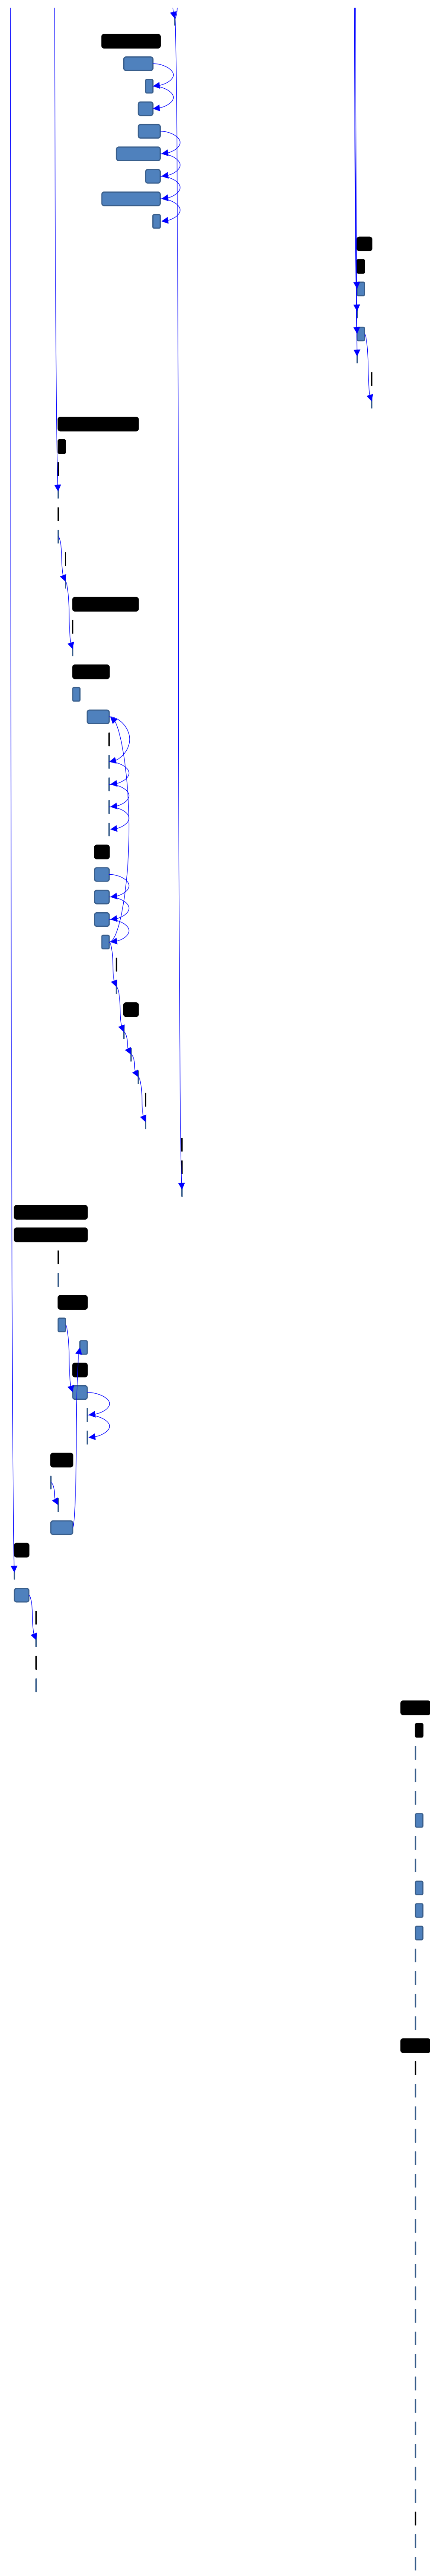

##	06.02.02.03	FRAZADA DE FIBRA DE ALPACA DE 1 1/2 PLAZA	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.02.04	COBERTOR 1.1/2 PLAZAS DE POLIESTER	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.02.05	COLCHONES 1 1/2 PLAZAS MAT: DERIVADO ORG. TERMOPLASTICO, ESPUMA: DURA Y RESISTENTE DE POROSIDAD F	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.02.06	CORTINAS ENROLLABLE PARA POLIESTER 1.25X1.50 (INCL. ACC. DE FIJACION)	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.02.07	CORTINAS DE DUCHA POLIESTER 1.40X1.80 (INCL. ACC. DE FIJACION)	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.02.08	TOALLAS ALGODÓN (50X60 CM)	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	<b>06.02.03</b>	<b>COCINA</b>	<b>1 día</b>	<b>do 1/5/16</b>	<b>do 1/5/16</b>	<b>2 días</b>
##	06.02.03.01	SARTÉN Nº 30- ALUMINIO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.02	OLLA INDUSTRIAL Nº 32 - ALUMINIO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.03	OLLA INDUSTRIAL Nº 46 - ALUMINIO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.04	TETERA 3 LITROS - ALUMINIO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.05	CUCHARON Nº 15- ALUMINIO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.06	ESPÁTULA - ALUMINIO CON MANGO DE MADERA	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.07	ESPUMADERA - ALUMINIO CON MANGO DE MADERA	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.08	PLATO TENDIDO Nº 9- LOSA BUENA CALIDAD	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.09	PLATO HONDO Nº 9 - LOSA BUENA CALIDAD	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.10	PLATO POSTRE Nº 8 - LOSA BUENA CALIDAD	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.11	TAZA CON PLATO 230ML - LOSA BUENA CALIDAD	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.12	JUEGO DE TAZONES(3 MEDIDAS) - LOSA BUENA CALIDAD	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.13	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE MODELO COLA DE PATO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.14	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE MODELO COLA DE PATO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.15	CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE MODELO COLA DE PATO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.16	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE COCINA CON MANGO DE MADERA	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.17	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA MODELO COLA DE PATO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.18	AZUCARERA DE LOSA BUENA CALIDAD	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.19	PORTA PLATOS DE POLIPROPILENO DE BASE DE COLORES Y TAPA TRANSPARENTE	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.20	TABLA DE PICAR DE MATERIAL ACRILICO 30X22CM	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.21	SALERO DE LOSA BUENA CALIDAD	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.22	SECADORES(MANTELES) DE ALGODON 30X 50CM	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.23	COCINA SEMIINDUSTRIAL ALTA 03 HORNILLAS LARGO 0.90M X ANCHO 55CM X ALTO 70CM	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.24	REFRIGERADOR FVOLTALICO CON KIT PANELES SOLARES INDEPENDIENTE PARA FUNCIONAMIENTO 24 HORAS DEL	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.03.25	CORTINAS ENROLLABLE DE POLIESTER 1.25x1.50 (INCL. ACC. FIJACION)	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	<b>06.02.04</b>	<b>OFICINA 2</b>	<b>1 día</b>	<b>do 1/5/16</b>	<b>do 1/5/16</b>	<b>2 días</b>
##	06.02.04.01	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA INC. KIT DE MEDICAMENTOS	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.04.02	CAMILLA POLIETILENO, C/CARRIL DE ACERO INOXIDABLE LARGO 2.15M X ANCHO 0.61M PROFUND. 0.19 M.	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.04.03	CORTINAS ENROLLABLE DE POLIESTER 1.25x1.50 (INCL. ACC. FIJACION)	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	<b>06.02.05</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>	<b>1 día</b>	<b>do 1/5/16</b>	<b>lu 2/5/16</b>	<b>2 días</b>
##	06.02.05.01	RECOGEDORES DE PLASTICO CON MANGO LARGO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.05.02	BALDE ESCURRIDOR DE PLASTICO GRANDE	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.05.03	PAPELERAS DE BASURAS CHICO DE PLASTICO (25 LITROS) 35CMX42CMX69CM	1 día	do 1/5/16	lu 2/5/16	2 días
##	06.02.05.04	PAPELERAS BASCULANTE DE POLIETILENO (75 LITROS) CON PARANTES METALICOS Ø 2"	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.05.05	CAJA DE HERRAMIENTAS 23" C/BROCHES METALICOS Y TAPA DE CAUCHO (INCL. HERRAMIENTAS)	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.05.06	CARRITILLA DE UNA RUEDA 3PIES CUBICOS CON TOLVA DE PLANCHA DE ACERO AL CARBONO SAE 1010 LAMINAD	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.05.07	ESCOBA SINTETICA DE 12" CON CERDAS DE PVC	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.05.08	TRAPEADOR CON MOPA PLANA CON MICOFIBRA 35 CM Y MANGO DE ALUMINIO	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.05.09	PICO DE ACERO AL CARBONO SAE 1045,CON TRATAMIENTO TERMICO (TEMPLADO Y REVENIDO) CON MANGO DE N	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.05.10	PALA DE ACERO AL CARBONO SAE 1045,CON TRATAMIENTO TERMICO (TEMPLADO Y REVENIDO) CON MANGO DE	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.05.11	LINTERNAS RECUBIERTA DE PLASTICO 15CM INTENSIDAD DE LA LUZ: 300 LUX.	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.05.12	SUPRESOR DE PICOS GRANDE SUJECION 775V DE 6 SALIDAS CON PROTECTOR DE PICO VOLTAJE 200V DE 3.00M.	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.05.13	MANGUERA 3/4" DE POLIETILENO REFORZADO ROLLO DE 100M	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.05.14	PAPELERAS DE BASURAS CHICO DE PLASTICO (10.7 LITROS) 25.9CMX18.4CMX36.5CM	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	<b>06.02.06</b>	<b>SANITARIAS</b>	<b>3 días</b>	<b>do 1/5/16</b>	<b>ma 3/5/16</b>	<b>0 días</b>
##	06.02.06.01	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCK MODELO A1E-0.6M CON APAGADO AUTOMATICO	3 días	do 1/5/16	ma 3/5/16	0 días
##	06.02.06.02	THERMA ELECTRICA DE ACERO APORCELANADO, 150LTS	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	06.02.06.03	THERMA ELECTRICA DE ACERO APORCELANADO, 50LTS	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##	<b>06.02.07</b>	<b>ELECTRICOS</b>	<b>5 días</b>	<b>vi 29/4/16</b>	<b>ma 3/5/16</b>	<b>0 días</b>
##	06.02.07.01	UPS TIPO TOWER POT. MIN. 2500 VA Ventrada=100-240V Vsalida= 220VAC, 10 MINUTOS AUTONOMIA C/PUERTOS:2	2 días	do 1/5/16	lu 2/5/16	1 día
##	06.02.07.02	GABINETE DE COMUNICACIONES 18 RU DE ACERO FRIO NEGRO TEXTURIZADO P/SISTEMA DE DATA	2 días	do 1/5/16	lu 2/5/16	1 día
##	06.02.07.03	GENERADOR ELECTRICO 8HP 6kW prime 7.5kVA MONOFASICO 220V, 60HZ, 4T-REFRIGERADO POR AIRE CIL. 150 A : 2	2 días	do 1/5/16	lu 2/5/16	1 día
##	06.02.07.04	POSTES SOLARES FOTOVOLTAICOS LED 65 W C/BATERIA 100AH Y CONTROLADOR CARGA (inc. instalacion)	5 días	vi 29/4/16	ma 3/5/16	0 días
##	06.02.07.05	ESTUFA TERMORADIADOR DE 2000 W DE POTENCIA	1 día	sá 30/4/16	sá 30/4/16	3 días
##	<b>06.02.08</b>	<b>MOVILIDAD</b>	<b>1 día</b>	<b>do 1/5/16</b>	<b>do 1/5/16</b>	<b>2 días</b>
##	06.02.08.01	MOTO LINEAL CILIN. 124CC -140CC, 4 T, MONOCILINDRICO, OHC, POT. MAX. 11.13HP@7,000 RPM -12.0HP@ 7,500	1 día	do 1/5/16	do 1/5/16	2 días
##		CULMINACION DE LA OBRA	0 días	ma 3/5/16	ma 3/5/16	0 días

