

# ANEXOS

## Anexo 1 Cartas Balance

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	22/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0038
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>		10,2

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Conformacion		
3	7:31	7:45	Desplazamiento de Plataforma	TC	
4	7:46	8:00	Desplazamiento de Plataforma	TC	
5	8:01	8:15	Conformacion	TP	
6	8:16	8:30	Conformacion	TP	
7	8:31	8:45	Conformacion	TP	
8	8:46	9:00	Conformacion	TP	
9	9:01	9:15	Conformacion	TP	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Conformacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	
14	10:16	10:30	Instrucciones	TC	
15	10:31	10:45	Conformacion	TP	
16	10:46	11:00	Conformacion	TP	
17	11:01	11:15	Conformacion	TP	
18	11:16	11:30	Conformacion	TP	
19	11:31	11:45	Conformacion	TP	
20	11:46	12:00	Conformacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Instrucciones	TC	
26	13:16	13:30	Lubricacion	TNC	
27	13:31	13:45	Lubricacion	TNC	
28	13:46	14:00	Lubricacion	TNC	
29	14:01	14:15	Lubricacion	TNC	
30	14:16	14:30	Lubricacion	TNC	
31	14:31	14:45	Conformacion	TP	
32	14:46	15:00	Conformacion	TP	
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	
34	15:16	15:30	Conformacion	TP	
35	15:31	15:45	Conformacion	TP	
36	15:46	16:00	Descansos	TNC	
37	16:01	16:15	Abastecimiento de Combustible	TC	
38	16:16	16:30	Conformacion	TP	
39	16:31	16:45	Conformacion	TP	
40	16:46	17:00	Conformacion	TP	
41	17:01	17:15	Conformacion	TP	
42	17:16	17:30	Desplazamiento de Plataforma	TC	
43	17:31	17:45	Desplazamiento de Plataforma	TC	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	22	56%
TC	9	23%
TNC	8	21%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	22/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0033
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>		6,3

ITEiv	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Abastecimiento de Combustible	TC	
3	7:31	7:45	Desplazamiento de Plataforma	TC	
4	7:46	8:00	Desplazamiento de Plataforma	TC	
5	8:01	8:15	Conformacion	TP	
6	8:16	8:30	Conformacion	TP	
7	8:31	8:45	Conformacion	TP	
8	8:46	9:00	Conformacion	TP	
9	9:01	9:15	Conformacion	TP	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Conformacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	
14	10:16	10:30	Espera de Frente de Trabajo	TNC	
15	10:31	10:45	Conformacion	TP	
16	10:46	11:00	Conformacion	TP	
17	11:01	11:15	Conformacion	TP	
18	11:16	11:30	Espera por Interferencia	TNC	
19	11:31	11:45	Espera por Interferencia	TNC	
20	11:46	12:00	Espera por Interferencia	TNC	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Inoperatividad	TNC	Cambio de Uñas
26	13:16	13:30	Inoperatividad	TNC	Cambio de Uñas
27	13:31	13:45	Inoperatividad	TNC	Cambio de Uñas
28	13:46	14:00	Inoperatividad	TNC	Cambio de Uñas
29	14:01	14:15	Inoperatividad	TNC	Cambio de Uñas
30	14:16	14:30	Inoperatividad	TNC	Cambio de Uñas
31	14:31	14:45	Inoperatividad	TNC	Cambio de Uñas
32	14:46	15:00	Conformacion	TP	
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	
34	15:16	15:30	Descansos	TNC	
35	15:31	15:45	Instrucciones	TC	
36	15:46	16:00	Conformacion	TP	
37	16:01	16:15	Conformacion	TP	
38	16:16	16:30	Lubricacion	TNC	
39	16:31	16:45	Lubricacion	TNC	
40	16:46	17:00	Lubricacion	TNC	
41	17:01	17:15	Lubricacion	TNC	
42	17:16	17:30	Lubricacion	TNC	
43	17:31	17:45	Lubricacion	TNC	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	14	36%
TC	6	15%
TNC	20	51%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	22/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0035
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>		1,4

ITEiv	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Conformacion	TP	
3	7:31	7:45	Conformacion	TP	
4	7:46	8:00	Conformacion	TP	
5	8:01	8:15	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
6	8:16	8:30	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
7	8:31	8:45	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
8	8:46	9:00	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
9	9:01	9:15	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
10	9:16	9:30	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
11	9:31	9:45	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
12	9:46	10:00	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
13	10:01	10:15	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
14	10:16	10:30	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
15	10:31	10:45	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
16	10:46	11:00	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
17	11:01	11:15	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
18	11:16	11:30	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
19	11:31	11:45	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
20	11:46	12:00	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
26	13:16	13:30	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
27	13:31	13:45	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
28	13:46	14:00	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
29	14:01	14:15	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
30	14:16	14:30	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
31	14:31	14:45	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
32	14:46	15:00	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
13	15:01	15:15	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
34	15:16	15:30	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
35	15:31	15:45	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
36	15:46	16:00	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
37	16:01	16:15	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
38	16:16	16:30	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
39	16:31	16:45	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
40	16:46	17:00	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
41	17:01	17:15	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
42	17:16	17:30	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
43	17:31	17:45	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE
44	17:46	18:00	Inoperativo	TNC	FALLA DE SENSOR DE

TP	3
TC	1
TNC	36

8%

3%

92%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	22/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0037
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>		10,3

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Conformacion	TP	
3	7:31	7:45	Conformacion	TP	
4	7:46	8:00	Conformacion	TP	
5	8:01	8:15	Desplazamiento de Plataforma	TC	
6	8:16	8:30	Desplazamiento de Plataforma	TC	
7	8:31	8:45	Conformacion	TP	
8	8:46	9:00	Conformacion	TP	
9	9:01	9:15	Conformacion	TP	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Conformacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	
14	10:16	10:30	Instrucciones	TC	
15	10:31	10:45	Conformacion	TP	
16	10:46	11:00	Conformacion	TP	
17	11:01	11:15	Conformacion	TP	
18	11:16	11:30	Conformacion	TP	
19	11:31	11:45	Conformacion	TP	
20	11:46	12:00	Conformacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Instrucciones	TC	
26	13:16	13:30	Lubricacion	TNC	
27	13:31	13:45	Lubricacion	TNC	
28	13:46	14:00	Lubricacion	TNC	
29	14:01	14:15	Lubricacion	TNC	
30	14:16	14:30	Lubricacion	TNC	
31	14:31	14:45	Lubricacion	TNC	
32	14:46	15:00	Conformacion	TP	
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	
34	15:16	15:30	Conformacion	TP	
35	15:31	15:45	Conformacion	TP	
36	15:46	16:00	Instrucciones	TC	
37	16:01	16:15	Abastecimiento de Combustible	TC	
38	16:16	16:30	Conformacion	TP	
39	16:31	16:45	Conformacion	TP	
40	16:46	17:00	Conformacion	TP	
41	17:01	17:15	Conformacion	TP	
42	17:16	17:30	Desplazamiento de Plataforma	TC	
43	17:31	17:45	Desplazamiento de Plataforma	TC	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	22	56%
TC	10	26%
TNC	8	21%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	22/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>	<b>Código:</b>	PE44/0019
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>		8

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Abastecimiento de Combustible	TC	
3	7:31	7:45	Espera de Frente	TNC	
4	7:46	8:00	Espera de Frente	TNC	
5	8:01	8:15	Espera de Frente	TNC	
6	8:16	8:30	Espera de Frente	TNC	
7	8:31	8:45	Espera de Frente	TNC	
8	8:46	9:00	Espera de Frente	TNC	
9	9:01	9:15	Espera de Frente	TNC	
10	9:16	9:30	Desplazamiento de Plataforma	TC	
11	9:31	9:45	Desplazamiento de Plataforma	TC	
12	9:46	10:00	Compactacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	
14	10:16	10:30	Compactacion	TP	
15	10:31	10:45	Compactacion	TP	
16	10:46	11:00	Compactacion	TP	
17	11:01	11:15	Compactacion	TP	
18	11:16	11:30	Compactacion	TP	
19	11:31	11:45	Compactacion	TP	
20	11:46	12:00	Compactacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Desplazamiento de Plataforma	TC	
26	13:16	13:30	Desplazamiento de Plataforma	TC	
27	13:31	13:45	Compactacion	TP	
28	13:46	14:00	Compactacion	TP	
29	14:01	14:15	Compactacion	TP	
30	14:16	14:30	Inoperatividad	TNC	APLICACIÓN DE
31	14:31	14:45	Inoperatividad	TNC	APLICACIÓN DE
32	14:46	15:00	Inoperatividad	TNC	APLICACIÓN DE
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	
34	15:16	15:30	Inoperatividad	TNC	APLICACIÓN DE
35	15:31	15:45	Espera de Frente	TNC	
36	15:46	16:00	Espera de Frente	TNC	
37	16:01	16:15	Espera de Frente	TNC	
38	16:16	16:30	Desplazamiento de Plataforma	TC	
39	16:31	16:45	Compactacion	TP	
40	16:46	17:00	Compactacion	TP	
41	17:01	17:15	Compactacion	TP	
42	17:16	17:30	Compactacion	TP	
43	17:31	17:45	Compactacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	16	41%
TC	8	21%
TNC	16	41%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	22/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>	<b>Código:</b>	PE44/0018
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>		10,5

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Desplazamiento de Plataforma	TC	
3	7:31	7:45	Desplazamiento de Plataforma	TC	
4	7:46	8:00	Abastecimiento de Combustible	TC	
5	8:01	8:15	Compactacion	TP	
6	8:16	8:30	Compactacion	TP	
7	8:31	8:45	Espera de Frente	TNC	
8	8:46	9:00	Espera de Frente	TNC	
9	9:01	9:15	Espera de Frente	TNC	
10	9:16	9:30	Compactacion	TP	
11	9:31	9:45	Compactacion	TP	
12	9:46	10:00	Compactacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	
14	10:16	10:30	Compactacion	TP	
15	10:31	10:45	Compactacion	TP	
16	10:46	11:00	Compactacion	TP	
17	11:01	11:15	Compactacion	TP	
18	11:16	11:30	Compactacion	TP	
19	11:31	11:45	Compactacion	TP	
20	11:46	12:00	Compactacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Desplazamiento de Plataforma	TC	
26	13:16	13:30	Compactacion	TP	
27	13:31	13:45	Compactacion	TP	
28	13:46	14:00	Compactacion	TP	
29	14:01	14:15	Compactacion	TP	
30	14:16	14:30	Compactacion	TP	
31	14:31	14:45	Compactacion	TP	
32	14:46	15:00	Compactacion	TP	
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	
34	15:16	15:30	Compactacion	TP	
35	15:31	15:45	Espera de Frente	TNC	
36	15:46	16:00	Espera de Frente	TNC	
37	16:01	16:15	Espera de Frente	TNC	
38	16:16	16:30	Compactacion	TP	
39	16:31	16:45	Compactacion	TP	
40	16:46	17:00	Compactacion	TP	
41	17:01	17:15	Compactacion	TP	
42	17:16	17:30	Compactacion	TP	
43	17:31	17:45	Desplazamiento de Plataforma	TC	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	25	64%
TC	7	18%
TNC	8	21%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	23/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0033 8,2

ITEiv	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Inoperativo	TNC	TE, EVAL. CON MOTOR A TE
4	7:46	8:00	Inoperativo	TNC	TE, EVAL. CON MOTOR A TE
5	8:01	8:15	Inoperativo	TNC	TE, EVAL. CON MOTOR A TE
6	8:16	8:30	Inoperativo	TNC	TE, EVAL. CON MOTOR A TE
7	8:31	8:45	Inoperativo	TNC	TE, EVAL. CON MOTOR A TE
8	8:46	9:00	Inoperativo	TNC	TE, EVAL. CON MOTOR A TE
9	9:01	9:15	Desplazamiento	TC	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Conformacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	
14	10:16	10:30	Conformacion	TP	
15	10:31	10:45	Conformacion	TP	
16	10:46	11:00	Conformacion	TP	
17	11:01	11:15	Conformacion	TP	
18	11:16	11:30	Conformacion	TP	
19	11:31	11:45	Conformacion	TP	
20	11:46	12:00	Conformacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
26	13:16	13:30	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
27	13:31	13:45	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
28	13:46	14:00	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
29	14:01	14:15	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
30	14:16	14:30	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
31	14:31	14:45	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
32	14:46	15:00	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Espera de Frente	TNC	
35	15:31	15:45	Conformacion	TP	
36	15:46	16:00	Conformacion	TP	
37	16:01	16:15	Conformacion	TP	
38	16:16	16:30	Conformacion	TP	
39	16:31	16:45	Conformacion	TP	
40	16:46	17:00	Conformacion	TP	
41	17:01	17:15	Conformacion	TP	
42	17:16	17:30	Conformacion	TP	
43	17:31	17:45	Conformacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	19	48%
TC	4	10%
TNC	17	43%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	23/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0037 9,3

ITEiv	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Desplazamiento	TC	
4	7:46	8:00	Conformacion	TP	
5	8:01	8:15	Conformacion	TP	
6	8:16	8:30	Conformacion	TP	
7	8:31	8:45	Conformacion	TP	
8	8:46	9:00	Conformacion	TP	
9	9:01	9:15	Conformacion	TP	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Conformacion	TP	
13	10:01	10:15	Inoperativo	TNC	FUNCIONAMIENTO DE BO
14	10:16	10:30	Inoperativo	TNC	FUNCIONAMIENTO DE BO
15	10:31	10:45	Inoperativo	TNC	FUNCIONAMIENTO DE BO
16	10:46	11:00	Inoperativo	TNC	FUNCIONAMIENTO DE BO
17	11:01	11:15	Inoperativo	TNC	FUNCIONAMIENTO DE BO
18	11:16	11:30	Inoperativo	TNC	FUNCIONAMIENTO DE BO
19	11:31	11:45	Inoperativo	TNC	FUNCIONAMIENTO DE BO
20	11:46	12:00	Inoperativo	TNC	FUNCIONAMIENTO DE BO
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
26	13:16	13:30	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
27	13:31	13:45	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
28	13:46	14:00	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
29	14:01	14:15	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
30	14:16	14:30	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
31	14:31	14:45	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
32	14:46	15:00	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	
34	15:16	15:30	Conformacion	TP	
35	15:31	15:45	Conformacion	TP	
36	15:46	16:00	Conformacion	TP	
37	16:01	16:15	Conformacion	TP	
38	16:16	16:30	Conformacion	TP	
39	16:31	16:45	Conformacion	TP	
40	16:46	17:00	Conformacion	TP	
41	17:01	17:15	Conformacion	TP	
42	17:16	17:30	Conformacion	TP	
43	17:31	17:45	Conformacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	19	48%
TC	4	10%
TNC	17	43%



<b>Fronte de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	23/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0035 0

ITEIv	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Inoperativo	TNC	MANOS RH, PERNO DE RUED
2	7:16	7:30	Inoperativo	TNC	MANOS RH, PERNO DE RUED
3	7:31	7:45	Inoperativo	TNC	MANOS RH, PERNO DE RUED
4	7:46	8:00	Inoperativo	TNC	MANOS RH, PERNO DE RUED
5	8:01	8:15	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
6	8:16	8:30	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
7	8:31	8:45	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
8	8:46	9:00	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
9	9:01	9:15	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
10	9:16	9:30	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
11	9:31	9:45	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
12	9:46	10:00	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
13	10:01	10:15	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
14	10:16	10:30	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
15	10:31	10:45	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
16	10:46	11:00	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
17	11:01	11:15	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
18	11:16	11:30	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
19	11:31	11:45	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
20	11:46	12:00	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
26	13:16	13:30	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
27	13:31	13:45	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
28	13:46	14:00	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
29	14:01	14:15	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
30	14:16	14:30	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
31	14:31	14:45	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
32	14:46	15:00	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
13	15:01	15:15	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
34	15:16	15:30	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
35	15:31	15:45	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
36	15:46	16:00	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
37	16:01	16:15	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
38	16:16	16:30	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
39	16:31	16:45	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
40	16:46	17:00	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
41	17:01	17:15	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
42	17:16	17:30	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
43	17:31	17:45	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,
44	17:46	18:00	Inoperativo	TNC	FALTA PSAMANOS RH,

TP	0
TC	0
TNC	40

0%  
0%  
100%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	23/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0023 5,9

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Desplazamiento	TC	
4	7:46	8:00	Desplazamiento	TC	
5	8:01	8:15	Conformacion	TP	
6	8:16	8:30	Conformacion	TP	
7	8:31	8:45	Conformacion	TP	
8	8:46	9:00	Conformacion	TP	
9	9:01	9:15	Conformacion	TP	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Conformacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	
14	10:16	10:30	Conformacion	TP	
15	10:31	10:45	Lubricacion	TC	
16	10:46	11:00	Lubricacion	TC	
17	11:01	11:15	Lubricacion	TC	
18	11:16	11:30	Lubricacion	TC	
19	11:31	11:45	Lubricacion	TC	
20	11:46	12:00	Lubricacion	TC	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
26	13:16	13:30	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
27	13:31	13:45	Inoperativo	TNC	EVALUACION POR
28	13:46	14:00	Inoperativo	TNC	EVALUACION POR
29	14:01	14:15	Inoperativo	TNC	EVALUACION POR
30	14:16	14:30	Inoperativo	TNC	EVALUACION POR
31	14:31	14:45	Inoperativo	TNC	EVALUACION POR
32	14:46	15:00	Inoperativo	TNC	EVALUACION POR
33	15:01	15:15	Inoperativo	TNC	EVALUACION POR
34	15:16	15:30	Inoperativo	TNC	EVALUACION POR
35	15:31	15:45	Inoperativo	TNC	EVALUACION POR
36	15:46	16:00	Inoperativo	TNC	EVALUACION POR
37	16:01	16:15	Inoperativo	TNC	EVALUACION POR
38	16:16	16:30	Inoperativo	TNC	EVALUACION POR
39	16:31	16:45	Inoperativo	TNC	EVALUACION POR
40	16:46	17:00	Inoperativo	TNC	EVALUACION POR
41	17:01	17:15	Inoperativo	TNC	EVALUACION POR
42	17:16	17:30	Conformacion	TP	
43	17:31	17:45	Conformacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	11	28%
TC	11	28%
TNC	18	45%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	23/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE44/0017 10,3

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Desplazamiento	TC	
4	7:46	8:00	Desplazamiento	TC	
5	8:01	8:15	Compactacion	TP	
6	8:16	8:30	Compactacion	TP	
7	8:31	8:45	Compactacion	TP	
8	8:46	9:00	Compactacion	TP	
9	9:01	9:15	Compactacion	TP	
10	9:16	9:30	Compactacion	TP	
11	9:31	9:45	Compactacion	TP	
12	9:46	10:00	Compactacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	
14	10:16	10:30	Compactacion	TP	
15	10:31	10:45	Compactacion	TP	
16	10:46	11:00	Compactacion	TP	
17	11:01	11:15	Compactacion	TP	
18	11:16	11:30	Compactacion	TP	
19	11:31	11:45	Compactacion	TP	
20	11:46	12:00	Compactacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Desplazamiento	TC	
26	13:16	13:30	Espera de Frente	TNC	Retiro de islas
27	13:31	13:45	Espera de Frente	TNC	Retiro de islas
28	13:46	14:00	Espera de Frente	TNC	Retiro de islas
29	14:01	14:15	Espera de Frente	TNC	Retiro de islas
30	14:16	14:30	Espera de Frente	TNC	Retiro de islas
31	14:31	14:45	Espera de Frente	TNC	Retiro de islas
32	14:46	15:00	Espera de Frente	TNC	Retiro de islas
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	
34	15:16	15:30	Compactacion	TP	
35	15:31	15:45	Compactacion	TP	
36	15:46	16:00	Compactacion	TP	
37	16:01	16:15	Compactacion	TP	
38	16:16	16:30	Compactacion	TP	
39	16:31	16:45	Compactacion	TP	
40	16:46	17:00	Compactacion	TP	
41	17:01	17:15	Compactacion	TP	
42	17:16	17:30	Compactacion	TP	
43	17:31	17:45	Compactacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	25	63%
TC	6	15%
TNC	9	23%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	23/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE44/0018 9

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Desplazamiento	TC	
4	7:46	8:00	Desplazamiento	TC	
5	8:01	8:15	Compactacion	TP	
6	8:16	8:30	Compactacion	TP	
7	8:31	8:45	Compactacion	TP	
8	8:46	9:00	Compactacion	TP	
9	9:01	9:15	Compactacion	TP	
10	9:16	9:30	Compactacion	TP	
11	9:31	9:45	Compactacion	TP	
12	9:46	10:00	Compactacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	
14	10:16	10:30	Compactacion	TP	
15	10:31	10:45	Compactacion	TP	
16	10:46	11:00	Compactacion	TP	
17	11:01	11:15	Compactacion	TP	
18	11:16	11:30	Compactacion	TP	
19	11:31	11:45	Compactacion	TP	
20	11:46	12:00	Compactacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Desplazamiento	TC	
26	13:16	13:30	Espera de Frente	TNC	Retiro de islas
27	13:31	13:45	Espera de Frente	TNC	Retiro de islas
28	13:46	14:00	Espera de Frente	TNC	Retiro de islas
29	14:01	14:15	Espera de Frente	TNC	Retiro de islas
30	14:16	14:30	Espera de Frente	TNC	Retiro de islas
31	14:31	14:45	Espera de Frente	TNC	Retiro de islas
32	14:46	15:00	Espera de Frente	TNC	Retiro de islas
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	
34	15:16	15:30	Compactacion	TP	
35	15:31	15:45	Compactacion	TP	
36	15:46	16:00	Compactacion	TP	
37	16:01	16:15	Inoperativo	TNC	DESGASTE EXCESIVO DE
38	16:16	16:30	Inoperativo	TNC	DESGASTE EXCESIVO DE
39	16:31	16:45	Inoperativo	TNC	DESGASTE EXCESIVO DE
40	16:46	17:00	Inoperativo	TNC	DESGASTE EXCESIVO DE
41	17:01	17:15	Inoperativo	TNC	DESGASTE EXCESIVO DE
42	17:16	17:30	Inoperativo	TNC	DESGASTE EXCESIVO DE
43	17:31	17:45	Inoperativo	TNC	DESGASTE EXCESIVO DE
44	17:46	18:00	Inoperativo	TNC	DESGASTE EXCESIVO DE

TP	18
TC	5
TNC	17

45%

13%

43%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	23/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE44/A098 9,8

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Desplazamiento	TC	
4	7:46	8:00	Desplazamiento	TC	
5	8:01	8:15	Compactacion	TP	
6	8:16	8:30	Compactacion	TP	
7	8:31	8:45	Compactacion	TP	
8	8:46	9:00	Compactacion	TP	
9	9:01	9:15	Compactacion	TP	
10	9:16	9:30	Compactacion	TP	
11	9:31	9:45	Compactacion	TP	
12	9:46	10:00	Compactacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	
14	10:16	10:30	Compactacion	TP	
15	10:31	10:45	Compactacion	TP	
16	10:46	11:00	Compactacion	TP	
17	11:01	11:15	Compactacion	TP	
18	11:16	11:30	Compactacion	TP	
19	11:31	11:45	Compactacion	TP	
20	11:46	12:00	Compactacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Desplazamiento	TC	
26	13:16	13:30	Compactacion	TP	
27	13:31	13:45	Compactacion	TP	
28	13:46	14:00	Compactacion	TP	
29	14:01	14:15	Compactacion	TP	
30	14:16	14:30	Compactacion	TP	
31	14:31	14:45	Compactacion	TP	
32	14:46	15:00	Compactacion	TP	
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	
34	15:16	15:30	Compactacion	TP	
35	15:31	15:45	Compactacion	TP	
36	15:46	16:00	Compactacion	TP	
37	16:01	16:15	Compactacion	TP	
38	16:16	16:30	Compactacion	TP	
39	16:31	16:45	Compactacion	TP	
40	16:46	17:00	Compactacion	TP	
41	17:01	17:15	Desplazamiento a otra plat	TC	
42	17:16	17:30	Desplazamiento a otra plat	TC	
43	17:31	17:45	Desplazamiento a otra plat	TC	
44	17:46	18:00	Desplazamiento a otra plat	TC	

TP	29
TC	9
TNC	2

73%

23%

5%

**Fronte de Trabajo:**                      **Actividad:**                                      **Fecha:**                      24/11/2021  
**Lider de Grupo:**                              **Registrador:**                                      HTRA  
**Operador:**                                      **Equipo:**                                      **Código:**                      PE32/0035                      0

ITE	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
4	7:46	8:00	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
5	8:01	8:15	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
6	8:16	8:30	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
7	8:31	8:45	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
8	8:46	9:00	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
9	9:01	9:15	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
10	9:16	9:30	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
11	9:31	9:45	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
12	9:46	10:00	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
13	10:01	10:15	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
14	10:16	10:30	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
15	10:31	10:45	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
16	10:46	11:00	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
17	11:01	11:15	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
18	11:16	11:30	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
19	11:31	11:45	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
20	11:46	12:00	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
26	13:16	13:30	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
27	13:31	13:45	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
28	13:46	14:00	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
29	14:01	14:15	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
30	14:16	14:30	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
31	14:31	14:45	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
32	14:46	15:00	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
33	15:01	15:15	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
34	15:16	15:30	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
35	15:31	15:45	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
36	15:46	16:00	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
37	16:01	16:15	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
38	16:16	16:30	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
39	16:31	16:45	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
40	16:46	17:00	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
41	17:01	17:15	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
42	17:16	17:30	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
43	17:31	17:45	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI
44	17:46	18:00	Inoperativo	TNC	SENSOR DE COMB, SENSOR INCI

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	24/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0033 7,8

ITEIvr	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Abastecimiento	TC	
4	7:46	8:00	Desplazamiento	TC	
5	8:01	8:15	Conformacion	TP	
6	8:16	8:30	Conformacion	TP	
7	8:31	8:45	Conformacion	TP	
8	8:46	9:00	Conformacion	TP	
9	9:01	9:15	Lubricacion	TC	
10	9:16	9:30	Lubricacion	TC	
11	9:31	9:45	Lubricacion	TC	
12	9:46	10:00	Desplazamiento	TC	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Conformacion	TP	
15	10:31	10:45	Conformacion	TP	
16	10:46	11:00	Conformacion	TP	
17	11:01	11:15	Conformacion	TP	
18	11:16	11:30	Conformacion	TP	
19	11:31	11:45	Conformacion	TP	
20	11:46	12:00	Conformacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Conformacion	TP	
26	13:16	13:30	Conformacion	TP	
27	13:31	13:45	Conformacion	TP	
28	13:46	14:00	Conformacion	TP	
29	14:01	14:15	Conformacion	TP	
30	14:16	14:30	Conformacion	TP	
31	14:31	14:45	Conformacion	TP	
32	14:46	15:00	Conformacion	TP	
33	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Espera de frente	TNC	
35	15:31	15:45	Espera de frente	TNC	
36	15:46	16:00	Espera de frente	TNC	
37	16:01	16:15	Conformacion	TP	
38	16:16	16:30	Conformacion	TP	
39	16:31	16:45	Conformacion	TP	
40	16:46	17:00	Conformacion	TP	
41	17:01	17:15	Conformacion	TP	
42	17:16	17:30	Conformacion	TP	
43	17:31	17:45	Conformacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	24/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE44/A098 8,2

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Desplazamiento	TC	
4	7:46	8:00	Espera de frente	TNC	
5	8:01	8:15	Espera de frente	TNC	
6	8:16	8:30	Espera de frente	TNC	
7	8:31	8:45	Espera de frente	TNC	
8	8:46	9:00	Compactacion	TP	
9	9:01	9:15	Compactacion	TP	
10	9:16	9:30	Compactacion	TP	
11	9:31	9:45	Compactacion	TP	
12	9:46	10:00	Compactacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Compactacion	TP	
15	10:31	10:45	Compactacion	TP	
16	10:46	11:00	Compactacion	TP	
17	11:01	11:15	Compactacion	TP	
18	11:16	11:30	Compactacion	TP	
19	11:31	11:45	Compactacion	TP	
20	11:46	12:00	Abastecimiento	TC	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Compactacion	TP	
26	13:16	13:30	Compactacion	TP	
27	13:31	13:45	Compactacion	TP	
28	13:46	14:00	Compactacion	TP	
29	14:01	14:15	Compactacion	TP	
30	14:16	14:30	Compactacion	TP	
31	14:31	14:45	Compactacion	TP	
32	14:46	15:00	Compactacion	TP	
33	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Espera de frente	TNC	
35	15:31	15:45	Espera de frente	TNC	
36	15:46	16:00	Espera de frente	TNC	
37	16:01	16:15	Espera de frente	TNC	
38	16:16	16:30	Espera de frente	TNC	
39	16:31	16:45	Espera de frente	TNC	
40	16:46	17:00	Espera de frente	TNC	
41	17:01	17:15	Compactacion	TP	
42	17:16	17:30	Compactacion	TP	
43	17:31	17:45	Compactacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	22	55%
TC	5	13%
TNC	13	33%



<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	24/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE44/0017 8,4

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Desplazamiento	TC	
4	7:46	8:00	Espera de frente	TNC	
5	8:01	8:15	Espera de frente	TNC	
6	8:16	8:30	Espera de frente	TNC	
7	8:31	8:45	Espera de frente	TNC	
8	8:46	9:00	Compactacion	TP	
9	9:01	9:15	Compactacion	TP	
10	9:16	9:30	Compactacion	TP	
11	9:31	9:45	Compactacion	TP	
12	9:46	10:00	Compactacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Compactacion	TP	
15	10:31	10:45	Compactacion	TP	
16	10:46	11:00	Abastecimiento	TC	
17	11:01	11:15	Compactacion	TP	
18	11:16	11:30	Compactacion	TP	
19	11:31	11:45	Compactacion	TP	
20	11:46	12:00	Compactacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Compactacion	TP	
26	13:16	13:30	Compactacion	TP	
27	13:31	13:45	Compactacion	TP	
28	13:46	14:00	Compactacion	TP	
29	14:01	14:15	Compactacion	TP	
30	14:16	14:30	Compactacion	TP	
31	14:31	14:45	Compactacion	TP	
32	14:46	15:00	Compactacion	TP	
33	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Espera de frente	TNC	
35	15:31	15:45	Espera de frente	TNC	
36	15:46	16:00	Espera de frente	TNC	
37	16:01	16:15	Espera de frente	TNC	
38	16:16	16:30	Espera de frente	TNC	
39	16:31	16:45	Espera de frente	TNC	
40	16:46	17:00	Espera de frente	TNC	
41	17:01	17:15	Compactacion	TP	
42	17:16	17:30	Compactacion	TP	
43	17:31	17:45	Compactacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	22	55%
TC	5	13%
TNC	13	33%

<b>Fronte de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	25/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0037 9,7

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Desplazamiento	TC	
4	7:46	8:00	Conformacion	TP	
5	8:01	8:15	Conformacion	TP	
6	8:16	8:30	Conformacion	TP	
7	8:31	8:45	Conformacion	TP	
8	8:46	9:00	Abastecimiento de Combustible	TC	
9	9:01	9:15	Conformacion	TP	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Conformacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Conformacion	TP	
15	10:31	10:45	Conformacion	TP	
16	10:46	11:00	Conformacion	TP	
17	11:01	11:15	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
18	11:16	11:30	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
19	11:31	11:45	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
20	11:46	12:00	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Desplazamiento de Plataforma	TC	
26	13:16	13:30	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
27	13:31	13:45	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
28	13:46	14:00	Conformacion	TP	
29	14:01	14:15	Conformacion	TP	
30	14:16	14:30	Conformacion	TP	
31	14:31	14:45	Conformacion	TP	
32	14:46	15:00	Conformacion	TP	
33	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Conformacion	TP	
35	15:31	15:45	Conformacion	TP	
36	15:46	16:00	Conformacion	TP	
37	16:01	16:15	Conformacion	TP	
38	16:16	16:30	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
39	16:31	16:45	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
40	16:46	17:00	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
41	17:01	17:15	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
42	17:16	17:30	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
43	17:31	17:45	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	20	50%
TC	6	15%
TNC	14	35%

<b>Fronte de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	25/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE44/A081 8,9

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Espera de frente	TNC	
4	7:46	8:00	Espera de frente	TNC	
5	8:01	8:15	Espera de frente	TNC	
6	8:16	8:30	Espera de frente	TNC	
7	8:31	8:45	Espera de frente	TNC	
8	8:46	9:00	Compactacion	TP	
9	9:01	9:15	Lubricacion	TC	
10	9:16	9:30	Lubricacion	TC	
11	9:31	9:45	Compactacion	TP	
12	9:46	10:00	Compactacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Compactacion	TP	
15	10:31	10:45	Compactacion	TP	
16	10:46	11:00	Compactacion	TP	
17	11:01	11:15	Compactacion	TP	
18	11:16	11:30	Compactacion	TP	
19	11:31	11:45	Compactacion	TP	
20	11:46	12:00	Compactacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Espera de frente	TNC	
26	13:16	13:30	Espera de frente	TNC	
27	13:31	13:45	Espera de frente	TNC	
28	13:46	14:00	Compactacion	TP	
29	14:01	14:15	Compactacion	TP	
30	14:16	14:30	Compactacion	TP	
31	14:31	14:45	Compactacion	TP	
32	14:46	15:00	Compactacion	TP	
33	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Compactacion	TP	
35	15:31	15:45	Compactacion	TP	
36	15:46	16:00	Compactacion	TP	
37	16:01	16:15	Compactacion	TP	
38	16:16	16:30	Compactacion	TP	
39	16:31	16:45	Compactacion	TP	
40	16:46	17:00	Compactacion	TP	
41	17:01	17:15	Compactacion	TP	
42	17:16	17:30	Compactacion	TP	
43	17:31	17:45	Compactacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	25
TC	5
TNC	10

63%  
13%  
25%

<b>Fronte de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	25/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE44/A098 9,5

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Espera de frente	TNC	
4	7:46	8:00	Espera de frente	TNC	
5	8:01	8:15	Espera de frente	TNC	
6	8:16	8:30	Espera de frente	TNC	
7	8:31	8:45	Espera de frente	TNC	
8	8:46	9:00	Compactacion	TP	
9	9:01	9:15	Compactacion	TP	
10	9:16	9:30	Compactacion	TP	
11	9:31	9:45	Lubricacion	TC	
12	9:46	10:00	Lubricacion	TC	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Compactacion	TP	
15	10:31	10:45	Compactacion	TP	
16	10:46	11:00	Compactacion	TP	
17	11:01	11:15	Compactacion	TP	
18	11:16	11:30	Compactacion	TP	
19	11:31	11:45	Compactacion	TP	
20	11:46	12:00	Compactacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Espera de frente	TNC	
26	13:16	13:30	Espera de frente	TNC	
27	13:31	13:45	Espera de frente	TNC	
28	13:46	14:00	Compactacion	TP	
29	14:01	14:15	Compactacion	TP	
30	14:16	14:30	Compactacion	TP	
31	14:31	14:45	Compactacion	TP	
32	14:46	15:00	Compactacion	TP	
33	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Compactacion	TP	
35	15:31	15:45	Compactacion	TP	
36	15:46	16:00	Compactacion	TP	
37	16:01	16:15	Compactacion	TP	
38	16:16	16:30	Compactacion	TP	
39	16:31	16:45	Compactacion	TP	
40	16:46	17:00	Compactacion	TP	
41	17:01	17:15	Compactacion	TP	
42	17:16	17:30	Compactacion	TP	
43	17:31	17:45	Compactacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	25
TC	5
TNC	10

63%

13%

25%

**Fronte de Trabajo:**                      **Actividad:**                                      **Fecha:**                      26/11/2021  
**Lider de Grupo:**                              **Registrador:**                                      HTRA  
**Operador:**                                      **Equipo:**                                      **Código:**                      PE32/0033                      5

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Conformacion	TP	
4	7:46	8:00	Conformacion	TP	
5	8:01	8:15	Conformacion	TP	
6	8:16	8:30	Conformacion	TP	
7	8:31	8:45	Conformacion	TP	
8	8:46	9:00	Conformacion	TP	
9	9:01	9:15	Conformacion	TP	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Conformacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Inoperativo	TNC	DE MOTOR POR SENSOR DE PF
15	10:31	10:45	Inoperativo	TNC	DE MOTOR POR SENSOR DE PF
16	10:46	11:00	Inoperativo	TNC	DE MOTOR POR SENSOR DE PF
17	11:01	11:15	Inoperativo	TNC	DE MOTOR POR SENSOR DE PF
18	11:16	11:30	Inoperativo	TNC	DE MOTOR POR SENSOR DE PF
19	11:31	11:45	Inoperativo	TNC	DE MOTOR POR SENSOR DE PF
20	11:46	12:00	Inoperativo	TNC	DE MOTOR POR SENSOR DE PF
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Inoperativo	TNC	DE MOTOR POR SENSOR DE PF
26	13:16	13:30	Inoperativo	TNC	DE MOTOR POR SENSOR DE PF
27	13:31	13:45	Inoperativo	TNC	DE MOTOR POR SENSOR DE PF
28	13:46	14:00	Inoperativo	TNC	DE MOTOR POR SENSOR DE PF
29	14:01	14:15	Inoperativo	TNC	DE MOTOR POR SENSOR DE PF
30	14:16	14:30	Conformacion	TP	
31	14:31	14:45	Conformacion	TP	
32	14:46	15:00	Conformacion	TP	
33	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Conformacion	TP	
35	15:31	15:45	Conformacion	TP	
36	15:46	16:00	Conformacion	TP	
37	16:01	16:15	Conformacion	TP	
38	16:16	16:30	Conformacion	TP	
39	16:31	16:45	Conformacion	TP	
40	16:46	17:00	Desplazamiento a otra plataforma	TC	
41	17:01	17:15	Desplazamiento a otra plataforma	TC	
42	17:16	17:30	Desplazamiento a otra plataforma	TC	
43	17:31	17:45	Desplazamiento a otra plataforma	TC	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	19	48%
TC	7	18%
TNC	14	35%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	26/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>	<b>HTRA</b>	
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0035 9,4

ITEiv	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Conformacion	TP	
4	7:46	8:00	Conformacion	TP	
5	8:01	8:15	Lubricacion	TC	
6	8:16	8:30	Lubricacion	TC	
7	8:31	8:45	Lubricacion	TC	
8	8:46	9:00	Conformacion	TP	
9	9:01	9:15	Conformacion	TP	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Conformacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Conformacion	TP	
15	10:31	10:45	Conformacion	TP	
16	10:46	11:00	Conformacion	TP	
17	11:01	11:15	Conformacion	TP	
18	11:16	11:30	Conformacion	TP	
19	11:31	11:45	Conformacion	TP	
20	11:46	12:00	Conformacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Conformacion	TP	
26	13:16	13:30	Conformacion	TP	
27	13:31	13:45	Conformacion	TP	
28	13:46	14:00	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
29	14:01	14:15	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
30	14:16	14:30	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
31	14:31	14:45	Conformacion	TP	
32	14:46	15:00	Conformacion	TP	
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Conformacion	TP	
35	15:31	15:45	Conformacion	TP	
36	15:46	16:00	Conformacion	TP	
37	16:01	16:15	Conformacion	TP	
38	16:16	16:30	Abastecimiento	TC	
39	16:31	16:45	Conformacion	TP	
40	16:46	17:00	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
41	17:01	17:15	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
42	17:16	17:30	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
43	17:31	17:45	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	24
TC	7
TNC	9

60%  
18%  
23%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	26/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0037 8,9

ITEiv	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Conformacion	TP	
4	7:46	8:00	Conformacion	TP	
5	8:01	8:15	Conformacion	TP	
6	8:16	8:30	Conformacion	TP	
7	8:31	8:45	Conformacion	TP	
8	8:46	9:00	Lubricacion	TC	
9	9:01	9:15	Lubricacion	TC	
10	9:16	9:30	Lubricacion	TC	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Conformacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Conformacion	TP	
15	10:31	10:45	Conformacion	TP	
16	10:46	11:00	Conformacion	TP	
17	11:01	11:15	Conformacion	TP	
18	11:16	11:30	Conformacion	TP	
19	11:31	11:45	Conformacion	TP	
20	11:46	12:00	Conformacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Conformacion	TP	
26	13:16	13:30	Conformacion	TP	
27	13:31	13:45	Conformacion	TP	
28	13:46	14:00	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
29	14:01	14:15	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
30	14:16	14:30	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
31	14:31	14:45	Conformacion	TP	
32	14:46	15:00	Conformacion	TP	
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Conformacion	TP	
35	15:31	15:45	Conformacion	TP	
36	15:46	16:00	Conformacion	TP	
37	16:01	16:15	Conformacion	TP	
38	16:16	16:30	Conformacion	TP	
39	16:31	16:45	Conformacion	TP	
40	16:46	17:00	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
41	17:01	17:15	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
42	17:16	17:30	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
43	17:31	17:45	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	25
TC	6
TNC	9

63%  
15%  
23%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	26/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0038 8

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Conformacion	TP	
4	7:46	8:00	Conformacion	TP	
5	8:01	8:15	Conformacion	TP	
6	8:16	8:30	Conformacion	TP	
7	8:31	8:45	Conformacion	TP	
8	8:46	9:00	Conformacion	TP	
9	9:01	9:15	Conformacion	TP	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Conformacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Lubricacion	TC	
15	10:31	10:45	Lubricacion	TC	
16	10:46	11:00	Lubricacion	TC	
17	11:01	11:15	Conformacion	TP	
18	11:16	11:30	Conformacion	TP	
19	11:31	11:45	Conformacion	TP	
20	11:46	12:00	Conformacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Conformacion	TP	
26	13:16	13:30	Conformacion	TP	
27	13:31	13:45	Conformacion	TP	
28	13:46	14:00	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
29	14:01	14:15	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
30	14:16	14:30	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
31	14:31	14:45	Conformacion	TP	
32	14:46	15:00	Conformacion	TP	
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Conformacion	TP	
35	15:31	15:45	Conformacion	TP	
36	15:46	16:00	Conformacion	TP	
37	16:01	16:15	Conformacion	TP	
38	16:16	16:30	Conformacion	TP	
39	16:31	16:45	Conformacion	TP	
40	16:46	17:00	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
41	17:01	17:15	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
42	17:16	17:30	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
43	17:31	17:45	Trabajo Rehecho	TNC	Retiro de Islas
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	25	63%
TC	6	15%
TNC	9	23%



<b>Fronte de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	26/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE44/A081 9,4

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Espera de Frente	TNC	Falta de Frente
4	7:46	8:00	Espera de Frente	TNC	Falta de Frente
5	8:01	8:15	Recibir Instrucciones	TC	
6	8:16	8:30	Recibir Instrucciones	TC	
7	8:31	8:45	Recibir Instrucciones	TC	
8	8:46	9:00	Compactacion	TP	
9	9:01	9:15	Compactacion	TP	
10	9:16	9:30	Compactacion	TP	
11	9:31	9:45	Compactacion	TP	
12	9:46	10:00	Compactacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Compactacion	TP	
15	10:31	10:45	Compactacion	TP	
16	10:46	11:00	Lubricacion	TC	
17	11:01	11:15	Compactacion	TP	
18	11:16	11:30	Compactacion	TP	
19	11:31	11:45	Compactacion	TP	
20	11:46	12:00	Compactacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Compactacion	TP	
26	13:16	13:30	Compactacion	TP	
27	13:31	13:45	Compactacion	TP	
28	13:46	14:00	Compactacion	TP	
29	14:01	14:15	Compactacion	TP	
30	14:16	14:30	Compactacion	TP	
31	14:31	14:45	Compactacion	TP	
32	14:46	15:00	Compactacion	TP	
33	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Compactacion	TP	
35	15:31	15:45	Compactacion	TP	
36	15:46	16:00	Compactacion	TP	
37	16:01	16:15	Compactacion	TP	
38	16:16	16:30	Compactacion	TP	
39	16:31	16:45	Compactacion	TP	
40	16:46	17:00	Compactacion	TP	
41	17:01	17:15	Compactacion	TP	
42	17:16	17:30	Desplazamiento a otra plataforma	TC	
43	17:31	17:45	Desplazamiento a otra plataforma	TC	
44	17:46	18:00	Desplazamiento a otra plataforma	TC	

TP	27
TC	9
TNC	4

68%  
23%  
10%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	26/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE44/A098 9,4

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Espera de Frente	TNC	Falta de Frente
4	7:46	8:00	Espera de Frente	TNC	Falta de Frente
5	8:01	8:15	Recibir Instrucciones	TC	
6	8:16	8:30	Recibir Instrucciones	TC	
7	8:31	8:45	Recibir Instrucciones	TC	
8	8:46	9:00	Compactacion	TP	
9	9:01	9:15	Compactacion	TP	
10	9:16	9:30	Compactacion	TP	
11	9:31	9:45	Compactacion	TP	
12	9:46	10:00	Compactacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Compactacion	TP	
15	10:31	10:45	Compactacion	TP	
16	10:46	11:00	Compactacion	TP	
17	11:01	11:15	Lubricacion	TC	
18	11:16	11:30	Compactacion	TP	
19	11:31	11:45	Compactacion	TP	
20	11:46	12:00	Compactacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Compactacion	TP	
26	13:16	13:30	Compactacion	TP	
27	13:31	13:45	Compactacion	TP	
28	13:46	14:00	Compactacion	TP	
29	14:01	14:15	Abastecimiento	TC	
30	14:16	14:30	Compactacion	TP	
31	14:31	14:45	Compactacion	TP	
32	14:46	15:00	Compactacion	TP	
33	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Recibir Instrucciones	TC	
35	15:31	15:45	Recibir Instrucciones	TC	
36	15:46	16:00	Recibir Instrucciones	TC	
37	16:01	16:15	Compactacion	TP	
38	16:16	16:30	Compactacion	TP	
39	16:31	16:45	Compactacion	TP	
40	16:46	17:00	Compactacion	TP	
41	17:01	17:15	Compactacion	TP	
42	17:16	17:30	Compactacion	TP	
43	17:31	17:45	Compactacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	25	63%
TC	11	28%
TNC	4	10%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	27/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0033 5,6

ITEiv	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Desplazamiento	TC	
4	7:46	8:00	Conformacion	TP	
5	8:01	8:15	Conformacion	TP	
6	8:16	8:30	Abastecimiento	TC	
7	8:31	8:45	Conformacion	TP	
8	8:46	9:00	Conformacion	TP	
9	9:01	9:15	Conformacion	TP	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
15	10:31	10:45	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
16	10:46	11:00	Conformacion	TP	
17	11:01	11:15	Conformacion	TP	
18	11:16	11:30	Conformacion	TP	
19	11:31	11:45	Conformacion	TP	
20	11:46	12:00	Conformacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
26	13:16	13:30	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
27	13:31	13:45	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
28	13:46	14:00	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
29	14:01	14:15	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
30	14:16	14:30	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
31	14:31	14:45	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
32	14:46	15:00	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
13	15:01	15:15	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
34	15:16	15:30	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
35	15:31	15:45	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
36	15:46	16:00	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
37	16:01	16:15	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
38	16:16	16:30	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
39	16:31	16:45	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
40	16:46	17:00	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
41	17:01	17:15	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
42	17:16	17:30	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
43	17:31	17:45	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO
44	17:46	18:00	Inoperatividad	TNC	NE RESUMEN DE ACEITE PO

TP	12	30%
TC	4	10%
TNC	24	60%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	27/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0035 9,2

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Conformacion	TP	
4	7:46	8:00	Conformacion	TP	
5	8:01	8:15	Conformacion	TP	
6	8:16	8:30	Conformacion	TP	
7	8:31	8:45	Abastecimiento	TC	
8	8:46	9:00	Conformacion	TP	
9	9:01	9:15	Conformacion	TP	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
15	10:31	10:45	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
16	10:46	11:00	Conformacion	TP	
17	11:01	11:15	Conformacion	TP	
18	11:16	11:30	Conformacion	TP	
19	11:31	11:45	Conformacion	TP	
20	11:46	12:00	Conformacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Instrucciones	TC	
26	13:16	13:30	Conformacion	TP	
27	13:31	13:45	Conformacion	TP	
28	13:46	14:00	Conformacion	TP	
29	14:01	14:15	Conformacion	TP	
30	14:16	14:30	Conformacion	TP	
31	14:31	14:45	Conformacion	TP	
32	14:46	15:00	Conformacion	TP	
33	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Conformacion	TP	
35	15:31	15:45	Conformacion	TP	
36	15:46	16:00	Conformacion	TP	
37	16:01	16:15	Conformacion	TP	
38	16:16	16:30	Conformacion	TP	
39	16:31	16:45	Conformacion	TP	
40	16:46	17:00	Conformacion	TP	
41	17:01	17:15	Conformacion	TP	
42	17:16	17:30	Conformacion	TP	
43	17:31	17:45	Conformacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	30	75%
TC	5	13%
TNC	5	13%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	27/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>	<b>HTRA</b>	
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0037 7,3

ITEiv	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Conformacion	TP	
4	7:46	8:00	Conformacion	TP	
5	8:01	8:15	Conformacion	TP	
6	8:16	8:30	Conformacion	TP	
7	8:31	8:45	Conformacion	TP	
8	8:46	9:00	Abastecimiento	TC	
9	9:01	9:15	Conformacion	TP	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
15	10:31	10:45	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
16	10:46	11:00	Conformacion	TP	
17	11:01	11:15	Conformacion	TP	
18	11:16	11:30	Conformacion	TP	
19	11:31	11:45	Conformacion	TP	
20	11:46	12:00	Conformacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Instrucciones	TC	
26	13:16	13:30	Conformacion	TP	
27	13:31	13:45	Conformacion	TP	
28	13:46	14:00	Conformacion	TP	
29	14:01	14:15	Conformacion	TP	
30	14:16	14:30	Conformacion	TP	
31	14:31	14:45	Conformacion	TP	
32	14:46	15:00	Conformacion	TP	
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Conformacion	TP	
35	15:31	15:45	Conformacion	TP	
36	15:46	16:00	Conformacion	TP	
37	16:01	16:15	Conformacion	TP	
38	16:16	16:30	Conformacion	TP	
39	16:31	16:45	Conformacion	TP	
40	16:46	17:00	Desplazamiento a otra Plataforma	TNC	
41	17:01	17:15	Desplazamiento a otra Plataforma	TNC	
42	17:16	17:30	Desplazamiento a otra Plataforma	TNC	
43	17:31	17:45	Desplazamiento a otra Plataforma	TNC	
44	17:46	18:00	Desplazamiento a otra Plataforma	TNC	

TP	26
TC	4
TNC	10

65%  
10%  
25%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	27/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0038 9,6

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Conformacion	TP	
4	7:46	8:00	Conformacion	TP	
5	8:01	8:15	Conformacion	TP	
6	8:16	8:30	Conformacion	TP	
7	8:31	8:45	Conformacion	TP	
8	8:46	9:00	Conformacion	TP	
9	9:01	9:15	Abastecimiento	TC	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
15	10:31	10:45	Espera de Frente	TNC	Descarga de Material
16	10:46	11:00	Conformacion	TP	
17	11:01	11:15	Conformacion	TP	
18	11:16	11:30	Conformacion	TP	
19	11:31	11:45	Conformacion	TP	
20	11:46	12:00	Conformacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Instrucciones	TC	
26	13:16	13:30	Conformacion	TP	
27	13:31	13:45	Conformacion	TP	
28	13:46	14:00	Conformacion	TP	
29	14:01	14:15	Conformacion	TP	
30	14:16	14:30	Conformacion	TP	
31	14:31	14:45	Conformacion	TP	
32	14:46	15:00	Conformacion	TP	
33	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Conformacion	TP	
35	15:31	15:45	Conformacion	TP	
36	15:46	16:00	Conformacion	TP	
37	16:01	16:15	Conformacion	TP	
38	16:16	16:30	Conformacion	TP	
39	16:31	16:45	Conformacion	TP	
40	16:46	17:00	Conformacion	TP	
41	17:01	17:15	Conformacion	TP	
42	17:16	17:30	Conformacion	TP	
43	17:31	17:45	Conformacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	30	75%
TC	5	13%
TNC	5	13%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	27/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE44/A081 9,2

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Espera de Frente	TNC	Espera de área
4	7:46	8:00	Espera de Frente	TNC	Espera de área
5	8:01	8:15	Compactacion	TP	
6	8:16	8:30	Compactacion	TP	
7	8:31	8:45	Compactacion	TP	
8	8:46	9:00	Compactacion	TP	
9	9:01	9:15	Compactacion	TP	
10	9:16	9:30	Abastecimiento	TC	
11	9:31	9:45	Compactacion	TP	
12	9:46	10:00	Compactacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Compactacion	TP	
15	10:31	10:45	Compactacion	TP	
16	10:46	11:00	Compactacion	TP	
17	11:01	11:15	Compactacion	TP	
18	11:16	11:30	Compactacion	TP	
19	11:31	11:45	Espera de Frente	TNC	
20	11:46	12:00	Espera de Frente	TNC	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Instrucciones	TC	
26	13:16	13:30	Compactacion	TP	
27	13:31	13:45	Compactacion	TP	
28	13:46	14:00	Compactacion	TP	
29	14:01	14:15	Compactacion	TP	
30	14:16	14:30	Compactacion	TP	
31	14:31	14:45	Compactacion	TP	
32	14:46	15:00	Compactacion	TP	
33	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Desplazamiento	TC	
35	15:31	15:45	Instrucciones	TC	
36	15:46	16:00	Compactacion	TP	
37	16:01	16:15	Compactacion	TP	
38	16:16	16:30	Compactacion	TP	
39	16:31	16:45	Compactacion	TP	
40	16:46	17:00	Compactacion	TP	
41	17:01	17:15	Compactacion	TP	
42	17:16	17:30	Compactacion	TP	
43	17:31	17:45	Compactacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	27
TC	7
TNC	6

68%  
18%  
15%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	28/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0033 1,3

ITEM	HORA		Descripción de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
2	7:16	7:30	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
3	7:31	7:45	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
4	7:46	8:00	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
5	8:01	8:15	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
6	8:16	8:30	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
7	8:31	8:45	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
8	8:46	9:00	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
9	9:01	9:15	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
10	9:16	9:30	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
11	9:31	9:45	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
12	9:46	10:00	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
13	10:01	10:15	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
14	10:16	10:30	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
15	10:31	10:45	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
16	10:46	11:00	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
17	11:01	11:15	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
18	11:16	11:30	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
19	11:31	11:45	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
20	11:46	12:00	Inperativo	TNC	ENE RESUMEN DE ACEITE POR
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Conformacion	TP	
26	13:16	13:30	Conformacion	TP	
27	13:31	13:45	Conformacion	TP	
28	13:46	14:00	Conformacion	TP	
29	14:01	14:15	Conformacion	TP	
30	14:16	14:30	Conformacion	TP	
31	14:31	14:45	Conformacion	TP	
32	14:46	15:00	Conformacion	TP	
33	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Conformacion	TP	
35	15:31	15:45	Conformacion	TP	
36	15:46	16:00	Conformacion	TP	
37	16:01	16:15	Conformacion	TP	
38	16:16	16:30	Conformacion	TP	
39	16:31	16:45	Conformacion	TP	
40	16:46	17:00	Conformacion	TP	
41	17:01	17:15	Conformacion	TP	
42	17:16	17:30	Conformacion	TP	
43	17:31	17:45	Conformacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	18	45%
TC	1	3%
TNC	21	53%



<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	28/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0035 5,4

ITEiv	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Conformacion	TP	
4	7:46	8:00	Conformacion	TP	
5	8:01	8:15	Conformacion	TP	
6	8:16	8:30	Lubricacion	TC	
7	8:31	8:45	Lubricacion	TC	
8	8:46	9:00	Lubricacion	TC	
9	9:01	9:15	Instrucciones	TC	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Conformacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Conformacion	TP	
15	10:31	10:45	Conformacion	TP	
16	10:46	11:00	Conformacion	TP	
17	11:01	11:15	Conformacion	TP	
18	11:16	11:30	Conformacion	TP	
19	11:31	11:45	Abastecimiento	TC	
20	11:46	12:00	Conformacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Desplazamiento	TC	
26	13:16	13:30	Desplazamiento	TC	
27	13:31	13:45	Desplazamiento	TC	
28	13:46	14:00	Conformacion	TP	
29	14:01	14:15	Conformacion	TP	
30	14:16	14:30	Conformacion	TP	
31	14:31	14:45	Conformacion	TP	
32	14:46	15:00	Conformacion	TP	
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Conformacion	TP	
35	15:31	15:45	Conformacion	TP	
36	15:46	16:00	Conformacion	TP	
37	16:01	16:15	Conformacion	TP	
38	16:16	16:30	Conformacion	TP	
39	16:31	16:45	Conformacion	TP	
40	16:46	17:00	Conformacion	TP	
41	17:01	17:15	Conformacion	TP	
42	17:16	17:30	Conformacion	TP	
43	17:31	17:45	Conformacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	27
TC	11
TNC	2

68%  
28%  
5%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	27/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE44/A098 9,4

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Espera de Frente	TNC	Espera de área
4	7:46	8:00	Espera de Frente	TNC	Espera de área
5	8:01	8:15	Compactacion	TP	
6	8:16	8:30	Compactacion	TP	
7	8:31	8:45	Compactacion	TP	
8	8:46	9:00	Compactacion	TP	
9	9:01	9:15	Compactacion	TP	
10	9:16	9:30	Compactacion	TP	
11	9:31	9:45	Abastecimiento	TC	
12	9:46	10:00	Compactacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Compactacion	TP	
15	10:31	10:45	Compactacion	TP	
16	10:46	11:00	Compactacion	TP	
17	11:01	11:15	Compactacion	TP	
18	11:16	11:30	Compactacion	TP	
19	11:31	11:45	Espera de Frente	TNC	
20	11:46	12:00	Espera de Frente	TNC	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Instrucciones	TC	
26	13:16	13:30	Compactacion	TP	
27	13:31	13:45	Compactacion	TP	
28	13:46	14:00	Compactacion	TP	
29	14:01	14:15	Compactacion	TP	
30	14:16	14:30	Compactacion	TP	
31	14:31	14:45	Compactacion	TP	
32	14:46	15:00	Compactacion	TP	
33	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Desplazamiento	TC	
35	15:31	15:45	Instrucciones	TC	
36	15:46	16:00	Compactacion	TP	
37	16:01	16:15	Compactacion	TP	
38	16:16	16:30	Compactacion	TP	
39	16:31	16:45	Compactacion	TP	
40	16:46	17:00	Compactacion	TP	
41	17:01	17:15	Compactacion	TP	
42	17:16	17:30	Compactacion	TP	
43	17:31	17:45	Compactacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	27	68%
TC	7	18%
TNC	6	15%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	28/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0039 9,6

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Conformacion	TP	
4	7:46	8:00	Conformacion	TP	
5	8:01	8:15	Conformacion	TP	
6	8:16	8:30	Conformacion	TP	
7	8:31	8:45	Conformacion	TP	
8	8:46	9:00	Conformacion	TP	
9	9:01	9:15	Conformacion	TP	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Conformacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Lubricacion	TC	
15	10:31	10:45	Lubricacion	TC	
16	10:46	11:00	Lubricacion	TC	
17	11:01	11:15	Instrucciones	TC	
18	11:16	11:30	Conformacion	TP	
19	11:31	11:45	Conformacion	TP	
20	11:46	12:00	Conformacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Abastecimiento	TC	
26	13:16	13:30	Desplazamiento	TC	
27	13:31	13:45	Desplazamiento	TC	
28	13:46	14:00	Desplazamiento	TC	
29	14:01	14:15	Conformacion	TP	
30	14:16	14:30	Conformacion	TP	
31	14:31	14:45	Conformacion	TP	
32	14:46	15:00	Conformacion	TP	
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Conformacion	TP	
35	15:31	15:45	Conformacion	TP	
36	15:46	16:00	Conformacion	TP	
37	16:01	16:15	Conformacion	TP	
38	16:16	16:30	Conformacion	TP	
39	16:31	16:45	Conformacion	TP	
40	16:46	17:00	Conformacion	TP	
41	17:01	17:15	Conformacion	TP	
42	17:16	17:30	Conformacion	TP	
43	17:31	17:45	Conformacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	27
TC	11
TNC	2

68%  
28%  
5%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	28/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>	<b>HTRA</b>	
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE32/0039 9,6

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Conformacion	TP	
4	7:46	8:00	Conformacion	TP	
5	8:01	8:15	Conformacion	TP	
6	8:16	8:30	Conformacion	TP	
7	8:31	8:45	Conformacion	TP	
8	8:46	9:00	Conformacion	TP	
9	9:01	9:15	Conformacion	TP	
10	9:16	9:30	Conformacion	TP	
11	9:31	9:45	Conformacion	TP	
12	9:46	10:00	Conformacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Lubricacion	TC	
15	10:31	10:45	Lubricacion	TC	
16	10:46	11:00	Lubricacion	TC	
17	11:01	11:15	Instrucciones	TC	
18	11:16	11:30	Conformacion	TP	
19	11:31	11:45	Conformacion	TP	
20	11:46	12:00	Conformacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Abastecimiento	TC	
26	13:16	13:30	Desplazamiento	TC	
27	13:31	13:45	Desplazamiento	TC	
28	13:46	14:00	Desplazamiento	TC	
29	14:01	14:15	Conformacion	TP	
30	14:16	14:30	Conformacion	TP	
31	14:31	14:45	Conformacion	TP	
32	14:46	15:00	Conformacion	TP	
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Conformacion	TP	
35	15:31	15:45	Conformacion	TP	
36	15:46	16:00	Conformacion	TP	
37	16:01	16:15	Conformacion	TP	
38	16:16	16:30	Conformacion	TP	
39	16:31	16:45	Conformacion	TP	
40	16:46	17:00	Conformacion	TP	
41	17:01	17:15	Conformacion	TP	
42	17:16	17:30	Conformacion	TP	
43	17:31	17:45	Conformacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	27
TC	11
TNC	2

68%  
28%  
5%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	28/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE44/A081 9,3

ITEM	HORA		Descripción de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Espera de Frente	TNC	
4	7:46	8:00	Espera de Frente	TNC	
5	8:01	8:15	Espera de Frente	TNC	
6	8:16	8:30	Espera de Frente	TNC	
7	8:31	8:45	Compactacion	TP	
8	8:46	9:00	Compactacion	TP	
9	9:01	9:15	Compactacion	TP	
10	9:16	9:30	Compactacion	TP	
11	9:31	9:45	Compactacion	TP	
12	9:46	10:00	Compactacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Compactacion	TP	
15	10:31	10:45	Compactacion	TP	
16	10:46	11:00	Compactacion	TP	
17	11:01	11:15	Compactacion	TP	
18	11:16	11:30	Compactacion	TP	
19	11:31	11:45	Compactacion	TP	
20	11:46	12:00	Compactacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Compactacion	TP	
26	13:16	13:30	Abastecimiento	TC	
27	13:31	13:45	Compactacion	TP	
28	13:46	14:00	Compactacion	TP	
29	14:01	14:15	Compactacion	TP	
30	14:16	14:30	Desplazamiento	TC	
31	14:31	14:45	Desplazamiento	TC	
32	14:46	15:00	Desplazamiento	TC	
13	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Compactacion	TP	
35	15:31	15:45	Compactacion	TP	
36	15:46	16:00	Compactacion	TP	
37	16:01	16:15	Compactacion	TP	
38	16:16	16:30	Compactacion	TP	
39	16:31	16:45	Compactacion	TP	
40	16:46	17:00	Compactacion	TP	
41	17:01	17:15	Compactacion	TP	
42	17:16	17:30	Compactacion	TP	
43	17:31	17:45	Compactacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	27
TC	7
TNC	6

68%  
18%  
15%

<b>Frente de Trabajo:</b>	<b>Actividad:</b>	<b>Fecha:</b>	28/11/2021
<b>Lider de Grupo:</b>	<b>Registrador:</b>		HTRA
<b>Operador:</b>	<b>Equipo:</b>	<b>Código:</b>	PE44/A098 8,5

ITEM	HORA		Descripcion de la Actividad	Trabajos	Observaciones
	Inicio	Final			
1	7:00	7:15	Charla de Inicio	TC	
2	7:16	7:30	Documentos SSOMA	TC	
3	7:31	7:45	Espera de Frente	TNC	
4	7:46	8:00	Espera de Frente	TNC	
5	8:01	8:15	Espera de Frente	TNC	
6	8:16	8:30	Espera de Frente	TNC	
7	8:31	8:45	Compactacion	TP	
8	8:46	9:00	Compactacion	TP	
9	9:01	9:15	Compactacion	TP	
10	9:16	9:30	Compactacion	TP	
11	9:31	9:45	Compactacion	TP	
12	9:46	10:00	Compactacion	TP	
13	10:01	10:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
14	10:16	10:30	Compactacion	TP	
15	10:31	10:45	Compactacion	TP	
16	10:46	11:00	Lubricacion	TC	
17	11:01	11:15	Compactacion	TP	
18	11:16	11:30	Compactacion	TP	
19	11:31	11:45	Compactacion	TP	
20	11:46	12:00	Compactacion	TP	
21	12:01	12:15	Almuerzo		
22	12:16	12:30	Almuerzo		
23	12:31	12:45	Almuerzo		
24	12:46	13:00	Almuerzo		
25	13:01	13:15	Compactacion	TP	
26	13:16	13:30	Compactacion	TP	
27	13:31	13:45	Compactacion	TP	
28	13:46	14:00	Compactacion	TP	
29	14:01	14:15	Compactacion	TP	
30	14:16	14:30	Desplazamiento	TC	
31	14:31	14:45	Desplazamiento	TC	
32	14:46	15:00	Desplazamiento	TC	
33	15:01	15:15	Descansos	TNC	Pausas Activas
34	15:16	15:30	Compactacion	TP	
35	15:31	15:45	Compactacion	TP	
36	15:46	16:00	Espera de Frente	TNC	
37	16:01	16:15	Espera de Frente	TNC	
38	16:16	16:30	Espera de Frente	TNC	
39	16:31	16:45	Compactacion	TP	
40	16:46	17:00	Compactacion	TP	
41	17:01	17:15	Compactacion	TP	
42	17:16	17:30	Compactacion	TP	
43	17:31	17:45	Compactacion	TP	
44	17:46	18:00	Inspeccion del Equipo	TC	

TP	24	60%
TC	7	18%
TNC	9	23%

## Anexo 2 Equipos

FECHA	CODIGO	TURNO	MODELO	PESO	HTRA	HTA	FRENTE 1					FRENTE 2					TOTALES	
							FRENTE	COTA	PROG INICIAL	PROG FIN	ANCHO	PRODUCCION	FRENTE	COTA	PROG INICIAL	PROG FIN		ANCHO
22/11/2021	PE32/0038	DIA	D9	50	10.2	0	BOFEDAL 2	4092.2	1+020	1+270	82							
22/11/2021	PE32/0033	DIA	D9	50	6.3	3.5	BOFEDAL 2	4092.2	1+020	1+270	82							
22/11/2021	PE32/0035	DIA	D9	50	1.4	0	BOFEDAL 2	4092.2	1+020	1+270	82							
22/11/2021	PE32/0037	DIA	D9	50	10.3	0	BOFEDAL 2	4092.2	1+020	1+270	82							
22/11/2021	PE32/0025	DIA	D8	40			BOFEDAL 2	4092.2	1+020	1+270	82	32,800.00						32,800.00
22/11/2021	PE44/0019	DIA	BOMAG20T	20	8	1	BOFEDAL 2	4092.2	1+020	1+270	82							
22/11/2021	PE44/0018	DIA	CAT 15 TN	15	10.5	0	BOFEDAL 2	4092.2	1+020	1+270	82							
22/11/2021	PE20/0025	DIA	CAT336D	35	0	0	BOFEDAL 2	4092.2	1+020	1+270	82							
22/11/2021	PE32/0039	DIA	D10	70	5.9	0	FERRO SUR	3959.8	2+762	2+807	20							
22/11/2021	PE44/A081	DIA	HAMM20T	20	9.6	0	FERRO SUR	3959.8	2+762	2+807	20	1,440.00						1,440.00
23/11/2021	PE32/0033	DIA	D9	50	8.2	1.8	BOFEDAL 1	4092.2	1+530	1+650	83							
23/11/2021	PE32/0037	DIA	D9	50	9.3	0.5	BOFEDAL 1	4092.2	1+530	1+650	83							
23/11/2021	PE32/0035	DIA	D9	50	0	10	BOFEDAL 1	4092.2	1+530	1+650	83							
23/11/2021	PE32/0023	DIA	D9	50	5.9	3.5	BOFEDAL 1	4092.2	1+530	1+650	83							
23/11/2021	PE32/0025	DIA	D8	40	5.5	0	BOFEDAL 1	4092.2	1+530	1+650	83	15,936.00						
23/11/2021	PE44/0017	DIA	CAT 15 TN	15	10.3	0	BOFEDAL 1	4092.2	1+530	1+650	83							
23/11/2021	PE44/0018	DIA	CAT 15 TN	15	9	1	BOFEDAL 1	4092.2	1+530	1+650	83							
23/11/2021	PE44/A098	DIA	HAMM20T	20	5	0	BOFEDAL 1	4092.2	1+530	1+650	83							
23/11/2021	PE20/0025	DIA	CAT336D	35	0	0	BOFEDAL 1	4092.2	1+530	1+650	83							
23/11/2021	PE32/0039	DIA	D10	70	5.8	0	FERRO SUR	3961.4	2+740	2+800	60							
23/11/2021	PE32/0016	DIA	D8	40	8.8	0	FERRO SUR	3961.4	2+740	2+800	60							
23/11/2021	PE44/A081	DIA	HAMM20T	20	9.2	0	FERRO SUR	3961.4	2+740	2+800	60	5,760.00						5,760.00
23/11/2021	PE20/0022	DIA	CAT336D	35	0	0	FERRO SUR	3961.4	2+740	2+800	60							
24/11/2021	PE32/0035	DIA	D9	50	0	10	EXO	4081	1+930	2+050	84							
24/11/2021	PE32/0033	DIA	D9	50	7.8	0	EXO	4081	1+930	2+050	84							
24/11/2021	PE44/A098	DIA	HAMM20T	20	8.2	0	EXO	4081	1+930	2+050	84	16,128.00						
24/11/2021	PE44/0017	DIA	CAT 15 TN	15	8.4	0	EXO	4081	1+930	2+050	84							
24/11/2021	PE20/0025	DIA	CAT336D	35	0	0	EXO	4081	1+930	2+050	84							
24/11/2021	PE32/0039	DIA	D10	70	8.3	1	FERRO SUR	3963	2+730	2+780	60							
24/11/2021	PE32/0037	DIA	D9	50	7.5	2	FERRO SUR	3963	2+730	2+780	60	4,800.00						4,800.00
24/11/2021	PE20/0022	DIA	CAT336D	35	0	0	FERRO SUR	3963	2+730	2+780	60							

FECHA	CODIGO	TURNO	MODELO	PESO	HTRA	HTA	FRENTE 1					FRENTE 2					TOTALES		
							FRENTE	COTA	PROG INICIAL	PROG FIN	ANCHO	PRODUCCION	FRENTE	COTA	PROG INICIAL	PROG FIN		ANCHO	PRODUCCION
25/11/2021	PE32/0025	DIA	D8	40	8.6	0	FERRO SUR	3943.8	2+930	3+050	70								
25/11/2021	PE32/0023	DIA	D9	50	9.5	0	FERRO SUR	3943.8	2+900	3+025	70								
25/11/2021	PE32/0033	DIA	D9	50	8	0	FERRO SUR	3943.8	2+900	3+025	70								
25/11/2021	PE32/0035	DIA	D9	50	10.5	0	FERRO SUR	3943.8	2+900	3+025	70								
25/11/2021	PE32/0037	DIA	D9	50	9.7	0	FERRO SUR	3943.8	2+900	3+025	70								
25/11/2021	PE32/0038	DIA	D9	50	7.6	0	FERRO SUR	3943.8	2+900	3+025	70								
25/11/2021	PE32/0039	DIA	D10	70	4.5	0	FERRO SUR	3943.8	2+900	3+025	70								
25/11/2021	PE44/A081	DIA	HAMM20T	20	8.9	0	FERRO SUR	3943.8	2+900	3+025	70								
25/11/2021	PE44/A098	DIA	HAMM20T	20	9.5	0	FERRO SUR	3943.8	2+900	3+025	70								
25/11/2021	PE20/0022	DIA	CAT336D	35	0	0	FERRO SUR	3943.8	2+900	3+025	70								
25/11/2021	PE32/0043	DIA	D9	50	9.7	0	EXO	4081	2+020	2+060	50								
25/11/2021	PE44/0017	DIA	CAT 15 TN	15	8.6	0	EXO	4081	2+020	2+060	50								3,200.00
25/11/2021	PE20/0025	DIA	CAT336D	35	0	0	EXO	4081	2+020	2+060	50								
26/11/2021	PE32/0033	DIA	D9	50	5	5	FERRO NORTE	3943.8	3+300	3+600	88								
26/11/2021	PE32/0035	DIA	D9	50	9.4	0	FERRO NORTE	3943.8	3+300	3+600	88								
26/11/2021	PE32/0037	DIA	D9	50	6.9	0	FERRO NORTE	3943.8	3+300	3+600	88								
26/11/2021	PE32/0038	DIA	D9	50	8	0	FERRO NORTE	3943.8	3+300	3+600	88								
26/11/2021	PE32/0039	DIA	D10	70	7.4	0	FERRO NORTE	3943.8	3+300	3+600	88								
26/11/2021	PE32/0043	DIA	D9	50	8.8	0	FERRO NORTE	3943.8	3+300	3+600	88								
26/11/2021	PE44/A081	DIA	HAMM20T	20	9.4	0	FERRO NORTE	3943.8	3+300	3+600	88								
26/11/2021	PE44/A098	DIA	HAMM20T	20	9.4	0	FERRO NORTE	3943.8	3+300	3+600	88								
26/11/2021	PE20/0022	DIA	CAT336D	35	0	0	FERRO NORTE	3943.8	3+300	3+600	88								
27/11/2021	PE32/0025	DIA	D8	40	6	0	FERRO NORTE	3943.8	3+050	3+240	88								
27/11/2021	PE32/0033	DIA	D9	50	5.6	4.4	FERRO NORTE	3943.8	3+050	3+240	88								
27/11/2021	PE32/0035	DIA	D9	50	9.2	0	FERRO NORTE	3943.8	3+050	3+240	88								
27/11/2021	PE32/0037	DIA	D9	50	7.3	0	FERRO NORTE	3943.8	3+050	3+240	88								
27/11/2021	PE32/0038	DIA	D9	50	9.6	0	FERRO NORTE	3943.8	3+050	3+240	88								
27/11/2021	PE32/0039	DIA	D10	70	7.9	0	FERRO NORTE	3943.8	3+050	3+240	88								
27/11/2021	PE32/0043	DIA	D9	50	9.2	0.8	FERRO NORTE	3943.8	3+050	3+240	88								
27/11/2021	PE44/A081	DIA	HAMM20T	20	9.2	0	FERRO NORTE	3943.8	3+050	3+240	88								
27/11/2021	PE44/A098	DIA	HAMM20T	20	9.4	0	FERRO NORTE	3943.8	3+050	3+240	88								
28/11/2021	PE32/0033	DIA	D9	50	1.3	6	FERRO SUR	3966.2	2+750	2+804	70								
28/11/2021	PE32/0035	DIA	D9	50	5.4	0	FERRO SUR	3966.2	2+750	2+804	70								
28/11/2021	PE32/0037	DIA	D9	50	4.9	5.1	FERRO SUR	3966.2	2+750	2+804	70								
28/11/2021	PE32/0039	DIA	D10	70	6	0	FERRO SUR	3966.2	2+750	2+804	70								
28/11/2021	PE44/A081	DIA	HAMM20T	20	9.3	0	FERRO SUR	3966.2	2+750	2+804	70								
28/11/2021	PE44/A098	DIA	HAMM20T	20	8.5	0	FERRO SUR	3966.2	2+750	2+804	70								
28/11/2021	PE32/0038	DIA	D9	50	5.5	0	BOFEDAL 3	4093.8	0+590	0+645	87								
28/11/2021	PE32/0016	DIA	D8	40	4.3	0	BOFEDAL 3	4093.8	0+590	0+645	87								
28/11/2021	PE32/0043	DIA	D9	50	5.7	0	BOFEDAL 3	4093.8	0+590	0+645	87								
28/11/2021	PE44/0017	DIA	CAT 15 TN	15	4.1	0	BOFEDAL 3	4093.8	0+590	0+645	87								



### Anexo 3 Análisis de restricciones

ITEM	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	AREA	ACCIONES CORRECTIVAS Y COMPROMISOS	ESTADO	N° RE-PROG	Inicio	Fin
<b>X SEGURIDAD</b>								
	Pulsera para conductores	Edgar Curo/Walter Anticona	SSOMA	11.03. Se debe solicitar el pulsera para el control de fatiga y somnolencia,	Atrasado	2	20-Feb	15-Mar
	Protección atmosférica	Edgar Curo/Walter Anticona	SSOMA	11.03. Se tiene vencido los certificados de PA en las áreas del proyecto. Se hará el recorrido con LCE	Atrasado	2	20-Feb	15-Mar
	Implementación de aros salvavidas	Edgar Curo/Walter Anticona	SSOMA	10.04. Programar cursos (30 per. Min 15), revisar el suministro	A tiempo		10-Abr	17-Abr
<b>X MEDIO AMBIENTE</b>								
	Monitoreo de la Presa de Relaves	Juan Carrazco	Medio Ambiente	20.02 Se debe programar la subida del técnico, 11.03. Programado para May22	Atrasado	1	7-Ene	15-Mar
	Protector de bidones (gasolina)	Juan Carrazco	Medio Ambiente	10.04. Se debe implementar los protectores para los bidones	A tiempo		7-Ene	17-Abr
<b>X PRODUCCIÓN - MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>								
	Acopio de 1B	Eduar Luzon / Marco Gonzales	PRODUCCIÓN	20.02. Se colocará el tractor D6T para el acopio, de manera interdiaria con operador. 03.03. Se viene apoyando	Cerrado		20-Feb	10-Mar
	Arena curb	Eduar Luzon / Marco Gonzales	PRODUCCIÓN	07.03 La arena viene con muchas piedras. GO solicita que se conee	Cerrado		20-Feb	10-Mar
	Desmovilización de volquetes	Eduar Luzon / Marco Gonzales	PRODUCCIÓN	03.03. Se revisará mañana el listado para desmovilizar 5 volquetes. 07.03. se fueron 5 volquetes, RRHH tendrá la lista, enviara el 08.03 10.03. EQ solicita la entrega el 12.03	Cerrado		20-Feb	10-Mar
	Accesos	Eduar Luzon / Marco Gonzales	PRODUCCIÓN	07.03. Desbroce en el sector del canal, replanteo de plataforma, acceso auxiliar Bravo,	Cerrado		20-Feb	10-Mar
	Labores iniciar tarde ( media hora tarde)	Eduar Luzon / Marco Gonzales	PRODUCCIÓN	20.02 Por la extensión del proyecto, no se logra firmar los documentos de gestión a tiempo. Se ha previsto incrementar los supervisores para asegurar la firma a tiempo.	Cerrado		20-Feb	1-Mar
	Se viene trabajando los sectores no definidos Poco control de avance diario	Eduar Luzon / Marco Gonzales	PRODUCCIÓN	20.02. Se realizará una adecuada sectorización	Permanente		20-Feb	TBD
	Se viene realizando trabajos en sectores pequeños, lo cual dificulta los trabajos de los equipos. Principalmente de la motoniveladora	Eduar Luzon / Marco Gonzales	PRODUCCIÓN	20.02. Se tendrá longitudes mínimas de 12 metros lineales	A tiempo		10-Abr	1-Mar
	Se quita tiempo en abastecimiento de combustible	Eduar Luzon / Marco Gonzales	PRODUCCIÓN	20.02. Se dará otro horario para el abastecimiento de los principales equipos (tractores, rodillos y motoniveladora)	A tiempo		10-Abr	1-Mar
<b>X PRODUCCIÓN - GEOTECNIA</b>								
	Perforadora	Jhon Rosario	GEOTECNIA	20.02. Se tiene previsto su ingreso el 23.02. 11.03. Se debe retomar los trabajos de perforación en el HR	A tiempo	1	7-Ene	17-Abr
	Apoyo de excavadora para formar plataformas en el Ferrono Norte	Jhon Rosario	GEOTECNIA	10.04. Se dispondrá de la exc para mañana a las 3pm	A tiempo		10-Abr	17-Abr
	Se solicita el área que ocupa GEOTEC para los trabajos de geotecnia	Jhon Rosario	GEOTECNIA	10.04. Se revisara con MMG	A tiempo		10-Abr	17-Abr
	Revisar con MMG las perforaciones adicionales ya que los trabajos contractuales han culminado	Jhon Rosario	GEOTECNIA	10.04. Solicitar a MMG los resultados y confirmar si hay adicionales	A tiempo		10-Abr	17-Abr
	Programación de voladura,	Jhon Rosario	GEOTECNIA	10.04. Se programa para el 03.07	A tiempo		10-Abr	17-Abr
	Programación de voladura	Jhon Rosario	GEOTECNIA	10.04. Se revisará el plan de voladura	A tiempo		10-Abr	17-Abr
	Solicita la reparación de cabezal de la perforadora	Jhon Rosario	GEOTECNIA	10.04 EQ indica que estara en 30 dias (31.07)	A tiempo		10-Abr	17-Abr
	Suministro de brocas	Jhon Rosario	GEOTECNIA	10.04 ADM entregará comentario sobre el nuevo proveedor (en 7 tendra respuesta)	A tiempo		10-Abr	17-Abr
<b>X PRODUCCIÓN - AGREGADOS Y CANTERAS (Centros Industriales)</b>								
	Reubicación de muro y accesos (grupos)	Cesar Morocho / Jacinto Rodriguez	PLANTA CHANCADORA	11.03. Reviar la programación 10.04. No se moverá el muro pero se debe conformar los accesos	A tiempo	2	7-Ene	17-Abr
	Falla del grupo 31	Cesar Morocho / Jacinto Rodriguez	PLANTA CHANCADORA	10.04. EQ revisará la operatividad del equipo	A tiempo		10-Abr	17-Abr
	Solicitud de material de mina por O4,	Cesar Morocho / Jacinto Rodriguez	PLANTA CHANCADORA	10.04. Se debe documentar el menor suministro de material	A tiempo		10-Abr	17-Abr
	Parada de planta	Cesar Morocho / Jacinto Rodriguez	PLANTA CHANCADORA	10.04. Para el 13.07 y 14.07	A tiempo		10-Abr	17-Abr

X PRODUCCIÓN - OBRAS DE ARTE								
Fabricación de chute	Cresencio H./Jorge Galán	OBRAS DE ARTE	11.03. Se tiene pedido de fabricación de chute. 10.04. Reactivar la solicitud del pedido ante GP	A tiempo		7-Ene	8-Jun	
Personal para la cuadrilla del cur	Cresencio H./Jorge Galán	OBRAS DE ARTE	10.04. Se solicita el ingreso de 02 oficiales y 02 operarios ebido a la deserción del personal	A tiempo		7-Ene	8-Jun	
Rodillo bermero teniamos 3	Cresencio H./Jorge Galán	OBRAS DE ARTE	10.04. Rodillo 30, alquilada, solo se tiene 07, la 29 esta en el grifo. El rodillo naranja no esta activo por falata de tapa	A tiempo		7-Ene	8-Jun	
Inventario de arnes y linea de vida	Cresencio H./Jorge Galán	OBRAS DE ARTE	10.04. Se revisara en almacen	A tiempo		7-Ene	8-Jun	
X PRODUCCIÓN - PLANTA DE CONCRETO								
Instalación de silo	Jorge Mansilla/Walter Untiveros	PLANTA DE CONCRETO	20.02. Ya se tiene la ubivcación del SILO, se enviará a Lima para el diseño de las cimentaciones, se entrega cronograma de montaje para el 10.03, 11.03. En stand by por MMG	A tiempo		7-Ene	10-Ene	
X INGENIERIA Y TOPOGRAFIA								
Implementación del turno noche, bateria para el equipo	Ruben Llanos	TOPOGRAFIA	10.04. Revisar la disponibilidad y/o suministro de las baterias	A tiempo		10-Abr	8-Jun	
Certificación de equipos	Ruben Llanos	TOPOGRAFIA	10.04. Revisar la disponibilidad y/o suministro de las baterias	A tiempo		10-Abr	8-Jun	
GPS para tractores, pavimentadora, motoniveladora	Ruben Llanos	TOPOGRAFIA	10.04. Revisar pagos del proveedor	A tiempo		10-Abr	8-Jun	
Baterias deficientes en la cuadrilla del curb	Ruben Llanos	TOPOGRAFIA	10.04. Se solicitará el envio de las baterías nuevas	A tiempo		10-Abr	8-Jun	
X OFCINA TÉCNICA								
	Jack Beraun	OFCINA TECNICA						
X ADMINISTRACION								
Certificacion de dron (02 und)	Juan Suarez	ADMINISTRACION	10.04. Revisar en almacen los drones	A tiempo		10-Abr	8-Jun	
X RR HH								
Publicar planillón de las horas todos los miércoles	Sual Cotarate/Beatriz L	RRHH	11.03. Se solicita la programación 10.04. Se debe retomar la publicacion	A tiempo		7-Ene	8-Jun	
ingerso de 10 volquetes	Sual Cotarate/Beatriz L	RRHH	10.04. Para el requerimiento de volquetes se solicita 30 operadores	A tiempo		10-Abr	8-Jun	
X CONTROL DE CALIDAD								
Revisión de los diseños de concreto	Guillermo Herrera / Juan Rios	CONTROL DE CALIDAD	20.02. Se ingresó a ACONEX, se tendra para la proxima semana la revisión con la supervisión	Cerrado		7-Ene	14-Ene	
Dossier de calidad ET4	Guillermo Herrera / Juan Rios	CONTROL DE CALIDAD	20.02. Se debe entregar el Dossier el 30.03 11.03. Se presentará el 13.04, el saldo 10.04. Se debe presentar el Dossier el 15.07.22	A tiempo	3	7-Ene	15-Jul	
X MANTENIMIENTO - EQUIPOS								
Implementar radio base en los equipos de linea amarilla	Ismael Vera / Edw ard V.	EQUIPOS	10.04. EQ enviara el estatus.	A tiempo		10-Abr	1-Jun	
X GERENCIA								
Revisión de radios incautadas	Miguel Pastor	GERENCIA						

### Anexo 4 Porcentaje de Plan Cumplido Pre Test

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO										
Item	Codigo de Actividad (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/Actual	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
						60%	YES	NO		
<b>PLINTO</b>										
1	PR.CRE.54	Suministro y colocación de concreto de 32 MPa para plinto	Plan	m3	41.43					
			Actual		45.00	x				
2	PR.CRE.56	Armaduras de refuerzo	Plan	m3	5,036.39					
			Actual		5,500.00	x				
3	PR.CRE.58	Barras de anclaje	Plan	m3	1,396.30					
			Actual		1,400.00	x				
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
4	PR.CPM.345	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226)	Plan	m3	263,040.00					
			Actual		208,760.42		X	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega	LOB4 incrementará el ingreso de CM
5	PR.CPM.39	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645)	Plan	m3	103,509.33					
			Actual		78,285.16		X	SCH	Incorrecta Programación de MEP	MEP reprogramará la actividad de acuerdo a terreno
N° Activities Planned					5					
N° Activities Completed					3					
% Completado					60%					
CANT	COD	AUSAS DE INCUMPLIMIENTO (C)								
1	SCH	Programación Incorrecta								
0	LOG	Logística/Procura								
0	EQU	Equipos								
0	ADM	Administración								
0	SBC	Subcontratistas								
0	HSEC	Seguridad								
0	QA/QC	Calidad								
0	WTH	Clima								
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente								
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente								
1	CLI-MAT	Materiales Cliente								
0	CLI-LIB	Liberación Cliente								
2										

**Causas de Incumplimiento Acum (%)**


Causa	Porcentaje
CLI-MAT	43%
SCH	29%
EQU	13%
CLI-LIB	5%
WTH	2%
HSEC	1%
ADM	0%
SBC	0%
LOG	0%
CLI-ENG	0%
CLI-PRI	0%

Semana	Acumulado	Acum %
SCH	16	29%
LOG	0	0%
EQU	7	13%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	2%
QA/QC	0	0%
WTH	5	9%
CLI-ENG	0	0%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	24	43%
CLI-LIB	3	5%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>

## PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO

Item	Código de Actividad (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/Ac tual	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (C)	ACCIONES CORRECTIVAS
						50%				
						YES	NO	CI		
<b>PLINTO</b>										
1	PR.CRE.54	Suministro y colocación de concreto de 32 MPa para plinto	Plan	m3	72.50					
			Actual		30.00		x	WTH	Alerta Amarilla para el segundo vaciado de concreto	MEP programará los vaciados antes de las 11:00 am para evitar alertas
2	PR.CRE.56	Armaduras de refuerzo	Plan	m3	5,036.39					
			Actual		5,100.00		x			
3	PR.CRE.58	Barras de anclaje	Plan	m3	1,396.30					
			Actual		1,500.00		x			
4	PR.CRE.58	Junta de construcción para plinto	Plan	m3	1,396.30					
			Actual		1,400.00		x			
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
5	PR.CPM.345	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226)	Plan	m3	263,040.00					
			Actual		191,363.72		x	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega	LOB4 incrementará el ingreso de CM
6	PR.CPM.39	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645)	Plan	m3	103,509.33					
			Actual		60,888.46		x	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega	LOB4 incrementará el ingreso de CM
N° Activities Planned						6				
N° Activities Completed						3				
% Completado						50%				
<b>CANT</b>	<b>COD</b>	<b>AUSAS DE INCUMPLIMIENTO (C)</b>								
0	SCH	Programación Incorrecta								
0	LOG	Logística/Procura								
0	EQU	Equipos								
0	ADM	Administración								
0	SBC	Subcontratistas								
0	HSEC	Seguridad								
0	QA/QC	Calidad								
1	WTH	Clima								
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente								
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente								
2	CLI-MAT	Materiales Cliente								
0	CLI-LIB	Liberación Cliente								

Causas de Incumplimiento Acum (%)




Semana	Acumulado	Acum %
SCH	15	26%
LOG	0	0%
EQU	7	12%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	2%
QA/QC	0	0%
WTH	6	10%
CLI-ENG	0	0%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	26	45%
CLI-LIB	3	5%
<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>100%</b>

## PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO

Item	Codigo de Actividad (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/Actual	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
						60%				
						YES	NO	CI		
<b>PLINTO</b>										
1	PR.CRE.54	Suministro y colocación de concreto de 32 MPa para plinto	Plan	m3	41.43					
			Actual		45.00	x				
2	PR.CRE.56	Armaduras de refuerzo	Plan	m3	5,036.39					
			Actual		5,500.00	x				
3	PR.CRE.58	Barras de anclaje	Plan	m3	1,396.30					
			Actual		1,400.00	x				
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
4	PR.CPM.34S	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226)	Plan	m3	263,040.00					
			Actual		208,760.42		X	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega	LOB4 incrementará el ingreso de CM
5	PR.CPM.39	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645)	Plan	m3	103,509.33					
			Actual		78,285.16		X	SCH	Incorrecta Programación de MEP	MEP reprogramará la actividad de acuerdo a terreno

N° Activities Planned	5
N° Activities Completed	3
% Completado	60%

CANT	COD	AUSAS DE INCUMPLIMIENTO (C)
1	SCH	Programación Incorrecta
0	LOG	Logística/Procura
0	EQU	Equipos
0	ADM	Administración
0	SBC	Subcontratistas
0	HSEC	Seguridad
0	QA/QC	Calidad
0	WTH	Clima
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente
1	CLI-MAT	Materiales Cliente
0	CLI-LIB	Liberación Cliente
2		

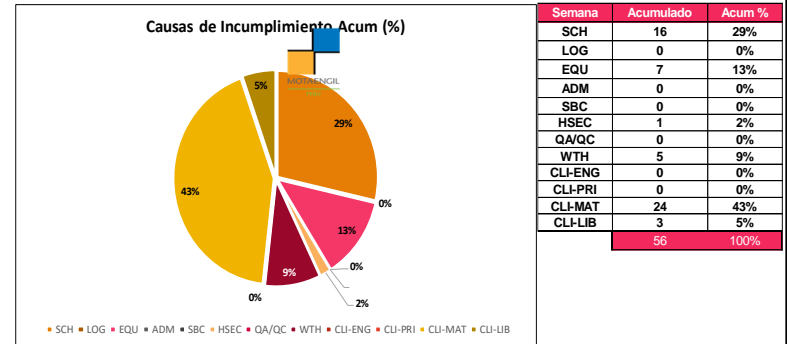

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO										
Item	Codigo de Actividad (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/A ctual	Unida d	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
						50%	YES	NO		
<b>PLINTO</b>										
1	PR.PL.8	Suministro y colocación de concreto de 32 MPa para plinto	Plan	m3	41.43					
			Actual		35.00		X	WTH	Alerta Amarilla para el vaciado de concreto - Se programó el vaciado para el medio día	MEP programará los vaciados antes de las 11:00 am para evitar alertas
2	PR.PL.8	Barras de anclaje	Plan	m3	598.52					
			Actual		600.00	X				
3	PR.PL.8	Perforación de pozos para inyecciones	Plan	m	190.31					
			Actual		230.00	X				
4	PR.PL.8	Perforación de pozos de verificación y exploración	Plan	m	8.11					
			Actual		10.00	X				
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
5	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobomba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226)	Plan	m3	263,040.00					
			Actual		184,128.00		X	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega	LOB4 incrementará el ingreso de CM
6	PR.CPM.39	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645)	Plan	m3	103,509.33					
			Actual		86,983.51		X	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega	LOB4 incrementará el ingreso de CM
N° Activities Planned						6				
N° Activities Completed						3				
% Completado						50%				
CANT	COD	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)								
0	SCH	Programación Incorrecta								
0	LOG	Logística/Procura								
0	EQU	Equipos								
0	ADM	Administración								
0	SBC	Subcontratistas								
0	HSEC	Seguridad								
0	QA/QC	Calidad								
1	WTH	Clima								
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente								
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente								
2	CLI-MAT	Materiales Cliente								
0	CLI-LIB	Liberación Cliente								
3										



Semana	Acumulado	Acum %
SCH	15	25%
LOG	0	0%
EQU	7	11%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	2%
QA/QC	0	0%
WTH	7	11%
CLI-ENG	0	0%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	28	46%
CLI-LIB	3	5%
	61	100%


### PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO

Item	Codigo de Actividad (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/ Actual Und	Cantidad	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
					50%				
					YES	NO	CI		
<b>PLINTO</b>									
1	PR.PL.88	Ensayos con agua a presión	Plan H	17.50					
			Actual	50.00	x				
2	PR.PL.89	Inyección de lechada	Plan kg	6,544.01					
			Actual	7,000.00	x				
3	PR.PL.86	Perforación de pozos para inyecciones	Plan m	444.05					
			Actual	550.00	x				
4	PR.PL.87	Perforación de pozos de verificación y exploración	Plan m	18.91					
			Actual	5.00		x	EQU	Fallas en el EQ de perforación	Se reprograma la actividad
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>									
5	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226)	Plan m3	263,040.00					
			Actual	184,128.00		x	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega	LOB4 incrementará el ingreso de CM
6	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - boreados de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645)	Plan m3	103,509.33					
			Actual	86,983.51		x	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega	LOB4 incrementará el ingreso de CM

N° Activities Planned	6
N° Activities Completed	3
% Completado	50%

CANT	COD	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)
0	SCH	Programación Incorrecta
0	LOG	Logística/Procura
1	EQU	Equipos
0	ADM	Administración
0	SBC	Subcontratistas
0	HSEC	Seguridad
0	QA/QC	Calidad
0	WTH	Clima
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente
2	CLI-MAT	Materiales Cliente
0	CLI-LIB	Liberación Cliente

Causas de Incumplimiento Acum (%)

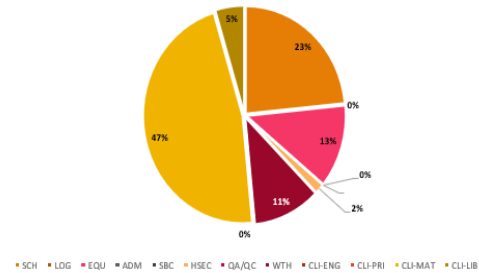

Semana	Acumulado	Acum %
SCH	15	23%
LOG	0	0%
EQU	8	13%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	2%
QA/QC	0	0%
WTH	7	11%
CLI-ENG	0	0%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	30	47%
CLI-LIB	3	5%
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO										
Item	Codigo de Actividad (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/A ctual	Unida d	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
						50%	YES	NO		
<b>PLINTO</b>										
1	PR.PL.8	Suministro y colocación de concreto de 32 MPa para plinto	Plan	m3	41.43					
			Actual		35.00		X	WTH	Alerta Amarilla para el vaciado de concreto - Se programó el vaciado para el medio día	MEP programará los vaciados antes de las 11:00 am para evitar alertas
2	PR.PL.8	Barras de anclaje	Plan	m3	598.52					
			Actual		600.00	X				
3	PR.PL.8	Perforación de pozos para inyecciones	Plan	m	190.31					
			Actual		230.00	X				
4	PR.PL.8	Perforación de pozos de verificación y exploración	Plan	m	8.11					
			Actual		10.00	X				
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
5	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobomba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226)	Plan	m3	263,040.00					
			Actual		184,128.00		X	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega	LOB4 incrementará el ingreso de CM
6	PR.CPM.39	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645)	Plan	m3	103,509.33					
			Actual		86,983.51		X	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega	LOB4 incrementará el ingreso de CM
N° Activities Planned						6				
N° Activities Completed						3				
% Completado						50%				
CANT	COD	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)								
0	SCH	Programación Incorrecta								
0	LOG	Logística/Procura								
0	EQU	Equipos								
0	ADM	Administración								
0	SBC	Subcontratistas								
0	HSEC	Seguridad								
0	QA/QC	Calidad								
1	WTH	Clima								
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente								
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente								
2	CLI-MAT	Materiales Cliente								
0	CLI-LIB	Liberación Cliente								
3										

Semana	Acumulado	Acum %
SCH	15	25%
LOG	0	0%
EQU	7	11%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	2%
QA/QC	0	0%
WTH	7	11%
CLI-ENG	0	0%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	28	46%
CLI-LIB	3	5%
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>




### PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO

Item	Codigo de Actividad (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/Actual	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
						43%	YES	NO		
<b>CONCRETOS</b>										
1	PR.PL.83	Suministro y colocación de concreto de 32 MPa para plinto	Plan Actual	m3	20.00 25.00		x			
<b>PLINTO</b>										
2	PR.PL.88	Ensayos con agua a presión	Plan Actual	H	30.50 50.00		x			
3	PR.PL.89	Inyección de lechada	Plan Actual	kg	11,453.10 12,000.00		x			
4	PR.PL.86	Perforación de pozos para inyecciones	Plan Actual	m	444.05 -			x	SCH	Interferencia con trabajos de concreto
5	PR.PL.87	Perforación de pozos de verificación y exploración	Plan Actual	m	18.91 -			x	SCH	Interferencia con trabajos de concreto
6	PR.CPM.34	Área de trazado y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226)	Plan Actual	m3	263,040.00 202,540.80			x	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega
7	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645)	Plan Actual	m3	103,509.33 85,563.51			x	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega

N° Activities Planned	7
N° Activities Completed	3
% Completado	43%

CANT	COD	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)
2	SCH	Programación Incorrecta
0	LOG	Logística/Procura
0	EQU	Equipos
0	ADM	Administración
0	SBC	Subcontratistas
0	HSEC	Seguridad
0	QA/QC	Calidad
0	WTH	Clima
0	CLLENG	Ingeniería Cliente
0	CLIPRI	Prioridades Cliente
2	CLIMAT	Materiales Cliente
0	CLILIB	Liberación Cliente

Causas de Incumplimiento Acum (%)

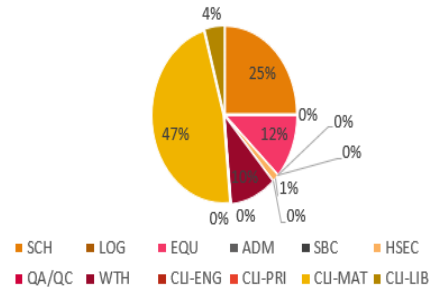

Semana	Acumulado	Acum %
SCH	17	25%
LOG	0	0%
EQU	8	12%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	1%
QA/QC	0	0%
WTH	7	10%
CLI-ENG	0	0%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	32	47%
CLI-LIB	3	4%
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>

**PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO**

Item	Codigo de Actividad (Act.k)	Descripción de la actividad	Plan/Actual	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (C)	ACCIONES CORRECTIVAS
						29%				
						YES	NO	CI		
<b>CONCRETOS</b>										
1	PR.PL.8	Suministro y colocación de concreto de 15 Mpa solado para plinto	Plan	m3	20.00					
			Actual		25.00	x				
<b>PLINTO</b>										
2	PR.PL.8	Ensayos con agua a presión	Plan	H	30.50					
			Actual		-	x	CLI-LIB	Conflicto Social entre MLB y las Comunidades	MEP a espera de indicaciones por parte de MLB para reinicio de actividades	
3	PR.PL.8	Inyección de lechada	Plan	kg	11,453.10					
			Actual		12,000.00	x				
4	PR.PL.8	Perforación de pozos para inyecciones	Plan	m	444.05					
			Actual		-	x	CLI-LIB	Conflicto Social entre MLB y las Comunidades	MEP a espera de indicaciones por parte de MLB para reinicio de actividades	
5	PR.PL.8	Perforación de pozos de verificación y exploración	Plan	m	18.91					
			Actual		-	x	CLI-LIB	Conflicto Social entre MLB y las Comunidades	MEP a espera de indicaciones por parte de MLB para reinicio de actividades	
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
6	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226)	Plan	m3	263,040.00					
			Actual			x	CLI-LIB	Conflicto Social entre MLB y las Comunidades	MEP a espera de indicaciones por parte de MLB para reinicio de actividades	
7	PR.CPM.3	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645)	Plan	m3	103,509.33					
			Actual			x	CLI-LIB	Conflicto Social entre MLB y las Comunidades	MEP a espera de indicaciones por parte de MLB para reinicio de actividades	

N° Activities Planned	7
N° Activities Completed	2
% Completado	29%

CANT	COD	AUSAS DE INCUMPLIMIENTO (C)
0	SCH	Programación Incorrecta
0	LOG	Logística/Procura
0	EQU	Equipos
0	ADM	Administración
0	SBC	Subcontratistas
0	HSEC	Seguridad
0	QA/QC	Calidad
0	WTH	Clima
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente
0	CLI-MAT	Materiales Cliente
5	CLI-LIB	Liberación Cliente
5		

Causas de Incumplimiento Acum (%)


Semana	Acumulado	Acum %
SCH	17	23%
LOG	0	0%
EQU	8	11%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	1%
QA/QC	0	0%
WTH	7	10%
CLI-ENG	0	0%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	32	44%
CLI-LIB	8	11%
	13	100%

**PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO**

Item	Codigo de Actividad (Act.IG)	Descripción de la actividad	Plan/Actual	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
						57%	YES	NO		
<b>CONCRETOS</b>										
1	PR.PL.8	Suministro y colocación de concreto de 15 Mpa solado para plinto	Plan	m3	20.00					
			Actual		25.00	x				
<b>PLINTO</b>										
2	PR.PL.8	Ensayos con agua a presión	Plan	H	30.50					
			Actual		35.00	x				
3	PR.PL.8	Inyección de lechada	Plan	kg	11,453.10					
			Actual		12,000.00	x				
4	PR.PL.8	Perforación de pozos para inyecciones	Plan	m	444.05					
			Actual		500.00	x				
5	PR.PL.8	Perforación de pozos de verificación y exploración	Plan	m	18.91					
			Actual		-	x	CLI-LIE	Conflicto Social entre MLB y las Comunidades	MEP a espera de indicaciones por parte de MLB para reinicio de actividades	
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
6	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de F	Plan	m3	263,040.00					
			Actual			x	CLI-LIE	Conflicto Social entre MLB y las Comunidades	MEP a espera de indicaciones por parte de MLB para reinicio de actividades	
7	PR.CPM.3	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Func	Plan	m3	103,509.33					
			Actual			x	CLI-LIE	Conflicto Social entre MLB y las Comunidades	MEP a espera de indicaciones por parte de MLB para reinicio de actividades	

N° Activities Planned	7
N° Activities Completed	4
% Completado	##

CANT	COD	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
0	SCH	Programación Incorrecta
0	LOG	Logística/Procura
0	EQU	Equipos
0	ADM	Administración
0	SBC	Subcontratistas
0	HSEC	Seguridad
0	QA/QC	Calidad
0	WTH	Clima
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente
0	CLI-MAT	Materiales Cliente
3	CLI-LIB	Liberación Cliente
3		




Semana	Acumulado	Acum %
SCH	17	22%
LOG	0	0%
EQU	8	10%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	1%
QA/QC	0	0%
WTH	7	9%
CLI-ENG	0	0%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	32	42%
CLI-LIB	12	16%
	77	100%

**PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO**

Item	Codigo de Actividad (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/Actual	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (C)	ACCIONES CORRECTIVAS
						60%				
						YES	NO	CI		
<b>CONCRETOS</b>										
1	PR.PL.83	Suministro y colocación de concreto de 15 Mpa solado para plinto	Plan	m3	20.00					
			Actual		21.00	X				
<b>PLINTO</b>										
	PR.PL.88	Ensayos con agua a presión	Plan	H	30.50					
			Actual		-		X		Conflicto Social entre MLB y las Comunidades	MEP a espera de indicaciones por parte de MLB para reinicio de actividades
	PR.PL.89	Inyección de lechada	Plan	kg	11,453.10					
			Actual		-		X	CLI-LIB	Conflicto Social entre MLB y las Comunidades	MEP a espera de indicaciones por parte de MLB para reinicio de actividades
4	PR.PL.86	Perforación de pozos para inyecciones	Plan	m	444.05					
			Actual		450.00	X				
5	PR.PL.87	Perforación de pozos de verificación y exploración	Plan	m	18.91					
			Actual		20.00	X				
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
6	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de F	Plan	m3	263,040.00					
			Actual				X	CLI-LIB	Conflicto Social entre MLB y las Comunidades	MEP a espera de indicaciones por parte de MLB para reinicio de actividades
7	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Func	Plan	m3	103,509.33					
			Actual				X	CLI-LIB	Conflicto Social entre MLB y las Comunidades	MEP a espera de indicaciones por parte de MLB para reinicio de actividades

N° Activities Planned	5
N° Activities Completed	3
% Completado	60%

CANT	COD	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (C)
0	SCH	Programación Incorrecta
0	LOG	Logística/Procura
0	EQU	Equipos
0	ADM	Administración
0	SBC	Subcontratistas
0	HSEC	Seguridad
0	QA/QC	Calidad
0	WTH	Clima
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente
0	CLI-MAT	Materiales Cliente
3	CLI-LIB	Liberación Cliente



Semana	Acumulado	Acum.%
SCH	17	20%
LOG	0	0%
EQU	8	10%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	1%
QA/QC	0	0%
WTH	7	8%
CLI-ENG	0	0%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	32	39%
CLI-LIB	19	22%
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>100%</b>


### PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO

Item	Codigo de Actividad (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/Actual	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
						60%				
						YES	NO	CI		
<b>CONCRETOS</b>										
1	PR.PL.83	plinto	Plan	m3	20.00					
			Actual		25.00	x				
<b>PLINTO</b>										
4	PR.PL.86	Perforación de pozos para inyecciones	Plan	m	444.05					
			Actual		550.00	x				
5	PR.PL.87	Perforación de pozos de verificación y exploración	Plan	m	18.91					
			Actual		20.00	x				
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
6	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226)	Plan	m3	263,040.00					
			Actual		210,432.00		x	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega	LOB4 incrementará el ingreso de CM - MEP registrará el los DR las afectaciones
7	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Botedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645)	Plan	m3	103,509.33					
			Actual		72,456.53		x	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega	LOB4 incrementará el ingreso de CM - MEP registrará el los DR las afectaciones

N° Activities Planned	5
N° Activities Completed	3
% Completado	60%

CANT	COD	JSAS DE INCUMPLIMIENTO
0	SCH	Programación Incorrecta
0	LOG	Logística/Procura
0	EQU	Equipos
0	ADM	Administración
0	SBC	Subcontratistas
0	HSEC	Seguridad
0	QA/QC	Calidad
0	WTH	Clima
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente
2	CLI-MAT	Materiales Cliente
0	CLI-LIB	Liberación Cliente

Causas de Incumplimiento Acum (%)




Semana	Acumulado	Acum %
SCH	17	20%
LOG	0	0%
EQU	8	10%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	1%
QA/QC	0	0%
WTH	7	8%
CLI-ENG	0	0%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	36	43%
CLI-LIB	15	18%
<b>Total</b>	<b>84</b>	<b>100%</b>

**PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO**

Item	Codigo de Actividad (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/Actual	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
						60%				
						YES	NO	CI		
<b>CONCRETOS</b>										
1	PR.PL.83	Suministro y colocación de concreto de 15 Mpa solado para plinto	Plan	m3	15.00					
			Actual		15.00	x				
<b>PLINTO</b>										
4	PR.PL.86	Perforación de pozos para inyecciones	Plan	m	444.05					
			Actual		550.00	x				
5	PR.PL.87	Perforación de pozos de verificación y exploración	Plan	m	18.91					
			Actual		20.00	x				
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
6	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709-4+226)	Plan	m3	263,040.00					
			Actual		210,400.00		x	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega	LOB4 incrementará el ingreso de CM - MEP registrará el los DR las afectaciones
7	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000-0+645)	Plan	m3	103,509.33					
			Actual		72,400.00		x	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega	LOB4 incrementará el ingreso de CM - MEP registrará el los DR las afectaciones

N° Activities Planned	5
N° Activities Completed	3
% Completado	60%

CANT	COD	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)
0	SCH	Programación Incorrecta
0	LOG	Logística/Procura
0	EQU	Equipos
0	ADM	Administración
0	SBC	Subcontratistas
0	HSEC	Seguridad
0	QA/QC	Calidad
0	WTH	Clima
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente
2	CLI-MAT	Materiales Cliente
0	CLI-LIB	Liberación Cliente

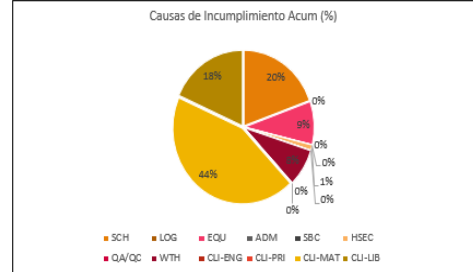


Semana	Acumulado	Acum %
SCH	17	20%
LOG	0	0%
EQU	8	9%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	1%
QA/QC	0	0%
WTH	7	8%
CLI-ENG	0	0%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	38	44%
CLI-LIB	16	18%
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>100%</b>

**PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO**

Item	Codigo de Actividad (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/Actual	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
						50%				
						YES	NO	CI		
<b>PLINTO</b>										
1	PR.PL.88	Ensayos con agua a presión	Plan	H	30.50					
			Actual		35.00	X				
2	PR.PL.89	Inyección de lechada	Plan	kg	5,500.00					
			Actual		6,000.00	X				
3	PR.PL.86	Perforación de pozos para inyecciones	Plan	m	444.05					
			Actual		600.00	X				
<b>TRABAJOS EN CRESTA DE PRESA</b>										
5	PR.CRE.54	Suministro y colocación de concreto de 4MPa en curbs - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	944.41					
			Actual		607.00		X	SCH	Alertas amarillas continuas - Sin área para colocar curb	Se realizará reunion de 3W para definir promesas cumplibles
6	PR.CRE.56	Distribución y compactación de relleno con material tipo 1B - Bofedales	Plan	m3	6,149.65					
			Actual		3,952.56		X	SCH	Actividad precedente	Se realizará reunion de 3W para definir promesas cumplibles
7	PR.CRE.56	Distribución y compactación de relleno con material tipo 2A - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	17,570.42					
			Actual		25,737.59		X	SCH	Actividad precedente	Se realizará reunion de 3W para definir promesas cumplibles
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
8	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobomba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226)	Plan	m3	363,040.00					
			Actual		320,600.00		X	CLI-MAT	Bajo suministro de material por parte de MLB - MLB indica que no tuvo área para entrega	Se realizará reunion de 3W para definir promesas cumplibles
9	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645)	Plan	m3	108,509.33					
			Actual		104,000.00		X			

N° Activities Planned	8
N° Activities Completed	4
% Completado	50%

CANT	COD	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)
3	SCH	Programacion Incorrecta
0	LOG	Logistica/Procura
0	EQU	Equipos
0	ADM	Administracion
0	SBC	Subcontratistas
0	HSEC	Seguridad
0	QA/QC	Calidad
0	WTH	Clima
0	CLI-ENG	Ingeniera Cliente
0	CLI-PRI	Priondades Cliente
1	CLI-MAT	Materiales Cliente
0	CLI-LIB	Liberacion Cliente



Semana	Acumulado	Acum %
SCH	27	26%
LOG	0	0%
EQU	8	8%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	1%
QA/QC	0	0%
WTH	7	7%
CLI-ENG	0	0%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	44	42%
CLI-LIB	18	17%
<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>100%</b>


Área del gráfico

### PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO

Item	Codigo de Actividad (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/Actual	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
						63%				
						YES	NO	CI		
<b>PLINTO</b>										
1	PR.PL.88	Ensayos con agua a presión	Plan	H	30.50					
			Actual		35.00	X				
2	PR.PL.89	Inyección de lechada	Plan	kg	5,500.00					
			Actual		6,000.00	X				
3	PR.PL.86	Perforación de pozos para inyecciones	Plan	m	444.05					
			Actual		600.00	X				
<b>TRABAJOS EN CRESTA DE PRESA</b>										
5	PR.CRE.54	Suministro y colocación de concreto de 4MPa en curbs - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	944.41					
			Actual		607.00	X				
6	PR.CRE.56	Distribución y compactación de relleno con material tipo 1B - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	6,149.65					
			Actual		3,952.56		X	SCH	Se viene realizando trabajos en sectores no definidos	Se realizará la sectorizacion de tramos para mayor control diario
7	PR.CRE.56	Distribución y compactación de relleno con material tipo 2A - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	17,570.42					
			Actual		11,293.02		X	SCH	Se viene realizando trabajos en sectores no definidos	Se realizará la sectorizacion de tramos para mayor control diario
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
8	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Bofedal 3 de Fur	Plan	m3	363,040.00					
			Actual		322,300.00		X	EQU	Falta de combustible en la cuadrilla de tractores en horas efectivas di	Se realizará reunion de 3W para definir promesas cumplibles
9	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fur	Plan	m3	103,509.33					
			Actual		104,000.00	X				

N° Activities Planned	8
N° Activities Completed	5
% Completado	63%

CANT	COD	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)
2	SCH	Programación Incorrecta
0	LOG	Logística/Procura
1	EQU	Equipos
0	ADM	Administración
0	SBC	Subcontratistas
0	HSEC	Seguridad
0	QA/QC	Calidad
0	WTH	Clima
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente
0	CLI-MAT	Materiales Cliente
0	CLI-LIB	Liberación Cliente

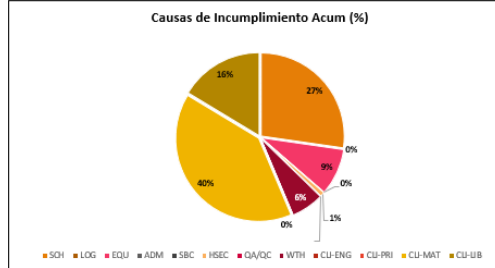

Semana	Acumulado	Acum %
SCH	30	27%
LOG	0	0%
EQU	10	9%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	1%
QA/QC	0	0%
WTH	7	6%
CLI-ENG	0	0%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	44	40%
CLI-LIB	18	16%
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>100%</b>




**PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO**

Item	Codigo de Actividad (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/Act ual	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
						86%	YES	NO		
<b>PLINTO</b>										
2	PR.PL.89	Inyección de lechada	Plan	kg	5,500.00					
			Actual		3,000.00		x	CLI-ENG	Las inyecciones en la zona se realizaron con menor forecast	
3	PR.PL.86	Perforación de pozos para inyecciones	Plan	m	444.05					
			Actual		600.00		x			
<b>TRABAJOS EN CRESTA DE PRESA</b>										
5	PR.CRE.54	Suministro y colocación de concreto de 4MPa en curbs - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	179.00					
			Actual		182.45		x			
6	PR.CRE.56	Distribución y compactación de relleno con material tipo 1B - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	1,165.58					
			Actual		1,188.04		x			
7	PR.CRE.56	Distribución y compactación de relleno con material tipo 2A - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	3,330.23					
			Actual		3,394.39		x			
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
8	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226)	Plan	m3	363,040.00					
			Actual		340,300.00		x			
9	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645)	Plan	m3	103,509.33					
			Actual		124,000.00		x			

N° Activities Planned	7
N° Activities Completed	6
% Completado	86%

CANT	COD	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)
0	SCH	Programación Incorrecta
0	LOG	Logística/Procura
0	EQU	Equipos
0	ADM	Administración
0	SBC	Subcontratistas
0	HSEC	Seguridad
0	QA/QC	Calidad
0	WTH	Clima
1	CLI-ENG	Ingeniería Cliente
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente
0	CLI-MAT	Materiales Cliente
0	CLI-LIB	Liberación Cliente

Causas de Incumplimiento Acum (%)




Semana	Acumulado	Acum %
SCH	28	26%
LOG	0	0%
EQU	9	8%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	1%
QA/QC	0	0%
WTH	7	6%
CLI-ENG	2	2%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	44	40%
CLI-LIB	18	17%
<b>Total</b>	<b>109</b>	<b>100%</b>

### PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO

Item	Codigo de Área del gráfico (Activ.)	Descripción de la actividad	Plan/Actual	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
						88%				
						YES	NO	CI		
<b>PLINTO</b>										
1	PR.PL.88	Ensayos con agua a presión	Plan	H	20.00	X				
			Actual		25.00					
2	PR.PL.89	Inyección de lechada	Plan	kg	1,500.00					
			Actual		2,000.00	X				
3	PR.PL.86	Perforación de pozos para inyecciones	Plan	m	300.00					
			Actual		450.00	X				
<b>TRABAJOS EN CRESTA DE PRESA</b>										
5	PR.CRE.54	Suministro y colocación de concreto de 4MPa en curbs - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	179.00					
			Actual		329.00	X				
6	PR.CRE.56	Distribución y compactación de relleno con material tipo 1B - Bofedales de 4105	Plan	m3	1,165.58					
			Actual		2,142.33	X				
7	PR.CRE.56	Distribución y compactación de relleno con material tipo 2A - Bofedales de 4105	Plan	m3	3,330.23					
			Actual		6,120.93	X				
8	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226)	Plan	m3	263,040.00					
			Actual		140,300.00		X	EQU	Los recursos fueron designados a otro frente a media semana debido a inoperatividad de EQ	Se realizara el mtto preventivo de los EQ de acuerdo a programación enviada por EQ
9	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645)	Plan	m3	103,509.33					
			Actual		114,600.00	X				

N° Activities Planned	8
N° Activities Completed	7
% Completado	88%

CANT	COD	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)
0	SCH	Programación Incorrecta
0	LOG	Logística/Procura
1	EQU	Equipos
0	ADM	Administración
0	SBC	Subcontratistas
0	HSEC	Seguridad
0	QA/QC	Calidad
0	WTH	Clima
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente
0	CLI-MAT	Materiales Cliente
0	CLI-LIB	Liberación Cliente

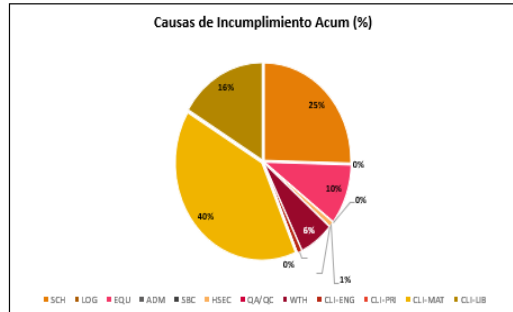


Semana	Acumulado	Acum %
SCH	28	25%
LOG	0	0%
EQU	11	10%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	1%
QA/QC	0	0%
WTH	7	6%
CLI-ENG	1	1%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	44	40%
CLI-LIB	18	16%
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>100%</b>

### PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO

Item	Codigo de Actividad (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/Actual	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
						91%				
						YES	NO	CI		
<b>PLINTO</b>										
1	PR.PL.88	Ensayos con agua a presión	Plan	H	15.00	x				
			Actual		15.00					
2	PR.PL.89	Inyección de lechada	Plan	kg	550.00					
			Actual		600.00	x				
3	PR.PL.86	Perforación de pozos para inyecciones	Plan	m	150.00					
			Actual		200.00	x				
<b>TRABAJOS EN CRESTA DE PRESA</b>										
4	PR.CRE.54	Suministro y colocación de concreto de 4MPa en curbs - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	700.00					
			Actual		718.00	x				
5	PR.CRE.56	Distribución y compactación de relleno con material tipo 1B - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	4,558.14					
			Actual		4,675.35	x				
6	PR.CRE.56	Distribución y compactación de relleno con material tipo 2A - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	13,023.26					
			Actual		13,358.14	x				
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
7	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226) - CAPA 59	Plan	m3	179,600.00					
			Actual		179,668.68	x				
8	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226) - CAPA 60	Plan	m3	165,000.00					
			Actual		165,157.36	x				
9	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645) -CAPA 135	Plan	m3	20,500.00					
			Actual		20,504.18	x				
10	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645) - CAPA 136	Plan	m3	33,000.00					
			Actual		33,898.43	x				
11	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645) - CAPA 137	Plan	m3	45,000.00					
			Actual		31,633.63	x		CLI-MAT	No se llevo a los viajes comprometidos por MLB	MEP reprogramará la actividad

N° Activities Planned	11
N° Activities Completed	10
% Completado	91%

CANT	COD	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)
0	SCH	Programación Incorrecta
0	LOG	Logística/Procura
0	EQU	Equipos
0	ADM	Administración
0	SBC	Subcontratistas
0	HSEC	Seguridad
0	QA/QC	Calidad
0	WTH	Clima
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente
1	CLI-MAT	Materiales Cliente
0	CLI-LIB	Liberación Cliente

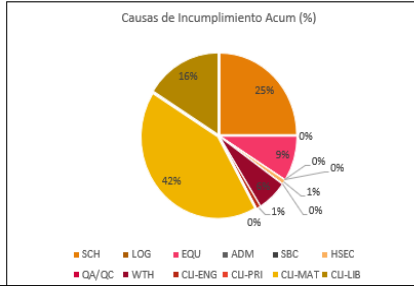


Semana	Acumulado	Acum %
SCH	28	25%
LOG	0	0%
EQU	10	9%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	1%
QA/QC	0	0%
WTH	7	6%
CLI-ENG	1	1%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	47	42%
CLI-LIB	18	16%
<b>Total</b>	<b>112</b>	<b>100%</b>

### PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO

Item	Codigo de Actividad (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/Actual	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
						91%				
						YES	NO	CI		
<b>PLINTO</b>										
1	PR.PL.88	Ensayos con agua a presión	Plan	H	15.00	x				
			Actual		15.00					
2	PR.PL.89	Inyección de lechada	Plan	kg	550.00					
			Actual		600.00	x				
3	PR.PL.86	Perforación de pozos para inyecciones	Plan	m	150.00					
			Actual		200.00	x				
<b>TRABAJOS EN CRESTA DE PRESA</b>										
4	PR.CRE.54	Suministro y colocación de concreto de 4MPa en curbs - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	700.00					
			Actual		718.00	x				
5	PR.CRE.56	Distribución y compactación de relleno con material tipo 1B - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	4,558.14					
			Actual		4,675.35	x				
6	PR.CRE.56	Distribución y compactación de relleno con material tipo 2A - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	13,023.26					
			Actual		13,358.14	x				
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
7	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226) - CAPA 59	Plan	m3	179,600.00					
			Actual		179,668.68	x				
8	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226) - CAPA 60	Plan	m3	165,000.00					
			Actual		165,157.36	x				
9	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645) -CAPA 135	Plan	m3	20,500.00					
			Actual		20,504.18	x				
10	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645) - CAPA 136	Plan	m3	33,000.00					
			Actual		33,898.43	x				
11	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645) - CAPA 137	Plan	m3	45,000.00					
			Actual		31,633.63	x	CLI-MAT	No se llevo a los viajes comprometidos por MLB	MEP reprogramará la actividad	

N° Activities Planned	11
N° Activities Completed	10
% Completado	91%

CANT	COD	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)
0	SCH	Programación Incorrecta
0	LOG	Logística/Procura
0	EQU	Equipos
0	ADM	Administración
0	SBC	Subcontratistas
0	HSEC	Seguridad
0	QA/QC	Calidad
0	WTH	Clima
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente
1	CLI-MAT	Materiales Cliente
0	CLI-LIB	Liberación Cliente

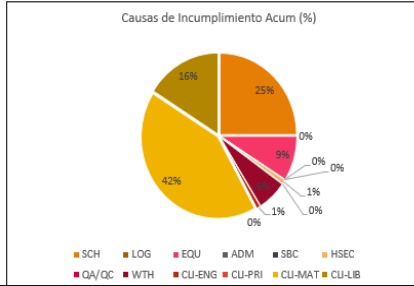


Semana	Acumulado	Acum %
SCH	28	25%
LOG	0	0%
EQU	10	9%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	1%
QA/QC	0	0%
WTH	7	6%
CLI-ENG	1	1%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	47	42%
CLI-LIB	18	16%
<b>Total</b>	<b>112</b>	<b>100%</b>

### PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO

Item	Codigo de Área del gráfico (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/Actua l	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
						91%	YES	NO		
<b>PLINTO</b>										
1	PR.PL.88	Ensayos con agua a presión	Plan	H	15.00	X				
			Actual		15.00					
2	PR.PL.89	Inyección de lechada	Plan	kg	550.00					
			Actual		600.00	X				
3	PR.PL.86	Perforación de pozos para inyecciones	Plan	m	150.00					
			Actual		200.00	X				
<b>TRABAJOS EN CRESTA DE PRESA</b>										
4	PR.CRE.54	Suministro y colocación de concreto de 4MPa en curbs - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	900.00					
			Actual		1,160.00	X				
5	PR.CRE.56	Distribución y compactación de relleno con material tipo 1B - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	5,860.47					
			Actual		7,553.49	X				
6	PR.CRE.56	Distribución y compactación de relleno con material tipo 2A - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	22,000.00					
			Actual		21,581.40	X	QA/QC	No se liberó ultimo tramo con QA por cambio de guardia	MEP solicitará reportar produccion con pendiente de liberación	
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
7	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226) - CAPA 61	Plan	m3	184,000.00					
			Actual		184,129.02	X				
8	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226) - CAPA 62	Plan	m3	184,000.00					
			Actual		184,178.21	X				
9	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645) -CAPA 137	Plan	m3	30,500.00					
			Actual		50,504.18	X				
10	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645) - CAPA 138	Plan	m3	35,000.00					
			Actual		33,898.43	X				
11	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645) - CAPA 139	Plan	m3	45,000.00					
			Actual		31,633.63	X				

N° Activities Planned	11
N° Activities Completed	10
% Completado	91%

CANT	COD	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)
0	SCH	Programación Incorrecta
0	LOG	Logistical/Procura
0	EQU	Equipos
0	ADM	Administración
0	SBC	Subcontratistas
0	HSEC	Seguridad
1	QA/QC	Calidad
0	WTH	Clima
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente
0	CLI-MAT	Materiales Cliente
0	CLI-LIB	Liberación Cliente

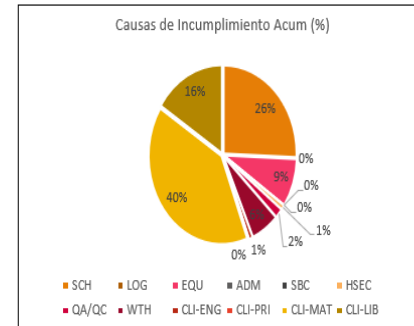


Semana	Acumulado	Acum %
SCH	29	26%
LOG	0	0%
EQU	10	9%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	1%
QA/QC	2	2%
WTH	7	6%
CLI-ENG	1	1%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	45	40%
CLI-LIB	18	16%
<b>Total</b>	<b>113</b>	<b>100%</b>

### PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO

Item	Codigo de Actividad (Act Id)	Descripción de la actividad	Plan/Actua l	Unidad	Cantidades	Week PPC			CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)	ACCIONES CORRECTIVAS
						73%				
						YES	NO	CI		
<b>PLINTO</b>										
1	PR.PL.88	Ensayos con agua a presión	Plan	H	15.00	X				
			Actual		15.00					
2	PR.PL.89	Inyección de lechada	Plan	kg	550.00					
			Actual		600.00	X				
3	PR.PL.88	Perforación de pozos para inyecciones	Plan	m	150.00					
			Actual		200.00	X				
<b>TRABAJOS EN CRESTA DE PRESA</b>										
4	PR.CRE.54	Suministro y colocación de concreto de 4MPa en curbs - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	900.00					
			Actual		674.00		X	CLI-LIB	Conflicto social entre MLB y las comunidades el 14.04	MEP quedará a espera de indicaciones para reinicio de labores
5	PR.CRE.56	Distribución y compactación de relleno con material tipo 1B - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	5,860.47					
			Actual		4,388.84		X	CLI-LIB	Conflicto social entre MLB y las comunidades el 14.04	MEP quedará a espera de indicaciones para reinicio de labores
6	PR.CRE.56	Distribución y compactación de relleno con material tipo 2A - Bofedales de 4105 @ 4121 (0+000 - 1+919)	Plan	m3	22,000.00					
			Actual		12,533.53		X	CLI-LIB	Conflicto social entre MLB y las comunidades el 14.04	MEP quedará a espera de indicaciones para reinicio de labores
<b>RELLENO CON MATERIAL TIPO 2 (MASIVO)</b>										
7	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226) - CAPA 64	Plan	m3	162,000.00					
			Actual		162,179.46	X				
8	PR.CPM.34	Distribución y compactación de material tipo 2 - Ferrobamba de Fund. @ 4105 (2+709 - 4+226) - CAPA 65	Plan	m3	54,000.00					
			Actual		58,377.87	X				
9	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645) -CAPA 139	Plan	m3	1,800.00					
			Actual		1,911.09	X				
10	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645) - CAPA 145	Plan	m3	50,000.00					
			Actual		53,293.55	X				
11	PR.CPM.37	Distribución y compactación de material tipo 2 - Bofedal 3 de Fund. @ 4105 (0+000 - 0+645) - CAPA 148	Plan	m3	7,000.00					
			Actual		7,464.80	X				

N° Activites Planned	11
N° Activites Completed	8
% Completado	73%

CANT	COD	CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (CI)
0	SCH	Programación Incorrecta
0	LOG	Logística/Procura
0	EQU	Equipos
0	ADM	Administración
0	SBC	Subcontratistas
0	HSEC	Seguridad
0	QA/QC	Calidad
0	WTH	Clima
0	CLI-ENG	Ingeniería Cliente
0	CLI-PRI	Prioridades Cliente
0	CLI-MAT	Materiales Cliente
3	CLI-LIB	Liberación Cliente

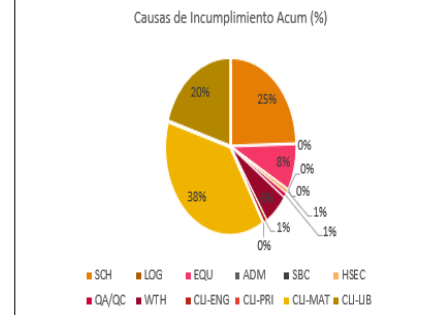

Semana	Acumulado	Acum %
SCH	29	25%
LOG	0	0%
EQU	10	8%
ADM	0	0%
SBC	0	0%
HSEC	1	1%
QA/QC	1	1%
WTH	7	6%
CLI-ENG	1	1%
CLI-PRI	0	0%
CLI-MAT	45	38%
CLI-LIB	24	20%
<b>Total</b>	<b>118</b>	<b>100%</b>

## Anexo 5 Panel fotográfico



1. Capacitación a Líderes de Grupo en el llenado de reportes para carta balance



1. Capacitación a Líderes de Grupo en el llenado de reportes para carta balance



2. Verificación del llenado de reportes en campo






3. Capacitación a operadores de equipos pesados en herramientas lean.



4. Implementación de reunión de restricciones

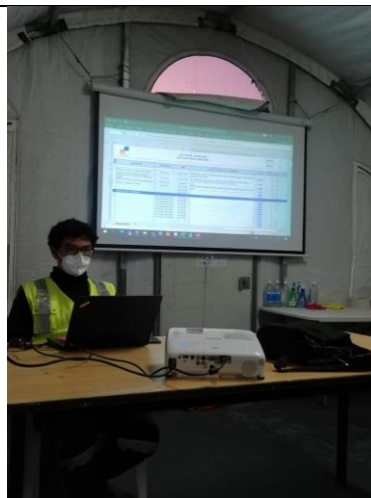

5. Exposición de restricciones de la semana.





6. Tren de Trabajo en Ferrobamba Norte – Material Tipo 2



7. Tren de Trabajo en Bofedales – Material 1B



8. Tren de Trabajo en Bofedales – Material 2A

## Anexo 6 IBM SPSS STATISTICS 26

Resultado Fernando.spv (Documento) - IBM SPSS Statistics Viewer

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

		Estadístico	Error estándar	
Costo unitario de relleno Fve	Medida	9288	02786	
	95% de intervalo de confianza para la medida	Límite inferior	8089	
		Límite superior	10487	
	Medida recortada al 5%			
	Mediana	9800		
	Varianza	002		
	Desviación estándar	04826		
	Mínimo	88		
	Máximo	98		
	Rango	10		
	Rango intercuartil			
	Asimetría	-109	1.225	
	Qui-cuadrado			
Costo unitario de relleno Fost	Medida	8827	02548	
	95% de intervalo de confianza para la medida	Límite inferior	7731	
		Límite superior	9923	
	Medida recortada al 5%			
	Mediana	8800		
	Varianza	002		
	Desviación estándar	04413		
	Mínimo	84		
	Máximo	93		
	Rango	09		
	Rango intercuartil			
	Asimetría	275	1.225	
	Qui-cuadrado			

*Pruebas de normalidad*

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Costo unitario de relleno Fve	.178	3		1.000	3	.960
Test						

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicoide ACTIVADO Clásico

### 1. Análisis estadístico descriptivo de costo unitario de relleno.

Resultado Fernando.spv (Documento) - IBM SPSS Statistics Viewer

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

		Estadístico	Error estándar	
Cronograma cumplido Fve Test	Medida	5167	04667	
	95% de intervalo de confianza para la medida	Límite inferior	3159	
		Límite superior	7175	
	Medida recortada al 5%			
	Mediana	5800		
	Varianza	007		
	Desviación estándar	08083		
	Mínimo	43		
	Máximo	59		
	Rango	16		
	Rango intercuartil			
	Asimetría	-722	1.225	
	Qui-cuadrado			
Cronograma cumplido Fost	Medida	7733	07219	
	95% de intervalo de confianza para la medida	Límite inferior	4627	
		Límite superior	10839	
	Medida recortada al 5%			
	Mediana	7700		
	Varianza	016		
	Desviación estándar	12503		
	Mínimo	65		
	Máximo	90		
	Rango	25		
	Rango intercuartil			
	Asimetría	120	1.225	
	Qui-cuadrado			

*Pruebas de normalidad*

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Cronograma cumplido Fve Test	.332	3		.980	3	.726
Cronograma cumplido Fost	.178	3		.999	3	.956
Test						

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicoide ACTIVADO Clásico

Escribe aquí para buscar. 10°C Mayorm, soleado 14:32 15/06/2022

### 2. Análisis estadístico descriptivo de cronograma.

