
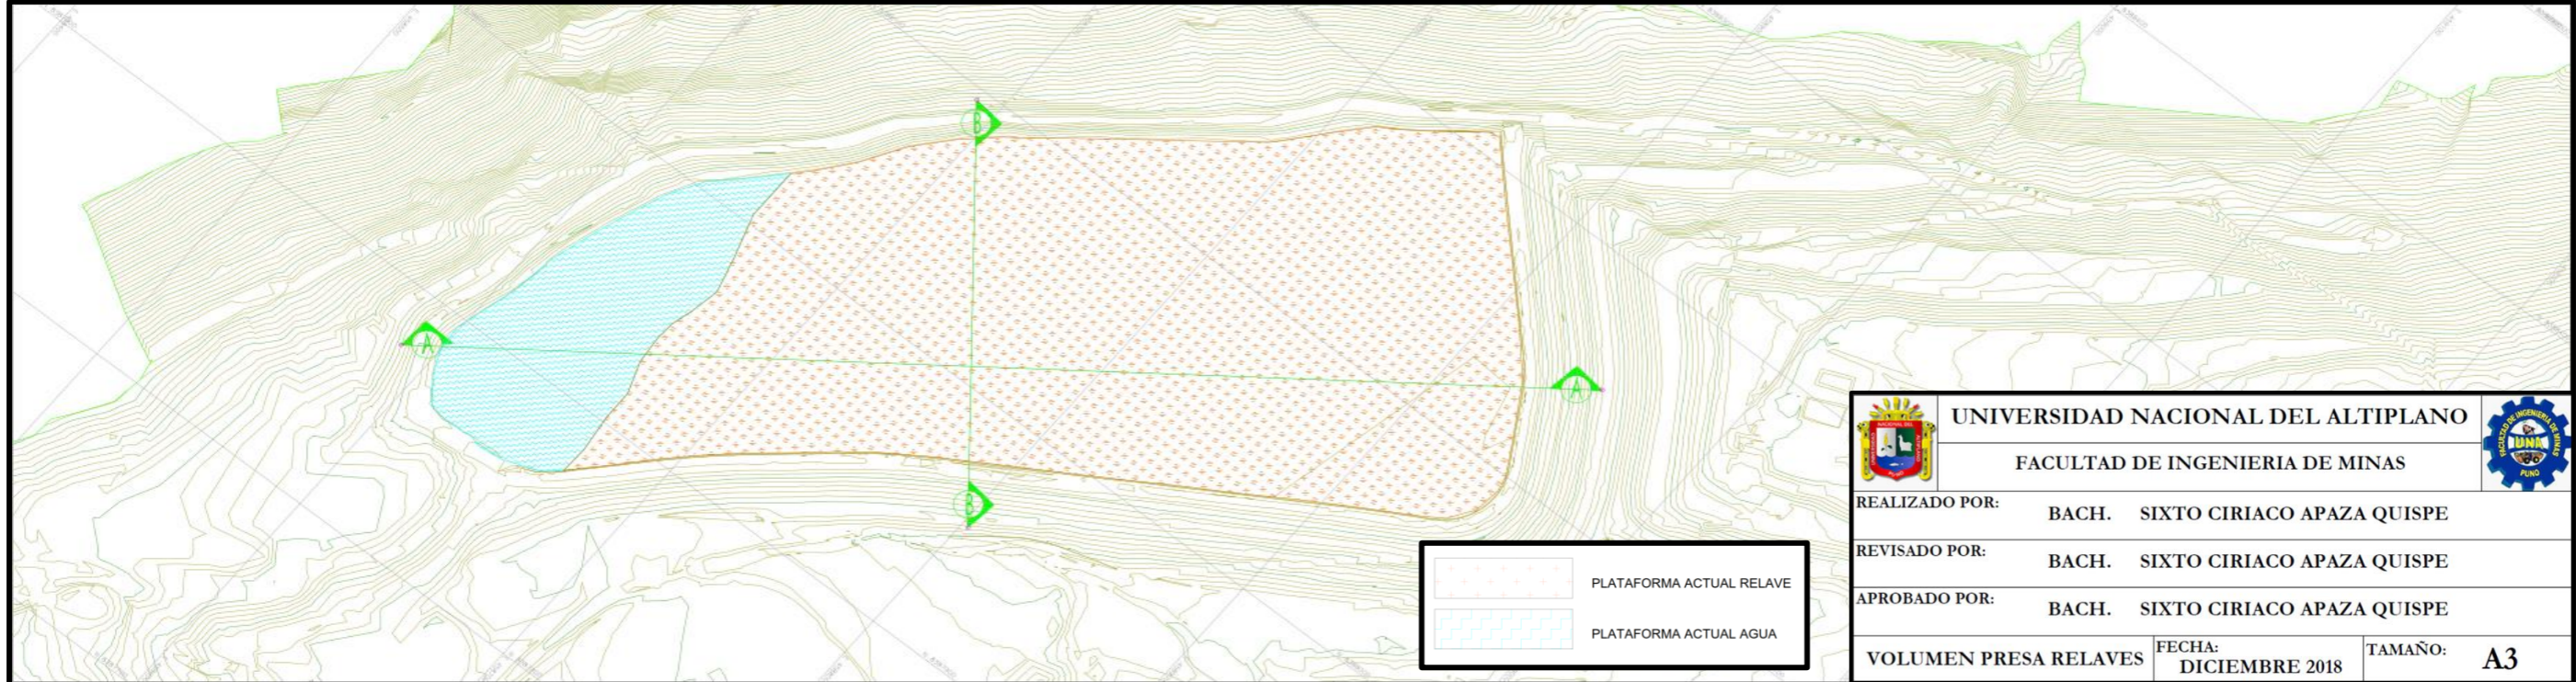


DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Vol. Llenado mes Dic.-18	49 038.16 m ³	Dic.01-18 - Ene. 01-19
Altura llenada mes Dic.-18	0.392 m.	Altura promedio
Altura Restante a Llenar.	5.696 m.	Cota 4330.00
Vol. Restante a Llenar	813 871.07 m ³	Cota 4330.00
Cota Actual	4324.630	01- Enero-2019
Cota Final Proyectada	4331	En recrecimiento
Cota Dique Actual	4332	En recrecimiento
Area Relave	119 056.75 m ²	01- Enero-2019
Area de agua	14 932.31 m ²	01- Enero-2019
Cota final del proyecto	4331	Cota final
Tiempo de vida	1.5 años	Aproximado

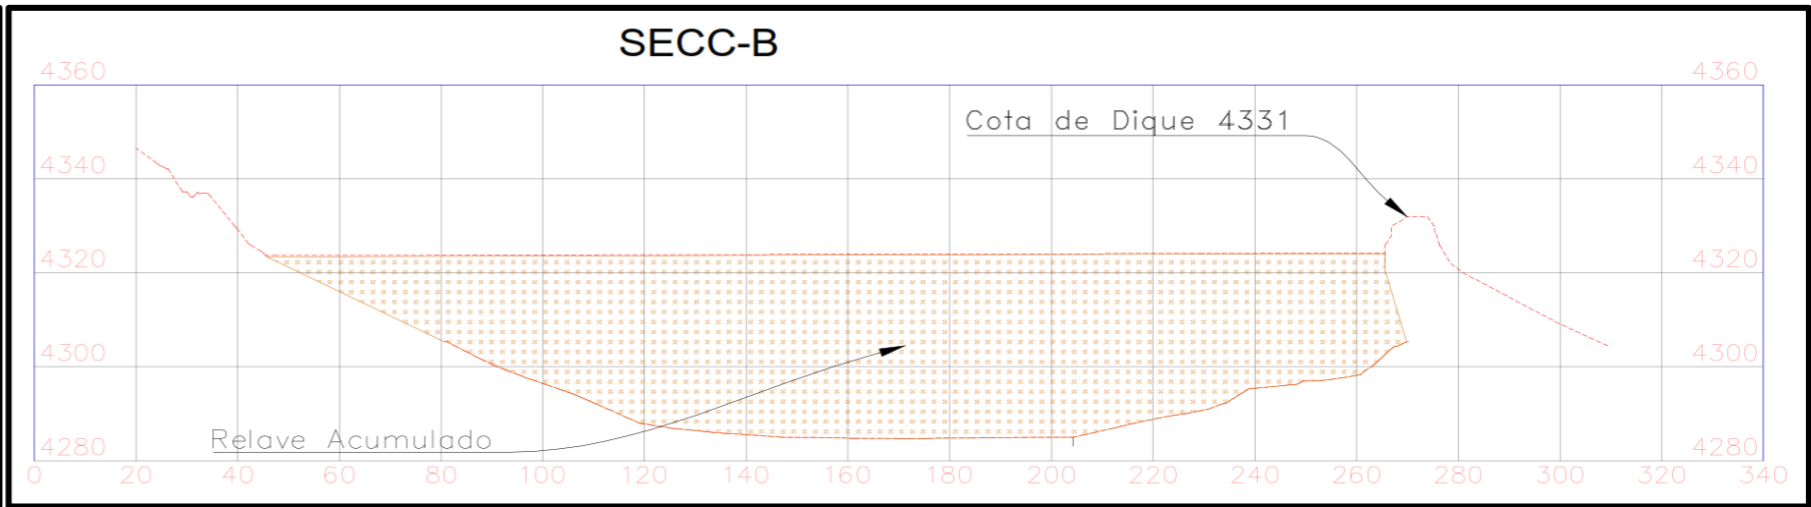

	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO		
	FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS		
REALIZADO POR:	BACH.	SIXTO CIRIACO APAZA QUISPE	
REVISADO POR:	BACH.	SIXTO CIRIACO APAZA QUISPE	
APROBADO POR:	BACH.	SIXTO CIRIACO APAZA QUISPE	
VOLUMEN PRESA RELAVES	FECHA:	DICIEMBRE 2018	TAMAÑO: A3
