Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
1		**PLAZO DE EJECUCION**	**630 días**
2		Inicio de Obra	0 días
3		**CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD - ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA**	**630 días**
4		**OBRAS PRELIMINARES**	**6 días**
5		CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M	1 día
6		CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO	3 días
7		ENERGIA ELÉCTRICA PROVISIONAL Y AGUA POTABLE	2 días
8		CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS	2 días
9		CASETA SERVICIOS HIGIENICOS Y COMEDOR PERSONAL	1 día
10		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE OBRA	1 día
11		PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRA	1 día
12		EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE MOTOBOMBA	1 día
13		**TRABAJOS PRELIMINARES**	**33 días**
14		LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	10 días
15		TRAZO NIVELES Y REPLANTEO INICIO Y DURANTE LA OBRA	21 días
16		MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	12 días
17		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**192 días**
18		EXCAVACION DE PLATAFORMA EN TIERRA (LAMPA Y PICO)	11 días
19		EXCAVACION DE ZANJAS HASTA 3.00 MT TERRENO NORMAL	37 días
20		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	12 días
21		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	9 días
22		TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL EXEDENTE 50M	29 días
23		ELIMINACIÓN DE MAT EXCEDENTE (CARGUIO)	14 días
24		EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA	13 días
25		RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO Y MAT/PROPIO	11 días
26		DEMOLICION DE CONCRETO EN CIMIENTOS	2 días
27		ENTIBADO DE ZANJAS--	24 días
28		**OBRAS DE CONCRETO SIMPLE**	**124 días**
29		SUB ZAPATA DE CONCRETO CICLOPEO 1:12+30% P.G. C.TV.	4 días
30		SUBCIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO 1:12+30% P.G. C.TV.	18 días
31		CIMIENTOS CONCRETO FC=100KG/CM2+30% DE P.G. C.TV.	19 días
32		CIMIENTOS CONCRETO FC=140KG/CM2+30% DE P.G. C.TV.	3 días
33		FALSO PISO DE CONCRETO FC=140 KG/CM2 CEM. T.V.	20 días
34		**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**	**151 días**
35		ZAPATAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 TIPO V	11 días
36		ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	18 días
37		ZAPATAS - ACERO	7 días
38		VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEMEN.	15 días
39		VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	17 días
40		VIGAS DE CIMENTACION ACERO ESTRUCTURAL FY=4200	15 días
41		SOBRECIMIENTO REFORZADO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEM. T.V.	11 días
42		SOBRECIMIENTO DE 0.30 A 0.60 MT ENCOFRADO Y DESENCOF	22 días
43		SOBRECIMIENTO CARAVISTA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	7 días
44		SOBRECIMIENTO REFORZADO ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60	5 días
45		CISTERNA SUBTERRANEA CONCRETO F'C=210 KG/CM2 C/IMPERMEABILIZANTE C/C T.V.	4 días
46		CISTERNA SUBTERRANEA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	6 días
47		CISTERNA SUBTERRANEA ACERO GRADO 60	2 días
48		PARAPETOS Y TABIQUES F'C= 210 KG/CM2	1 día
49		PARAPETOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	4 días
50		PARAPETOS ACERO ESTRUCTURAL FY=4200	2 días
51		MUROS TABIQUES Y PLACAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2	7 días
52		MUROS TABIQUES Y PLACAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	15 días
53		MUROS TABIQUES Y PLACAS ACERO GRADO 60	8 días
54		COLUMNAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2	10 días
55		COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	20 días
56		COLUMNAS CIRCULARES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	1 día
57		COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	4 días
58		COLUMNAS - ACERO	20 días
59		VIGAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CEM. IP	6 días
60		VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	4 días
61		VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	24 días
62		VIGAS ACERO GRADO 60	10 días
63		LOSAS ALIGERADAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2	7 días
64		LOSAS ALIGERADAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	16 días
65		LOSA ALIGERADA, LADRIRILO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM	2 días
66		LOSAS ALIGERADAS ACERO CORRUGADO GRADO 60	6 días
67		LOSAS MACIZAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2	1 día
68		LOSAS MACIZAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	4 días
69		LOSAS MACIZAS ACERO CORRUGADO GRADO 60	2 días
70		ESCALERAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2	1 día
71		ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	4 días
72		ESCALERAS, ACERO CORRUGADO GRADO 60	2 días
73		TANQUE ELEVADO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 C/IMPERMEABILIZ.	1 día
74		TANQUE ELEVADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	3 días
75		TANQUE ELEVADO, ACERO CORRUGADO GRADO 60	1 día
76		CANAL, CONCRETO F'C=210 KG/CM2	3 días
77		CANAL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	8 días
78		CANAL, ACERO CORRUGADO GRADO 60	5 días
79		**MUROS DE ALBAÑILERIA**	**45 días**
80		MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA	29 días
81		MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA 2C SOLAQUEADO	8 días
82		MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA	8 días
83		**REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS**	**103 días**
84		TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO C/MORTERO 1:5	22 días
85		TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM. (INC.COLUMNAS EMPOT)	30 días
86		TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS (INCL. VERTEDERO)	8 días
87		TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM (INC. COLUMNAS EMPOT)	24 días
88		TARRAJEO DE SUPERF. VIGAS PERALTADAS-INDEPEND. (EN INTERIORES)	17 días
89		TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CIRCULARES C/A 1:5	2 días
90		TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA	14 días
91		VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS.	22 días
92		TARRAJEO DE MUROS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA BARITINA	3 días
93		**CIELORRASOS**	**44 días**
94		CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	24 días
95		VESTIDURA FONDO DE ESCALERA C:A 1:5 e=2cm	4 días
96		CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA RAYADO	6 días
97		CIELORRASO CON ENCHAPE DE CERAMICO SERIE ORIGENES	12 días
98		**PISOS Y PAVIMENTOS**	**38 días**
99		PISO CERAMICO ANTIDESLIZ. TIPO GRANITO 40X40 CM.	14 días
100		PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 30X30	25 días
101		PISO DE TERRAZO CONDUCTIVO DE COLOR CLARO	11 días
102		CONTRAPISO DE CEMENTO 48 MM.	13 días
103		PISO DE 4" CONCRETO F'C 140 KG/CM2 X 10 CM. + PULIDO 1:2 X 1CM	2 días
104		PISO DE 2" CONCRETO F'C 175 KG/CM2 C/C T.V. + PULIDO 1:2	3 días
105		VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 DE 4" CON ACABADO DE 1.5 CM C/CEMENTO T.V.	5 días
106		PISTAS DE CONCRETO DE 6" F'C=210 KG/CM2 CEM. T.V.	3 días
107		**CONTRAZOCALOS**	**12 días**
108		CONTRAZOCALO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE H=0.10	7 días
109		CONTRAZOCALO DE TERRAZO SANITARIO COLOR CLARO	9 días
110		CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 20 CM	4 días
111		CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 45 CM	3 días
112		CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 10 CM	4 días
113		**ZOCALOS**	**67 días**
114		ZOCALO DE CERAMICO DE 20X30 S/BALTICO	29 días
115		LOSA DE CONCRETO ARMADA REVESTIDA CON CERAMICO H=10CM.	9 días
116		**REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS**	**7 días**
117		FORJADO Y REVESTIM. DE GRADAS Y ESCALERAS DE CEM. Y FROTACHA	7 días
118		FORJADO Y REVESTIM. DE GRADAS Y ESCALERAS DE CEM. RAYADO	2 días
119		REVESTIMIENTO CON CERAMICO Y PIEDRA ANDESITA	4 días
120		**COBERTURAS**	**11 días**
121		IMPRIMACION CON ASFALTO RC-250	11 días
122		COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO C/BARRO	10 días
123		**CARPINTERIA DE MADERA**	**20 días**
124		PUERTA DE TABLERO MADERA CEDRO LIV.	5 días
125		PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY 6MM C/MAD CEDRO MAR. 4X2"	20 días
126		PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY 6MM C/MAD CEDRO MAR. 4X2" Y REJILLA MAD.	18 días
127		PUERTA CONTRAPLACADA 6MM C/MAD CEDRO Y VENTANA	6 días
128		PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY 6MM C/MAD CEDRO MAR. 4X2" Y PL PLOMO	2 días
129		TABIQUERIA DE DRYWALL Y PERFIL GA. 8MM CONTRAPLACADO	1 día
130		VESTIDURA MUEBLE DE MELAMINE C/CAJONES H=0.65	16 días
131		**CARPINTERIA METALICA**	**22 días**
147		**CERRAJERIA**	**24 días**
159		**VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES**	**27 días**
164		**PINTURA**	**47 días**
169		**LIMPIEZA**	**463 días**
173		**CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD - INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS**	**443 días**
428		Termino de Obra	0 días

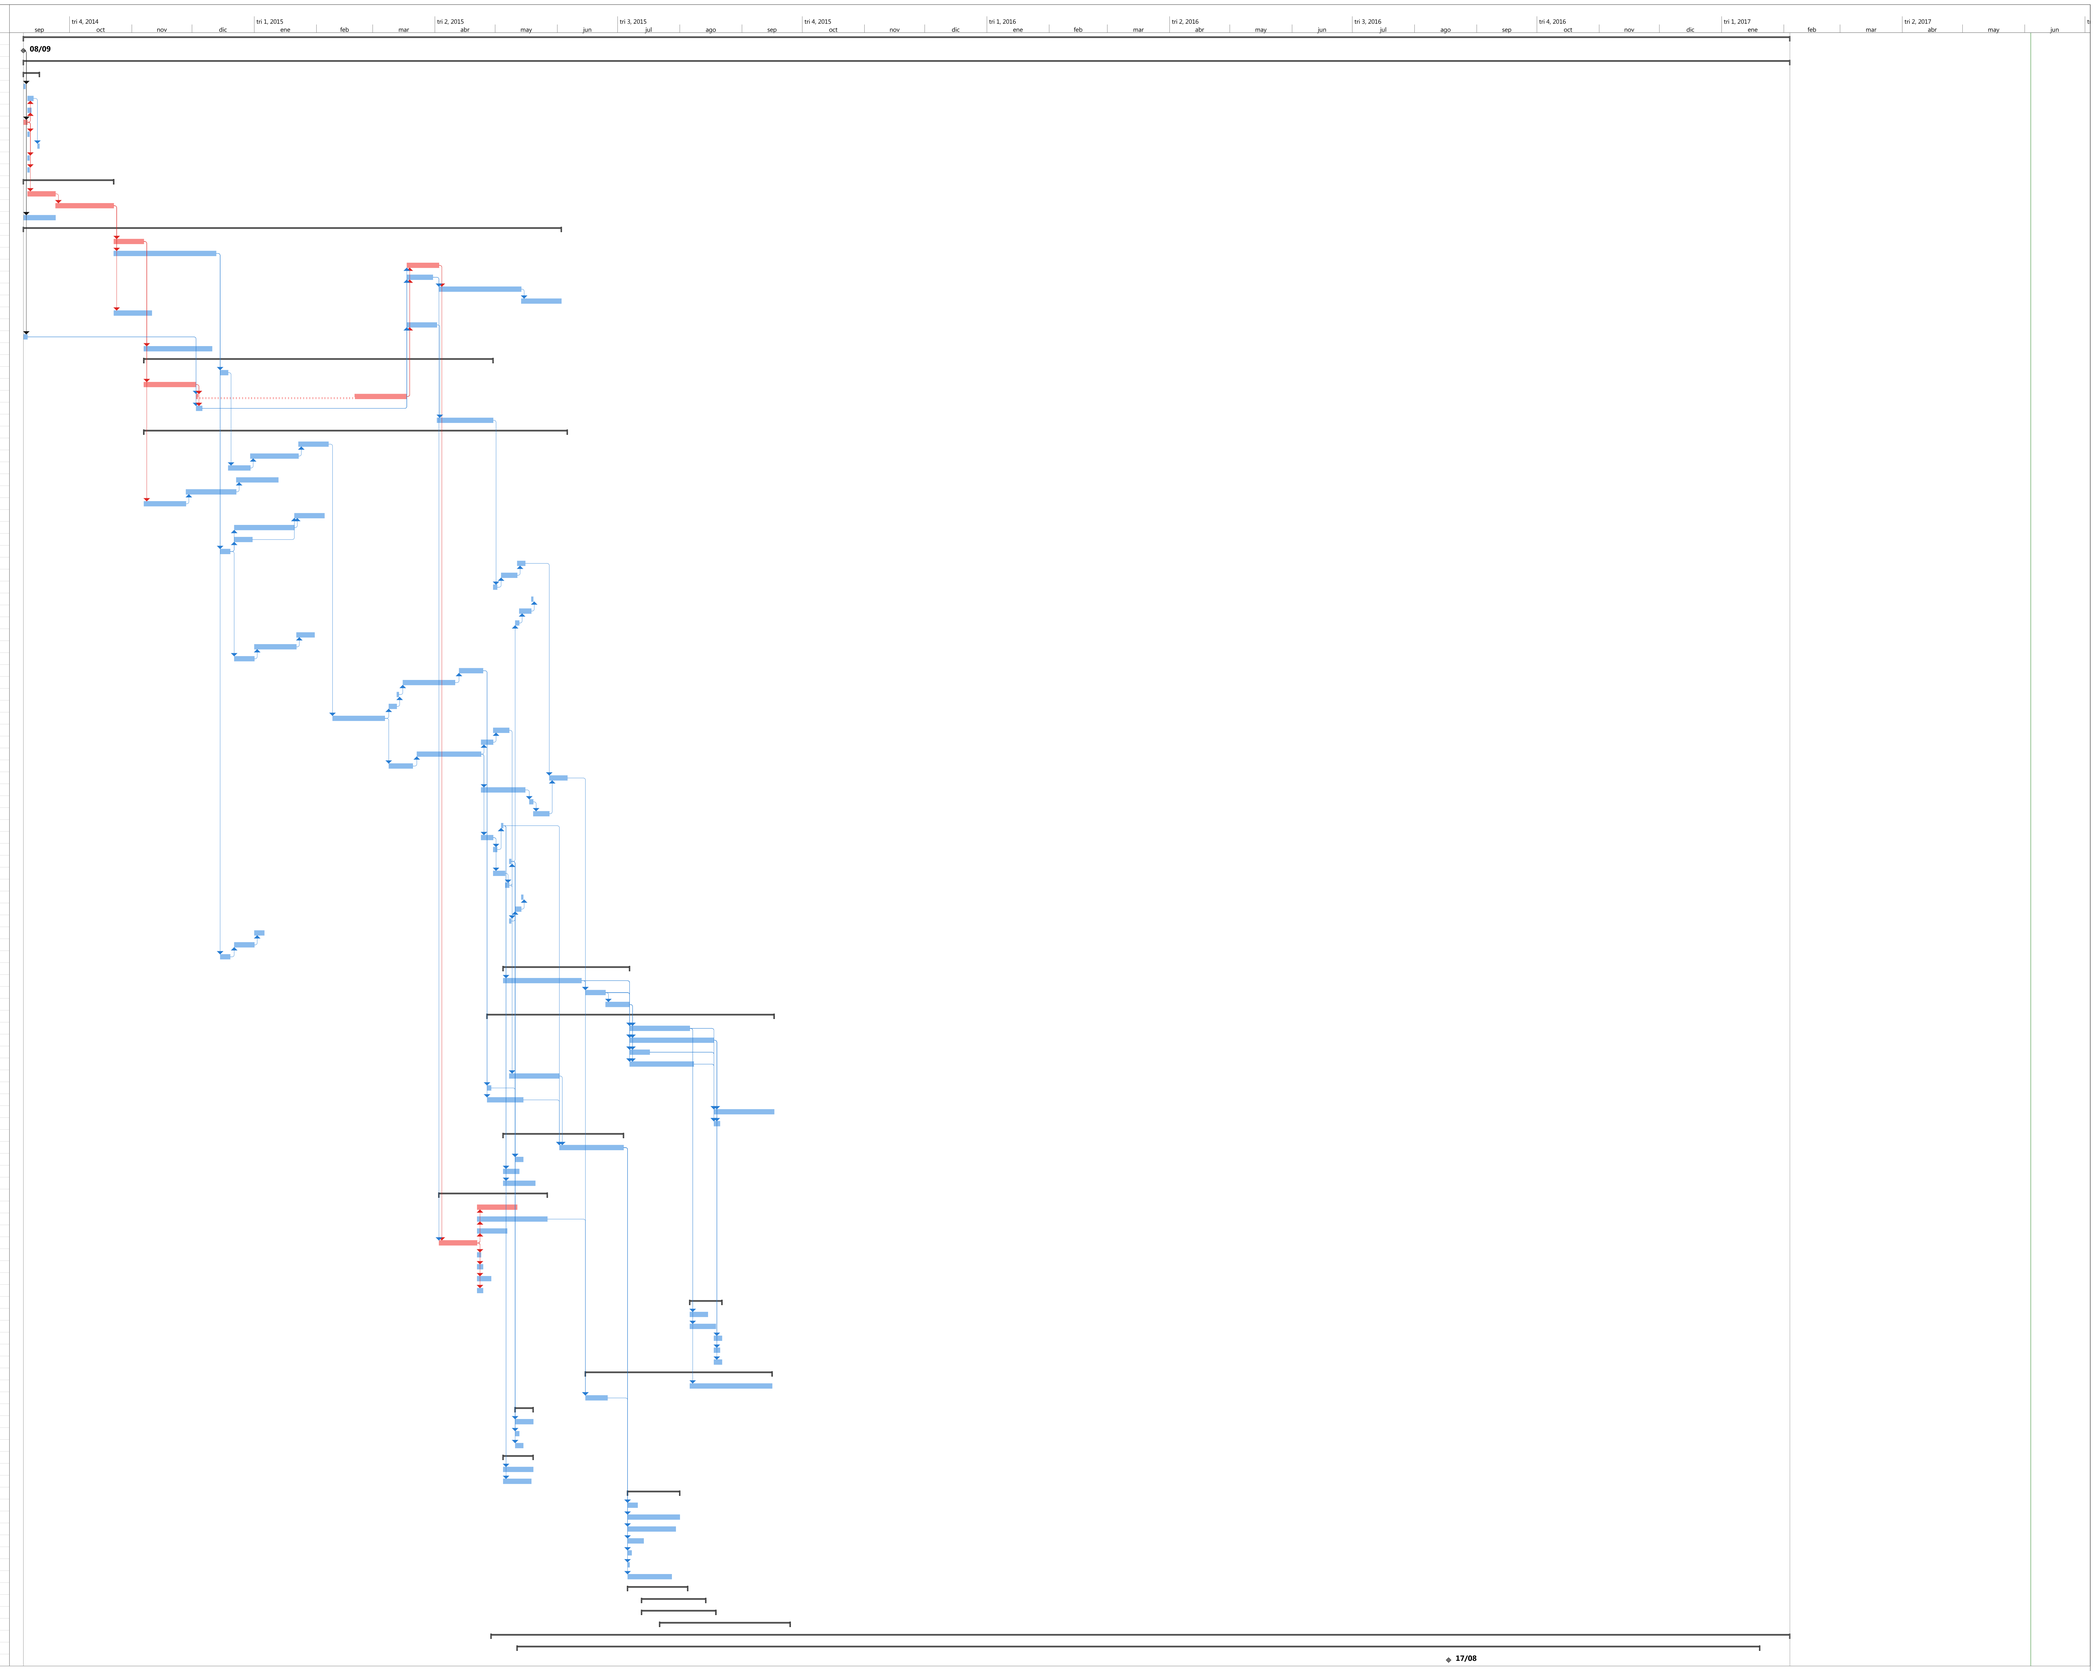

Proyecto: Proyecto130
Fecha: dom 04/06/17

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · sólo el comienzo · sólo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
