ID	EDT	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Sucesoras	Factor cuadrillas	Metrado	Precio Unitario	Parcial	Rendimiento	Nombres de los recursos	Tram
1		**CRONOGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. PERU (LIR.MANTARO - JR.FRANCISCO PIZARRO)**	**210 días**									
2		**OBRAS PROVISIONALES**	**4 días**									**01**
3		CARTEL DE OBRA	1 día,4	7,8,46			1	1054.05	1054.05		1;CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG),CO1.01	
4		ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA	3 días	3			100	79.91	7991		40;CAPATAZ[5%],OFICIAL[80%],PEON[20%],01.02	
5		**OBRAS PRELIMINARES**	**167 días**									**02**
6		**ELEMENTOS DE SEGURIDAD**	**1 día**									**02.01**
7		SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION	1 día,3				1	1345.46	1345.46		1;PINTURA ESMAL TE[3%],OPERARIO[30%],02.01.01	
8		CERCO PERIMETRICO CON APIFILA	1 día,3				100	16.68	1668		100;CAPATAZ[1%],OFICIAL[30%],PEON[30%],02.01.02	
9		**TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO**	**153 días**									**02.02**
10		TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	3 días,11	11			548.79	1.67	861.6		250;YESO DE 28 KG[20%],PINTURA ESMAL[75%],02.02.01	
11		TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION	150 días,10	130,132			24006.52	0.43	10408.8		1200;PINTURA ESMAL[75%],40%],CAPATAZ[40%],02.02.02	
12		**MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1 día**									**02.03**
13		MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	1 día,75,146	16,10			1	2400	2400		1;CAMION PLATAFORMA (REMOLQUE)[1%],02.03.01	
14		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**20 días**									**03**
15		**CORTES**	**12 días**									**03.01**
16		CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA	12 días,13	18CO-2 días,20CC			4070.86	5.9	24019.07		360;CAPATAZ[1%],PEON[18%],CONTROLADOR,03.01.01	
17		**EXCAVACIONES**	**11 días**									**03.02**
18		EXCAVACION EN FORMA MANUAL	11 días,18CO-2 días	58,59,60,61,62			80.69	36.71	2962.13		2;CAPATAZ[1%],PEON[99%]	03.02.01
19		**ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE**	**12 días**									**03.03**
20		ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	11 días,18CO-2 días	58,59,60,61,62			100.86	18.35	1850.78		5;CAPATAZ[1%],PEON[99%]	03.03.01
21		CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	12 días,18CO-2 días	58,59,60,61,62			5189.44	5.49	28490.03		1;CONTROLADOR OFICIAL[5%],CAMION 10[3.03.02	
22		**PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE**	**4 días**									**03.04**
23		PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	4 días,58,59,60,61,62	26,48,49,52			8068.84	2.19	17670.76		2420;CAPATAZ[5%],PEON[40%],MOTOBOMBA[03.04.01	
24		**PAVIMENTO**	**128 días**									**04**
25		**SUB RASANTE**	**11 días**									**04.01**
26		MATERIAL SELECCIONADO	6 días,23	27,43			3146.85	38.12	119957.92		1;CAPATAZ[10%],OPERARIO[1,25%],PEON[04.01.01	
27		PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE	5 días,29	29			8068.84	2.46	19849.35		1940;CAPATAZ[5%],PEON[80%],CONTROLADOR,04.01.02	
28		**SUB BASE**	**21 días**									**04.02**
29		MATERIAL SELECCIONADO	6 días,27	30			1046.95	36.08	39944.02		1;CAPATAZ[50%],OPERARIO[1.06%],PEON[04.02.01	
30		MATERIAL HORMIGON	5 días,29	31			968.26	17.41	16857.41		1;CAPATAZ[1%],PEON[40%],CONTROLADOR,04.02.02	
31		MATERIAL MEZCLADO	5 días,29	32			2517.21	5.6	13717.02		1;PEON[40%],CONTROLADOR OFICIAL[20%],04.02.03	
32		PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB BASE	5 días,31	102,103			8068.84	2.46	19849.35		1940;CAPATAZ[5%],PEON[80%],CONTROLADOR,04.02.04	
33		**PAVIMENTO RIGIDO**	**29 días**									**04.03**
34		CONCRETO PREMEZCLADO FC=240 KG/CM2	19 días,35CO-3 días	130,132			1466.06	432.4	633922.99		80;CAPATAZ[50%],OPERARIO[17.72%],OFICIAL[04.03.01	
35		PAVIMENTO RIGIDO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	24 días,54,86,107,122, 124,153,154,158	34CO-3 días,36CC			330.54	70.04	23448.31		1;CAPATAZ[5%],OPERARIO[21%],OFICIAL[04.03.02	
36		PAVIMENTO RIGIDO: CURADO DE LOSA	26 días,35CO-3 días	130,132			7330.42	1.71	12535.02		2800;PEON[40%],MOTOBOMBA 10 HP 4T[41%],04.03.03	
37		PAVIMENTO RIGIDO: JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	19 días,35CO-3 días	130,132			1870.95	2.47	4621.25		1117;CAPATAZ[10%],OPERARIO[200%],MADERA[04.03.04	
38		PAVIMENTO RIGIDO: SELLADO EN JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION	18 días,35CC-7 días	130,132			1706.8	22.57	38528.52		250;ADITIVO SELLADOR DE JUNTA[16.67%],04.03.05	
39		PAVIMENTO RIGIDO: JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION	19 días,35CO-3 días	130,132			956.04	2.47	2361.42		117;CAPATAZ[2%],OPERARIO[1.92%],MADERA[04.03.06	
40		PAVIMENTO RIGIDO: SELLADO EN JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCIO	18 días,35CC-7 días	130,132			956.04	22.57	21586.61		250;ADITIVO SELLADOR DE JUNTA[8.34%],04.03.07	
41		PAVIMENTO RIGIDO: SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION	17 días,35CC-7 días	130,132			1052.71	5.02	8296.6		100;ASFALTO RC-250[17.48%],CAPATAZ[10%],04.03.08	
42		**PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD**	**116 días**									**04**
43		PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	116 días,29	130,132			1	3540	3540		1;GRANULOMETRIA[90%],ABRASION LOS 04.01	
44		**MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL**	**203 días**									**06**
45		**ETAPA PRELIMINAR**	**1 día**									**06.01**
46		REUNION DE CONCERTACION (RESIDENTE - HABITANTES)	1 día,3	50,51			1	578.5	578.5		1;PAPEL BOND 70 GRS.A-4;APICERO[100%],06.01.01	
47		**ETAPA DE CONSTRUCCION**	**64 días**									**06.02**
48		RIEGO DE LAS VIAS AUXILARES	23 días,23	102,103			4900	0.68	3080		2000;CAPATAZ[5%],PEON[216%],MOTOBOMBA[06.02.01	
49		RIEGO DE MATERIAL EN CANTERA	23 días,23	102,103			419.58	16.52	7770.62		50;PEON[54%],CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA[06.02.02	
50		HABILITACION PROVISIONAL DE LETRINAS INCLUIDO CONEXION	2 días,46	69			2	875.04	1750.08		1;CAPATAZ[5%],OPERARIO[200%],PEON[06.02.03	
51		HABILITACION PROVISIONAL DE BASUREROS	2 días,46	69			2	573	1146		1;CILINDRO DE PLASTICO[300%],CILINDRO[06.02.04	
52		MITIGACION AMBIENTAL	23 días,23	102,103			1	3000	3000		6;MITIGACION AMBIENTAL	06.02.05
53		**ETAPA DE ABANDONO**	**3 días**									**06.03**
54		RECONFORMACION DE CANTERA	1 día,109,130	55			0.25	999.1	249.78		2;PEON[25%],MOTONIVELADORA DE 125 HP[06.03.01	
55		SEMBRADO DE ARBUSTOS	1 día,54	56,89			50	6.58	329.5		50;PEON,ARBUSTOS[0.000%]	06.03.02
56		RECONFORMACION DE BOTADERO	1 día,55				0.25	959.55	239.89		2;PEON[13%],MOTONIVELADORA DE 125 HP[06.03.03	
57		**VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS**	**177 días**									**07**
58		NIVELACION DE BUZONES	6 días,16,18,20,21	23			18	286.43	5191.74		3;CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)[27.01	
59		EVALUACION Y REPARACION CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA	4 días,16,18,20,21	23			26	145.37	3779.62		8;CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)[1.07.02	
60		EVALUACION Y REPARACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE	7 días,16,18,20,21	23			26	607.4	15790.4		4;CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)[1.07.03	
61		CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA	8 días,16,18,20,21	23			312	11.47	3578.64		40;CAPATAZ[10%],PEON[16%],LARENA FINA[07.04	
62		CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE	10 días,16,18,20,21	23			364	10.27	3738.28		40;CAPATAZ[10%],PEON[16%],LARENA FINA[07.05	
63		PROTECCION DEL CONCRETO	20 días,35CO-3 días	130,132			440	7.4	3256		280;CAPATAZ[5%],PEON[31%],PLASTICO[246.2[07.06	
64		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	1 día,161	162			7330.42	0.25	1832.61		704;CAPATAZ[5%],PEON[18%]	07.07
65		**OBRAS PRELIMINARES**	**111 días**									**01**
66		**TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO**	**27 días**									**01.01**
67		TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION	27 días,77	84			3632.42	0.44	1598.26		1200;PINTURA ESMAL TE[36%],CAPATAZ[21%],01.01.01	
68		**DEMOLICIONES**	**1 día**									**01.02**
69		DEMOLICION DE VEREDAS Y CUNETAS	1 día,50,51	72,143			35.13	4.9	172.14		110;CAPATAZ[1%],PEON[139%],COMPRESOR,01.02.01	
70		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**89 días**									**02**
71		**EXCAVACIONES**	**1 día**									**02.01**
72		EXCAVACION EN FORMA MANUAL	1 día,69	74			171.87	36.71	6313.02		2;CAPATAZ[1%],PEON	02.01.01
73		**ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE**	**2 días**									**02.02**
74		ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día,72	75			214.96	16.35	3644.52		5;CAPATAZ[1%],PEON	02.02.01
75		CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día,74	13			264.14	5.49	1450.13		1;CONTROLADOR OFICIAL[5%],CAMION VOL02.02.02	
76		**NIVELADO Y COMPACTADO**	**12 días**									**02.03**
77		MATERIAL SELECCIONADO	6 días,102,103	78,79,87			235.26	38.12	8968.11		1;CAPATAZ[5%],OPERARIO[1.1%],PEON[2%],02.03.01	
78		RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO	4 días,77	83,88			235.21	15.3	3461.01		6;CAPATAZ[1%],PEON	02.03.02
79		NIVELADO Y COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO	6 días,77,87	83,88			3619.36	2.61	9446.58		120;CAPATAZ[1%],OPERARIO[30%],PEON[1%]02.03.03	
80		**CONCRETO SIMPLE**	**33 días**									**03**
81		**SARDINELES**	**33 días**									**03.01**
82		SARDINELES: CONCRETO FC=175 KG/CM2	18 días,80CO-3 días	84			79.15	317.44	25125.38		1;CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)[03.01.01	
83		SARDINELES: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	18 días,78,79	80CO-3 días,91CC			442.02	60.99	26958.8		1;CAPATAZ[10%],OPERARIO[98%],OFICIAL[03.01.02	
84		SARDINELES: JUNTA ASFALTICA	12 días,57,82,83	35			158.67	4.85	769.55		90;ASFALTO RC-250[1.258%],CAPATAZ[5%],[03.01.03	
85		**VEREDAS**	**33 días**									**03.02**
86		VEREDAS: CONCRETO FC=175 KG/CM2 E=10CM ACABADO FROTACHADO	18 días,88CO-3 días	89			1719.69	39.92	68630.33		100;CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)[03.02.01	
87		VEREDAS: CONCRETO FC=175 KG/CM2 E=10CM ACABADO COLOREADO	18 días,88CO-3 días	89			1719.69	42.31	72760.08		100;CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)[03.02.02	
88		VEREDAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	18 días,78,79	86CO-3 días,91CC			129.28	52.45	6780.74		1;CAPATAZ[10%],OPERARIO[98%],OFICIAL[03.02.03	
89		VEREDAS: JUNTA ASFALTICA	12 días,86,87,88	35			1173.24	4.35	5103.59		90;ASFALTO RC-250[5.189%],CAPATAZ[5%],03.02.04	
90		**RAMPAS**	**18 días**									**03.03**
91		RAMPA: CONCRETO FC=175 KG/CM2 E=10CM BRUÑADO	18 días,80CO-3 días	115,107			180	54.48	9806.4		50;CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)[03.03.01	
92		RAMPAS: REJILLA METALICA	18 días,80CO-3 días	115,107			36	96.88	3559.68		1;CAPATAZ[5%],OPERARIO[98%],PEON[98%]03.03.02	
93		**PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD**	**18 días**									**04**
94		PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	18 días,80CO-3 días	107			1	1610	1610		1;GRANULOMETRIA,DISEÑO DE MEZCLA 04.01	
95		**MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL**	**122 días**									**06**
96		**ETAPA DE CONSTRUCCION**	**5 días**									**06.01**
97		RIEGO DE MATERIAL EN CANTERA	5 días,102,103	79			23.53	18.52	435.78		50;PEON[42%],CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA[06.01.01	
98		**ETAPA DE ABANDONO**	**1 día**									**06.02**
99		RECONFORMACION DE BOTADERO	1 día,55	161			0.25	959.55	239.89		2;PEON[13%],MOTONIVELADORA DE 125 HP[06.02.01	
100		**VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS**	**121 días**									**06**
101		CURADO: SARDINELES, VEREDAS Y RAMPAS	18 días,88CO-3 días	107			3632.42	1.16	4213.61		1400;PEON[20%],MOTOBOMBA 10 HP 4T[33%],06.01	
102		NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO AGUA INSTALACIONES DOMICILIARIAS	6 días,32,46,48,52	150,77,87,140FC-2			61	96.48	6007.28		8;CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)[1.06.02	
103		NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO DESAGUE INSTALACIONES DOMICILIARIA	7 días,32,46,48,52	150,77,87,140FC-2			61	104.41	6410.01		4;CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)[1.06.03	
104		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	1 día,161				3632.42	0.25	908.11		704;CAPATAZ[5%],PEON[13%]	06.04
105		**OBRAS PROVISIONALES**	**24 días**									**01**
106		**TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO**	**24 días**									**01.01**
107		TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION	24 días,31,82,84,101	35			681.03	0.44	299.65		1200;PINTURA ESMAL TE[68%],CAPATAZ[20%],01.01.01	
108		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**6 días**									**02**
109		**EXCAVACIONES**	**2 días**									**02.01**
110		EXCAVACION EN FORMA MANUAL	2 días,31,82	112			3.25	36.71	119.31		2;CAPATAZ[1%],PEON[85%]	02.01.01
111		**ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE**	**4 días**									**02.02**
112		ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día,110	113			4.07	18.35	74.68		5;CAPATAZ[5%],PEON[81%]	02.02.01
113		CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	5 días,112	117			4.07	5.49	22.34		1;CONTROLADOR OFICIAL[5%],CAMION VOL02.02.02	
114		**CONCRETO SIMPLE**	**19 días**									**03**
115		**CUNETA TIPO I**	**10 días**									**03.01**
116		CUNETA TIPO I: CONCRETO FC=175 KG/CM2	4 días,117	118			78.14	309.32	24170.26		20;CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)[03.01.01	
117		CUNETA TIPO I: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	2 días,113	116,124,126			26.76	61.18	1638.67		1;CAPATAZ[10%],OPERARIO[98%],OFICIAL[03.01.02	
118		CUNETA TIPO I: JUNTA ASFALTICA	4 días,116	121			160.5	4.31	691.76		90;ASFALTO RC-250[80%],CAPATAZ[5%],[03.01.03	
119		**CUNETA TIPO II**	**9 días**									**03.02**
120		CUNETA TIPO II: CONCRETO FC=210 KG/CM2	2 días,121	122			32.02	329.79	10559.88		20;CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)[03.02.01	
121		CUNETA TIPO II: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	4 días,118	120			43.62	61.18	2669.11		1;CAPATAZ[5%],OPERARIO[19%],OFICIAL[03.02.02	
122		CUNETA TIPO II: JUNTA ASFALTICA	3 días,120	35			218.1	5.34	1164.65		90;ASFALTO RC-250[2.305%],CAPATAZ[5%],[03.02.03	
123		**PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD**	**14 días**									**04**
124		PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	14 días,117	35			1	40	40		1;ROTURA DE BRIQUETA[200%]	04.01
125		**VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS**	**51 días**									**06**
126		CURADO: CUNETAS TIPO I Y II	21 días,117	130,132			681.03	1.16	789.99		1400;PEON[1.19%],MOTOBOMBA 10 HP 4T[99%],06.01	
127		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	1 día,161				681.03	0.25	170.26		704;CAPATAZ[5%],PEON[216%]	06.02
128		**OBRAS PRELIMINARES**	**29 días**									**01**
129		**TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO**	**29 días**									**01.01**
130		TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION	29 días,11,34,35,36,37,38,39,40,41,43,63,126	54			473.46	1.79	847.46		240;PINTURA ESMAL TE[67%],CAPATAZ[9%],01.01.01	
131		**SEÑALIZACION HORIZONTAL**	**25 días**									**02**
132		PINTURA EN SARDINELES	13 días,11,34,35,36,37,38,39,40,41,43,63,126	133			495.74	19.11	9473.59		40;PINTURA DE TRAFICO[5,558%],THINER[02.01	
133		PINTURA EN PAVIMENTO	12 días,132	135			473.46	19.11	9047.83		40;PINTURA DE TRAFICO[5,295%],THINER[02.02	
134		**SEÑALIZACION VERTICAL**	**5 días**									**03**
135		SEÑALES INFORMATIVAS	5 días,133	54			24	459.87	11039.28		5;CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)[03.01	
136		**VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS**	**1 día**									**04**
137		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	1 día,161				473.46	0.25	118.36		704;CAPATAZ[5%],PEON[134%]	04.01
138		**OBRAS PRELIMINARES**	**30 días**									**01**
139		**TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO**	**30 días**									**01.01**
140		TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION	30 días,102FC-2 días,103FC-2 días	153,154			84.94	1.79	152.04		240;PINTURA ESMAL TE[8%],CAPATAZ[16%],01.01.01	
141		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**9 días**									**02**
142		**EXCAVACIONES**	**4 días**									**02.01**
143		EXCAVACION EN FORMA MANUAL	4 días,69	145			8.49	36.71	311.67		2;CAPATAZ[5%],PEON[85%]	02.01.01
144		**ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE**	**5 días**									**02.02**
145		ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	3 días,143	146			10.62	18.35	194.88		5;CAPATAZ[1%],PEON[71%]	02.02.01
146		CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	2 días,145	13			10.62	5.49	58.3		1;CONTROLADOR OFICIAL[5%],CAMION VOL02.02.02	
147		**AREAS VERDES, JARDINERIAS**	**44 días**									**03**
148		**JARDINERIA**	**44 días**									**03.01**
149		JARDINERIAS: CONCRETO FC=175 KG/CM2	18 días,100CO-2 días	151,152			50.96	312.08	15903.6		1;CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)[03.01.01	
150		JARDINERIAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	18 días,102,103	149CC-2 días,151			679.86	44.44	30204.39		1;CAPATAZ[10%],OPERARIO,OFICIAL,PEON[03.01.02	
151		JARDINERIAS: RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	12 días,149,150,156	153,154			220.46	15.3	3373.04		6;CAPATAZ[1%],PEON	03.01.03
152		JARDINERIAS: PREPARACION DE TERRENO PARA AREA VERDE	12 días,149,150,156	153,154			220.46	132.29	29164.85		2;5;CAPATAZ[1%],OPERARIO[50%],PEON[19]03.01.04	
153		JARDINERIAS: SEMBRADO DE GRASS	12 días,151,152,140	35			1102.29	10.48	11552		100;PAJA[3,30%],CAPATAZ[5%],OPERARIO[50]03.01.05	
154		JARDINERIAS: SEMBRADO DE ARBUSTOS Y ARBOLES	12 días,151,152,140	35			60	6.58	395.4		50;PEON[50%],ARBUSTOS[.000%]	03.01.06
155		**PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD**	**18 días**									**04**
156		PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	18 días,100CC-2 días	151,152			1	40	40		1;ROTURA DE BRIQUETA[200%]	04.01
157		**VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS**	**102 días**									**06**
158		CURADO: JARDINERIAS	20 días,100CC-2 días	35			679.86	1.16	788.41		1400;PEON[2.11%],MOTOBOMBA 10 HP 4T[99%],06.01	
159		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	1 día,161				84.94	0.25	21.24		704;CAPATAZ[1%],PEON[24%]	06.02
160		**EDUCACION VIAL**	**1 día**									**01**
161		EDUCACION VIAL	1 día,99	159,127,127,104,64			1	1000	1000		1;MATERIALES PARA EDUCACION VIAL	01.01
162		FIN DE OBRA	1 día,64									

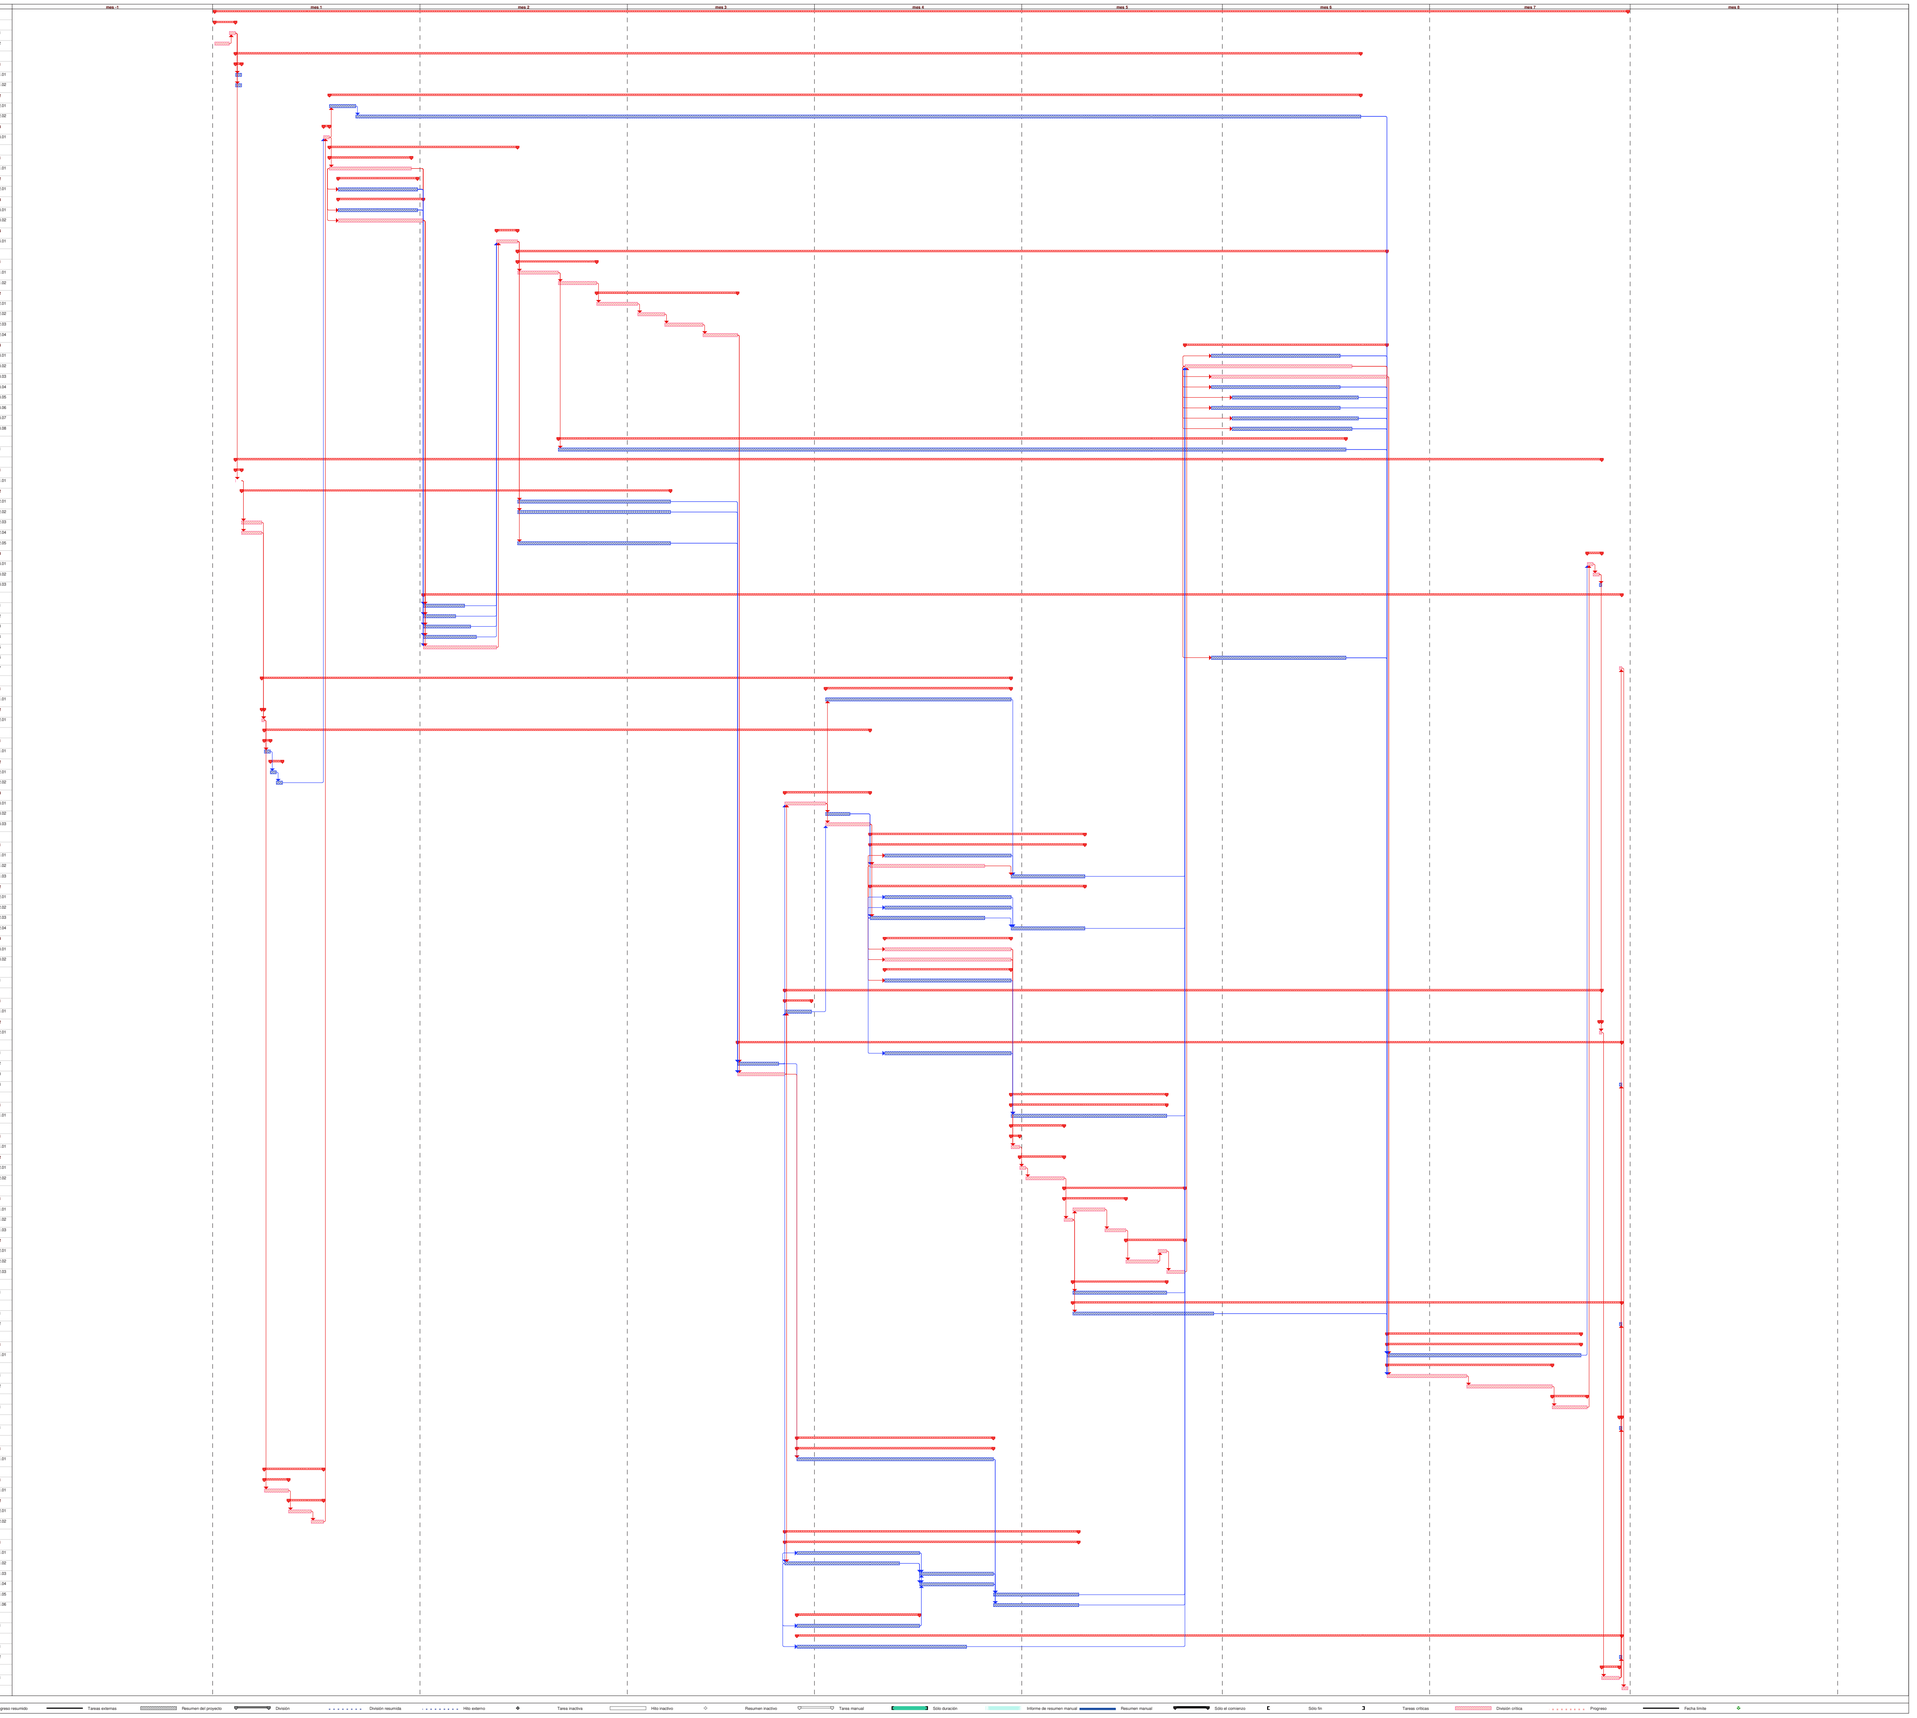

Proyecto: CRONOGRAMA DE EJECUC | Tarea | Hito | Resumen | Tarea resumida | Hito resumido | Progreso resumido | Tareas externas | Resumen del proyecto | Desviación | División resumida | Hito externo | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | Sólo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | Sólo el comienzo | Sólo fin | Tareas críticas | División crítica | Progreso | Fecha límite
